


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ




**Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгоДорСтройПроект»**

**Фактический (почтовый) адрес: 400074 г. Волгоград, ул. Иркутская 19, офис 227
Тел. (8442) 66-92-96 E-mail: vdsp@list.ru**

**Проект
«Организация дорожного движения (схема дислокации дорожных
знаков и горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах и
улицах Алексеевского сельского поселения Алексеевского
муниципального района Волгоградской области»**

ДП/50/25

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгоДорСтройПроект»**

Фактический (почтовый) адрес: 400074 г. Волгоград, ул. Иркутская 19, офис 227
Тел. (8442) 66-92-96 E-mail: vdsp@list.ru

Утверждаю:
Глава Алексеевского сельского
поселения

«_____» _____ 2025 г.

**Проект
«Организация дорожного движения (схема дислокации дорожных
знаков и горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах и
улицах Алексеевского сельского поселения Алексеевского
муниципального района Волгоградской области»**

ДП/50/25

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Бояршин А. Ю.

Бояршин А. Ю.

2025

№ п/п		Наименование						№ страницы	
1		Утверждаемая часть						5	
2		1. Введение						5	
3		2. Основные проектные решения						8	
4		2.1 Дорожные знаки						8	
5		2.2 Дорожная разметка						8	
6		2.3 Искусственные дорожные неровности						9	
7		2.4 Согласование проектной документации						9	
8		Обосновывающая часть						10	
9		3. Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации						10	
10		3.1 Характеристика территории						10	
11		3.2 Характеристика участков дорог, для которых разработан ПОДД						10	
12		3.3 Анализ существующей организации движения						10	
13		3.4 Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД						10	
14		3.5 Характеристика основных параметров дорожного движения						11	
15		Графическая часть						12	
16		4. Ситуационные планы						13	
17		5. Условные обозначения элементов обустройства дороги						16	
18		6. Дислокация дорожных знаков и схемы горизонтальной дорожной разметки						18	
19		ст-ца Алексеевская:						19	
20		ул. Красногвардейская						20	
21		ул. Комсомольская						39	
22		ул. Лесная						47	
23		ул. Луговая						52	
24		ул. Мелиораторов						55	
25		ул. Набережная						57	
26		ул. Озёрная						63	
27		ул. Октябрьская						69	
28		ул. Первомайская						78	
29		ул. Северная						85	
30		ул. Строителей						88	
31		ул. Ленина						92	

№ п/п	Наименование						№ страницы		
32	ул. Крестьянская						102		
33	ул. Коммунальная						114		
34	ул. Горькаева						126		
35	ул. Тополёвая						128		
36	пер. 8-го Марта						131		
37	пер. Банный						133		
38	пер. Васильева						134		
39	пер. Гулина						139		
40	пер. Жданова						144		
41	пер. Иванова						145		
42	пер. Калинина						150		
43	пер. Колхозный						156		
44	пер. Лазаренко						161		
45	пер. Мирный						163		
46	пер. Мушкетова						164		
47	пер. Пионерский						165		
48	пер. Цаплинский						169		
49	пер. Чапаева						170		
50	пер. Чепрунова						179		
51	пер. Шумейко						181		
52	пер. Юбилейный						182		
53	пер. Советский						190		
54	пер. Зелёный						196		
55	7. Приложения						202		
56	Ведомости размещения дорожных знаков						203		
57	Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки						284		
58	Ведомость искусственных неровностей						307		
59	Ведомость средств фотовидеофиксации						313		
60	Ведомости светофорных объектов						316		
61	Письмо МВД РФ Департамента обеспечения безопасности дорожного движения, от 26.04.2010 г. №13/6-3023 «О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации»						324		
	Письмо МВД России ГУ МВД РФ по Волгоградской области от 24.08.2016 г. №18/6221						326		
	Справка ГИПа						328		
Инва. № подл.									
							ДП/50/25		
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Взаим. инв. №								Лист	
Подп. и дата								3	

Номер тома	Обозначение	Наименование	Приме чание
1	ДП/50/25	Часть 1. Автомобильная дорога.	

[illegible]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

1. Введение

В соответствии с договором № ДП/50/25 от 30.04.2025 г. заключенным с Администрацией Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области был разработан проект «Организация дорожного движения (схема дислокации дорожных знаков) на автомобильных дорогах и улицах Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области».

Проект разработан на основе полевых обследований, выполненных ООО «ВолгоДорСтройПроект» в мае 2025 г., в соответствии с:

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения».
- Приказ Минтранса России № 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» от 18 февраля 2025г;
- И другими нормативными актами РФ.

В результате контрольных замеров фактическая протяженность обследуемых автомобильных улиц и дорог составила:

Наименование улицы/дороги	Фактическая протяженность обследуемой дороги (км)
ст-ца Алексеевская	
ул. Красногвардейская	3,752
ул. Комсомольская	1,538
ул. Лесная	0,859
ул. Луговая	0,569
ул. Мелиораторов	0,305
ул. Набережная	1,055
ул. Озёрная	1,106
ул. Октябрьская	1,729

Согласовано				
Разработал				
Инов. № подл.				
Подп. и дата				
Инов. № подл.				

						ДП/50/25		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка		
Разработал	Офицерова				2025			
Проверил	Бояршин				2025			
ГИП	Бояршин				2025			
Н. контр.	Бояршин				2025			
						Стадия	Лист	Листов
						П	5	
						ООО «ВолгоДорСтройПроект»		

ул. Первомайская	1,364
ул. Северная	0,570
ул. Строителей	0,626
ул. Ленина	1,518
ул. Крестьянская	1,995
ул. Коммунальная	1,855
ул. Горькаева	0,324
ул. Тополёвая	0,599
пер. 8-го Марта	0,402
пер. Банный	0,189
пер. Васильева	0,948
пер. Гулина	0,995
пер. Жданова	0,210
пер. Иванова	0,831
пер. Калинина	1,021
пер. Колхозный	0,866
пер. Лазаренко	0,229
пер. Мирный	0,165
пер. Мушкетова	0,119
пер. Пионерский	0,638
пер. Цаплинский	0,163
пер. Чапаева	1,384
пер. Чепрунова	0,313
пер. Шумейко	0,186
пер. Юбилейный	1,378
пер. Советский	0,984
пер. Зелёный	0,895
Всего:	31,680

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ДП/50/25

Лист

Проект организации дорожного движения выполнен в масштабе 1:1000 (продольный масштаб). Сложные пересечения и примыкания выполнены в масштабе 1:1000, 1:500.

Проект дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной дорожной разметки включает в себя следующие элементы автомобильной дороги:

- 1) Контуры плана автомобильной дороги;
- 2) Дорожные знаки (с указанием номера знака, продольной привязкой);
- 3) Горизонтальная разметка (с указанием типа и протяженности разметки);

Работа выполнена согласно ниже перечисленных нормативных документов:

— ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

— ГОСТ Р 52290-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

— ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

— ГОСТ 21.701-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог

— ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой);

— ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;

— СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

— ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

— ВСН 23-75 «Указания по разметке автомобильных дорог»;

— «Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах» Москва, 2006 г.;

«Правила дорожного движения Российской Федерации».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ДП/50/25				

2 Основные проектные решения

Целью работы является улучшение организации дорожного движения на автомобильных дорогах для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Организация дорожного движения обеспечена при помощи дорожных знаков.

2.1 Дорожные знаки

Данным проектом предусмотрена установка, а также демонтаж знаков, в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами, с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

Расстояние от нижнего края знака (без учета табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) в населенных пунктах должно быть от 2,0 до 4,0 м при установке сбоку от проезжей части.

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть 50-200 мм.

Типоразмеры знаков по ГОСТ Р 52290 принимают по таблице 1 ГОСТ Р 52289. Номенклатура дорожных знаков приведена в приложении «Ведомость размещения дорожных знаков».

2.2 Дорожная разметка

Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорог и элементов дорожных сооружений, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289. В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Номенклатура-спецификация дорожной разметки приведена в приложении «Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки».

Осевая горизонтальная разметка нанесена на участках дорог с шириной проезжей части не менее 6,0 м, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

Взаим. инв. №	Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорог и элементов дорожных сооружений, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289. В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.																		
	Подп. и дата	Номенклатура-спецификация дорожной разметки приведена в приложении «Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки».																	
Инв. № подл.		Осевая горизонтальная разметка нанесена на участках дорог с шириной проезжей части не менее 6,0 м, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств.																	
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ДП/50/25
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата														

2.3 Искусственные дорожные неровности

Искусственные дорожные неровности должны соответствовать ГОСТ Р 52605
Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие
технические требования. Правила применения.

Искусственные неровности (далее ИН) устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/ч и менее.

Конструкции ИИ в зависимости от технологии изготовления подразделяют на монолитные и сборно-разборные.

Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - не более 0,2 м с каждой стороны дороги. На участке для устройства ИН должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части дороги.

Для информирования водителей участки дорог с ИН должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения: дорожными знаками и разметкой.

2.4 Согласование проектной документации

Согласно действующего законодательства, согласование сотрудниками ГИБДД проектов организации дорожного движения, схем и проектов производства дорожных работ не предусмотрено. ГИБДД МВД РФ не отнесена к органам, принимающим участие в проведении государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и ввода их в эксплуатацию.

На основании писем Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 апреля 2010 года № 13/6-3023 (см. Приложение) и ГУМВД ГИБДД от 24.08. 2016 года № 18/6221 (см. Приложение) сообщаем, что в целях соблюдения законодательства Российской Федерации подразделения ГИБДД МВД РФ прекращают практику рассмотрения проектной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов дорог и дорожных сооружений, а также участия в приемке их в эксплуатацию.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	подразделения ГИБДД МВД РФ прекращают практику рассмотрения проектной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов дорог и дорожных сооружений, а также участия в приемке их в эксплуатацию.					
						ДП/50/25		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

3. Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации

3.1 Характеристика территории

Территория Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, для которой был разработан ПОДД, находится на северо-западе Волгоградской области. Площадь территории поселения составляет 21405 га. Административным центром Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области является станица Алексеевская.

Схема размещения автомобильных дорог Алексеевского сельского поселения представлена в графической части.

3.2 Характеристика участков дорог, для которых разработан ПОДД

Улично-дорожная сеть Алексеевского сельского поселения представлена улицами с асфальтобетонным и щебеночным покрытиями. Значительная часть улично-дорожной сети представлена дорогами без покрытия (грунтовыми).

Ширина автомобильных дорог Алексеевского сельского поселения варьируется от 3 до 12 м.

3.3 Анализ существующей организации движения

В Алексеевском сельском поселении движение двухстороннее, нерегулируемое, кроме перекрестка ул. Красногвардейской и пер. Васильева. Часть улично-дорожной сети оснащена средствами организации дорожного движения. Тип, ширина и протяженность покрытия для каждой автомобильной дороги, улицы представлены на схемах дислокации дорожных знаков в графической части.

3.4 Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД

На некоторых участках автомобильных дорог сельского поселения имеются установленные ТСОДД, однако не в полном объеме, также некоторые знаки требуют демонтажа, дополнения, на остальных участках дорог ТСОДД отсутствуют. На автомобильных дорогах станицы Алексеевская установлены камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Движение пешеходов организовано либо по тротуарам, при наличии, либо по краю проезжей части. Вдоль большинства дорог с твердым покрытием присутствует освещение.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ДП/50/25				

3.5 Характеристика основных параметров дорожного движения

Условия дорожного движения на участках дорог Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района, для которых выполнен данный ПОДД, свободные. Затруднений там нет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №					ДП/50/25	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ДП/50/25					


Лист

4. Ситуационные планы

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ст-ца Алексеевская

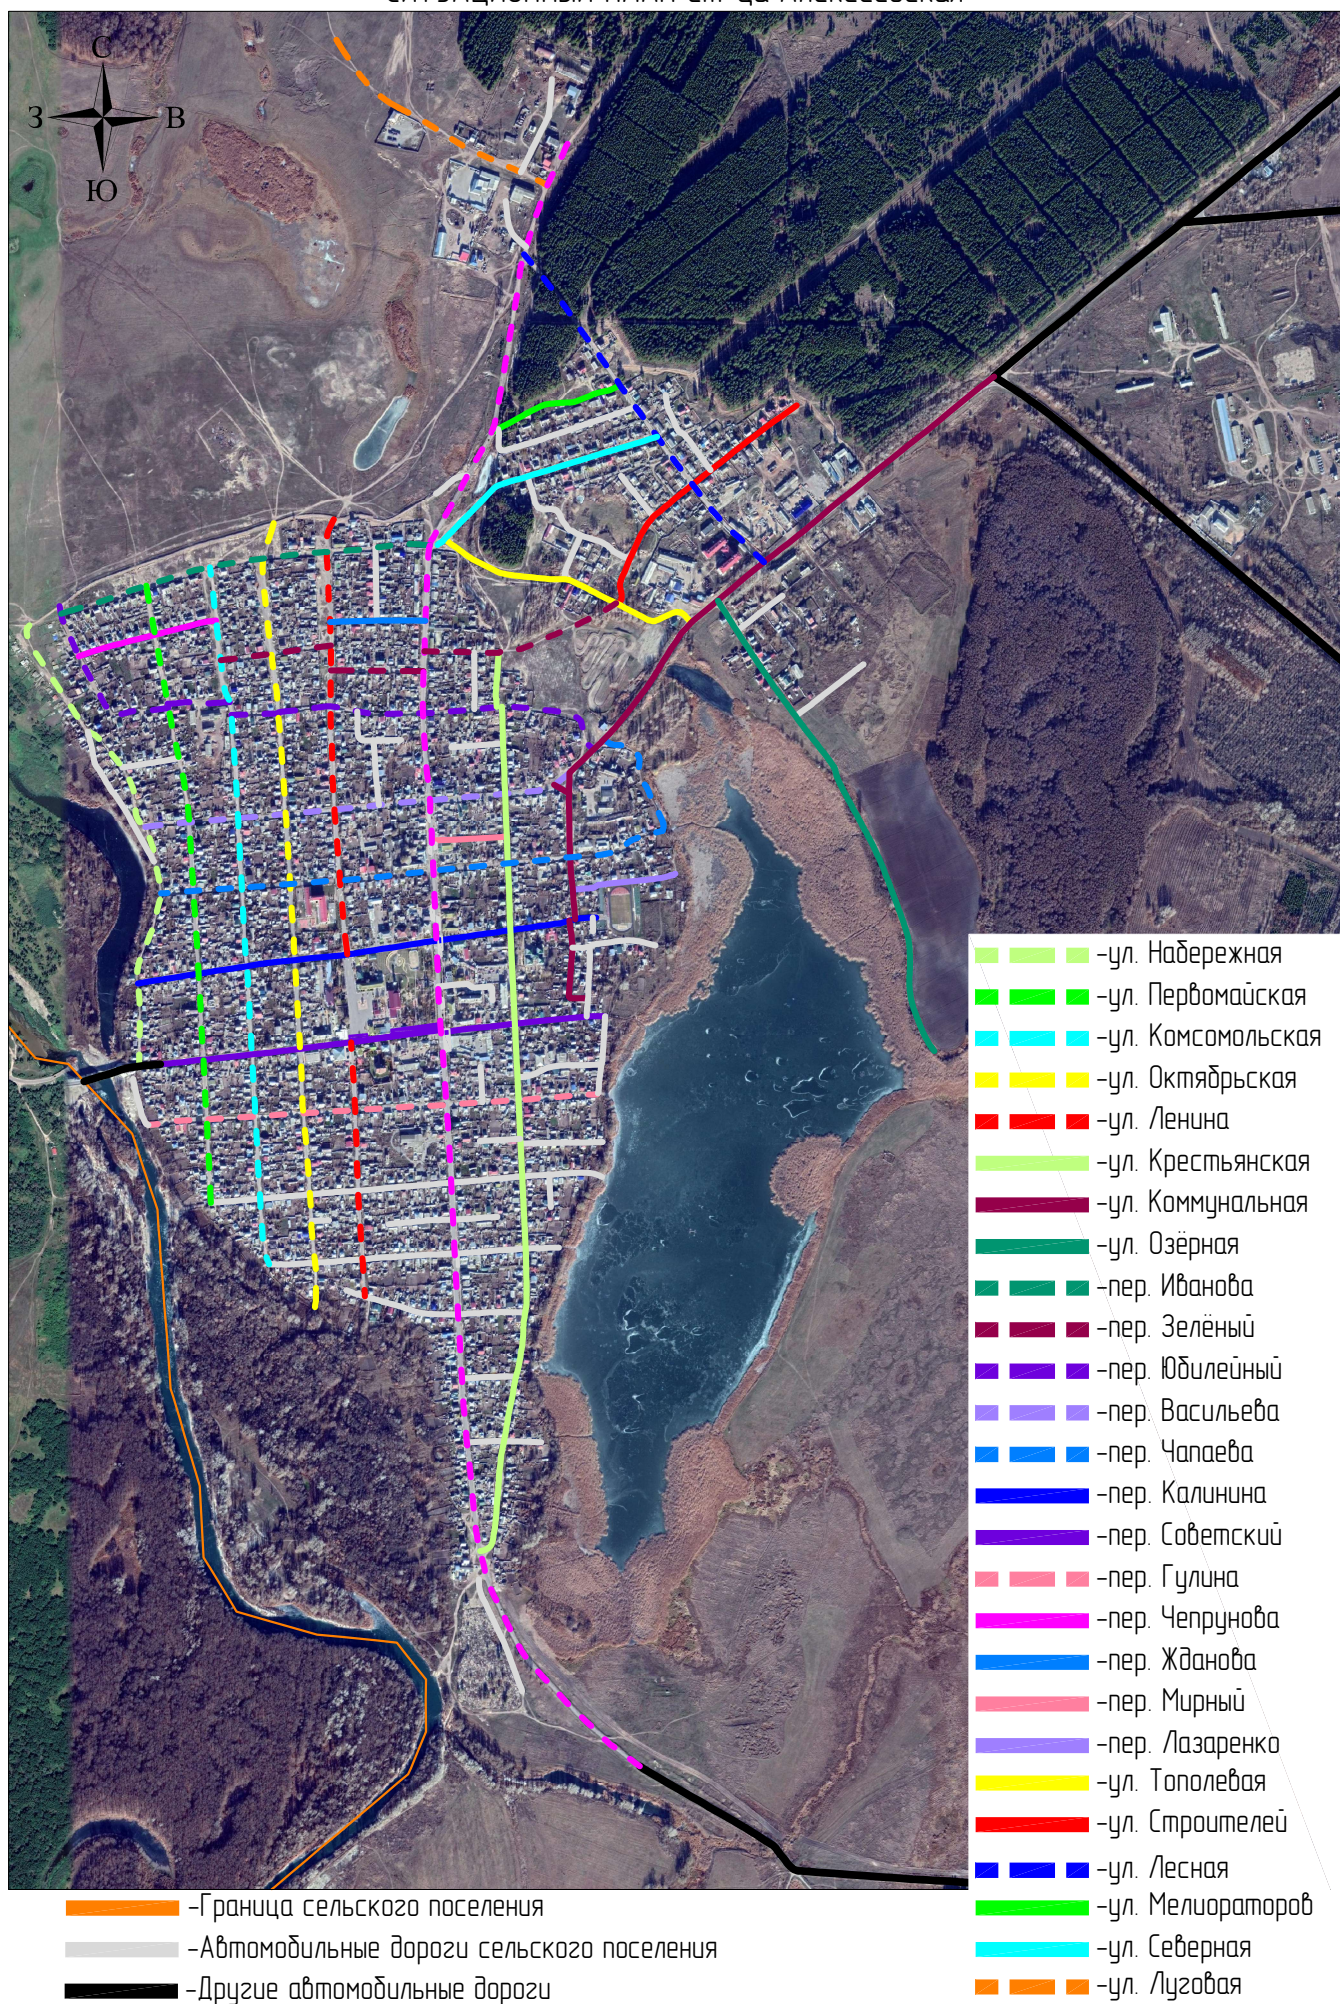


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ст-ца Алексеевская

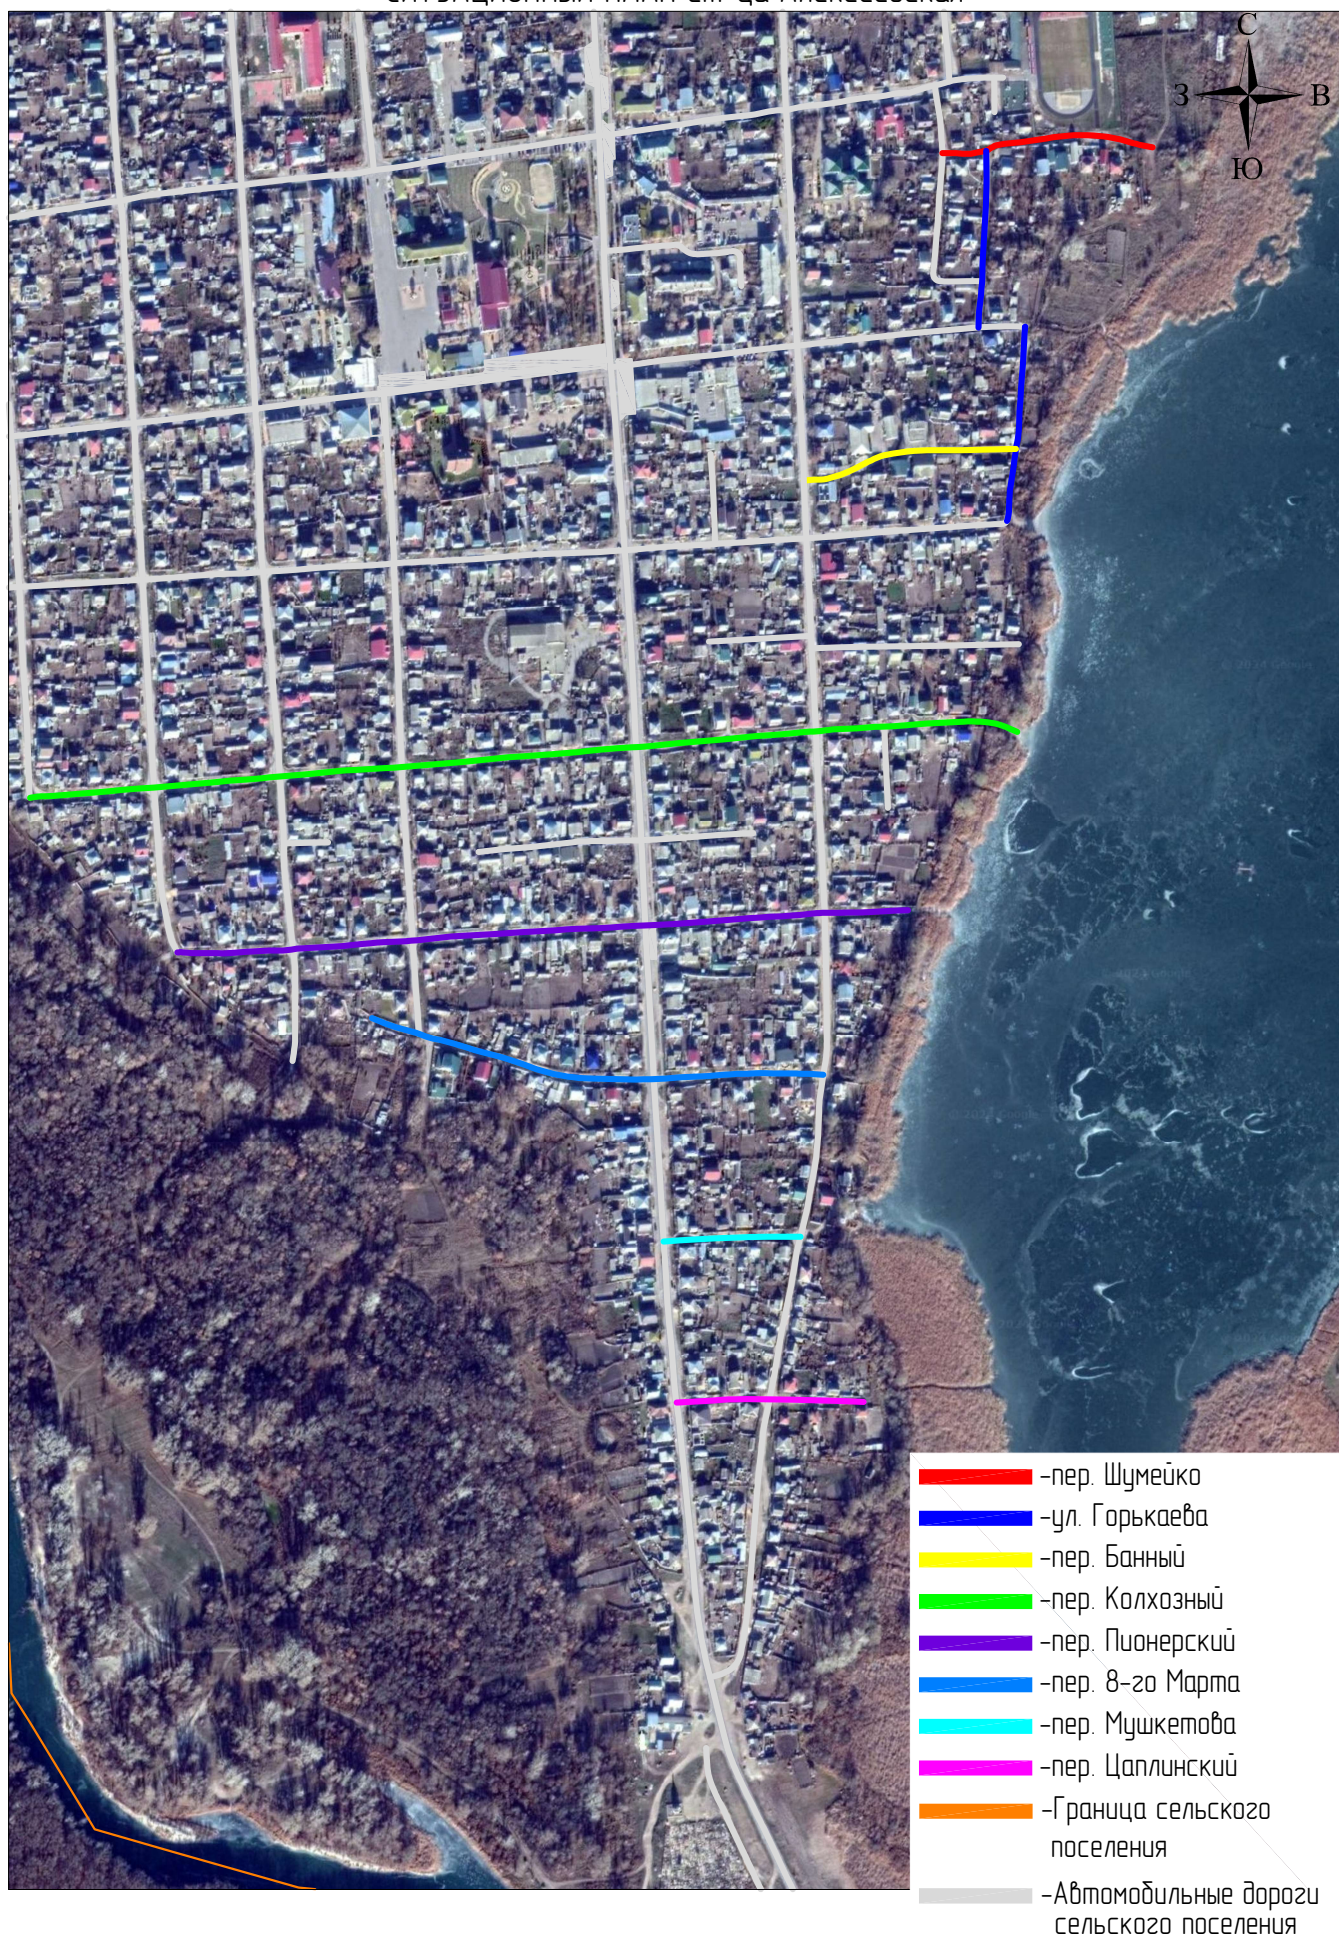


5. Условные обозначения элементов обустройства дороги

Условные обозначения элементов обустройства дороги





- Проектируемый дорожный знак с указанием номера по ГОСТ Р 52290-2004 и адреса расположения




- Существующий дорожный знак с указанием номера по ГОСТ Р 52290-2004 и адреса расположения




- Дорожный знак с указанием номера по ГОСТ Р 52290-2004 (перевернутый знак - это знак, установленный с обратной стороны)



- Демонтируемый дорожный знак с указанием номера по ГОСТ Р 52290-2004



- Проектируемый дорожный знак с указанием номера по ГОСТ Р 52290-2004, установка которого не предусмотрена данным проектом



- Существующий дорожный знак с указанием номера по ГОСТ Р 52290-2004, обслуживаемый сторонней организацией




- Асфальтобетонное покрытие



- Щебеночное покрытие



- Грунтовая дорога



- Существующая искусственная дорожная неровность



- Проектируемая искусственная дорожная неровность




- Существующий элемент освещения



- Существующее пешеходное ограждение



- Проектируемое пешеходное ограждение



- Территория детских учреждений, парков



- Камера фотовидеофиксации

6. Дислокация дорожных знаков и схемы горизонтальной дорожной разметки

ст-ца Алексеевская


Ширина следа, м	Звездные карманы	3 25 lв/дл 0,000 - 0,200
Проезжая часть		
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На обочине	
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Красногвардейская


Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 0,000 – км 0,200



Дорожная разметка следа	15	0,000 - 0,200	
Ширина следа, м	Проезжая часть	3 25 lв/дл 0,000 - 0,200	
Звездные карманы			
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На разделительной		
Дорожная разметка следа	На обочине		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,400



Ширина следа, м	Зональные карманы	
	Проезжая часть	На обочине
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

3.25 (л/д)
0.200 – 0.400

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	15 0.200 – 0.400
	Зональные карманы	3.25 (л/д) 0.200 – 0.400
Дорожные ограждения и дорожные знаки		
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


Ширина следа, м	Зональные карманы	
Дорожные ограждения и устройства следа	Проезжая часть	3,25 (в/д/)
	На обочине	0,400 - 0,580
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Красногвардейская

Выполнено по состоянию на май 2025 г.


км 0,400 – км 0,580

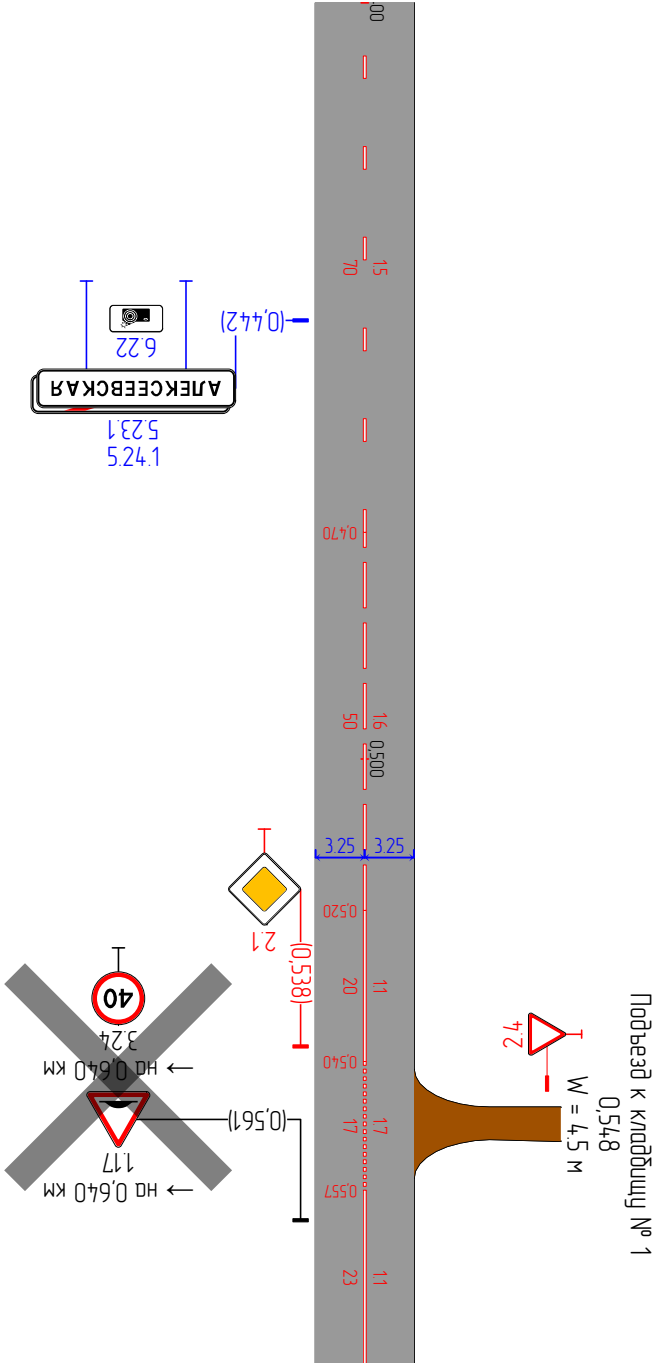


Дорожная разметка следа	15	0,400 - 0,470	16	0,470 - 0,520	11	0,520 - 0,540	17	0,540 - 0,557	11	0,557 - 0,580
Ширина следа, м	Проезжая часть		Зональные карманы	3,25 (в/д/)						
Дорожные ограждения и устройства следа	На разделительной		На обочине							

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,000 – км 1,200

Ширина следа, м	Зональные карманы	
Проезжая часть	3,25 (а/б) 1,000 - 1,126	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На обочине	
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		

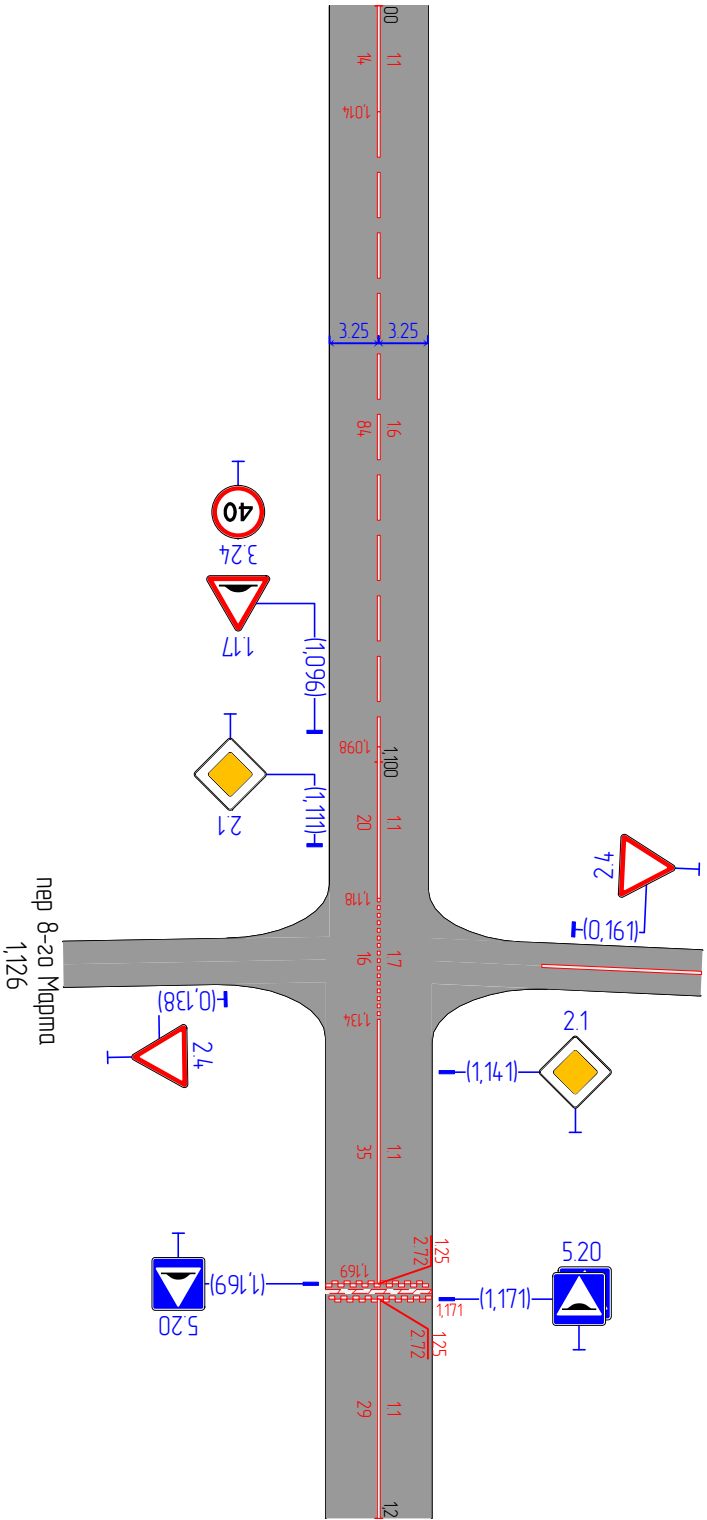

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,200 – км 1,400

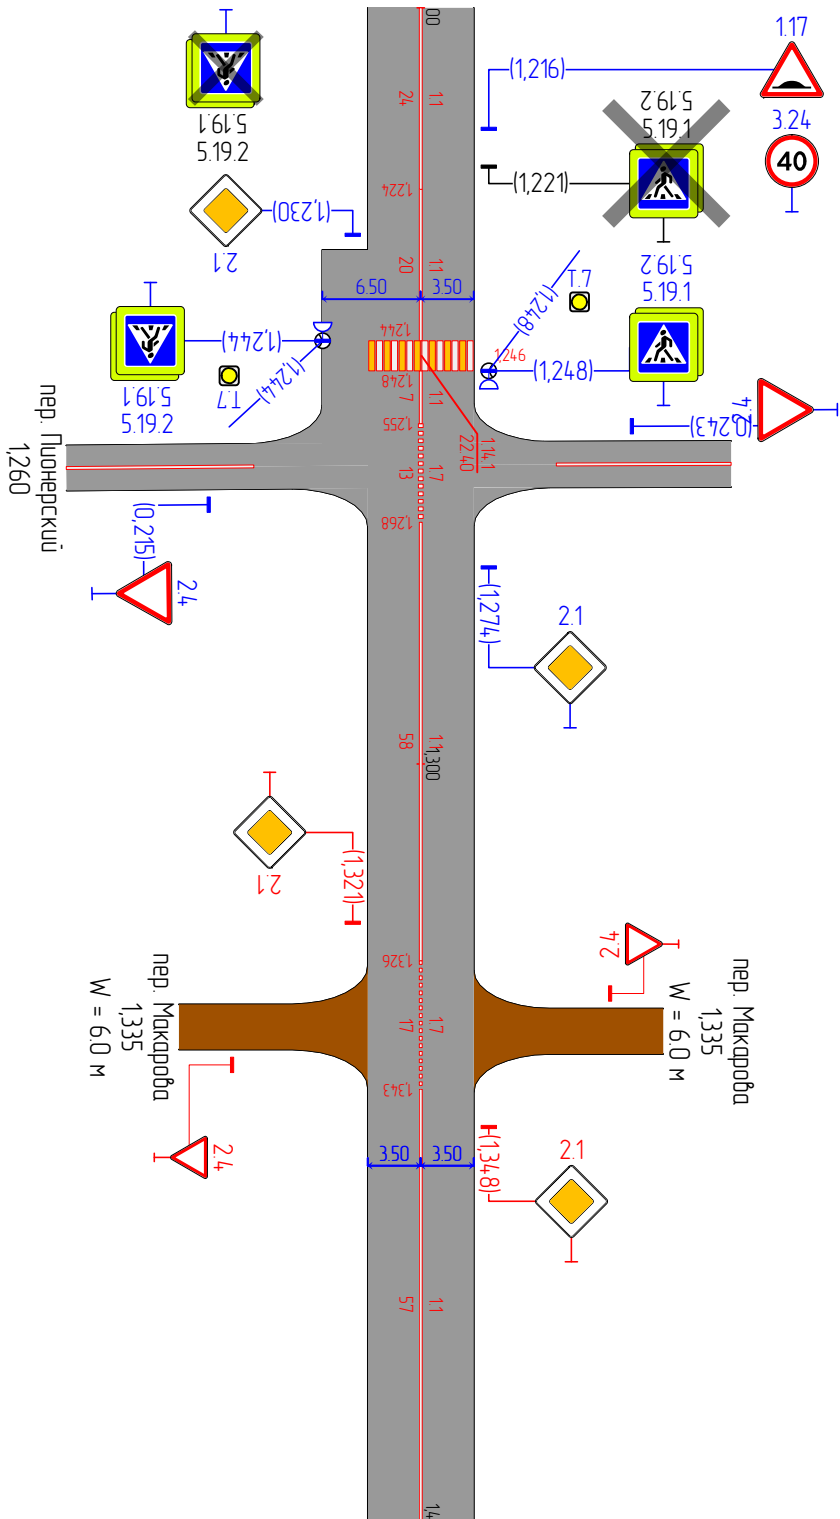


Дорожная разметка с/р/д		11	11	11	11	11	11
Ширина с/р/д, м		1200 - 1224	1224 - 1244	1244 - 1255	1255 - 1268	1268 - 1326	1326 - 1400
Проезжая часть		3,50 (л/д)	3,50 (л/д)	3,50 (л/д)	3,50 (л/д)	3,50 (л/д)	3,50 (л/д)
Зональные карманы		1200 - 1232	1232 - 1260				
Дорожные ограждения и дорожные знаки		На раздельной	На обочине				
Дорожные ограждения и дорожные знаки		На обочине	На обочине				

Ширина с/р/д, м	Зональные карманы	
Проезжая часть	Зональные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Зональные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Зональные карманы	
Дорожная разметка с/р/д	Зональные карманы	
Элементы в плане	Зональные карманы	

Ширина следа, м	Зональные карманы	
Проезжая часть		3,50 (а/б) 1,400 - 1,587
Дорожные ограждения и устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,400 – км 1,610

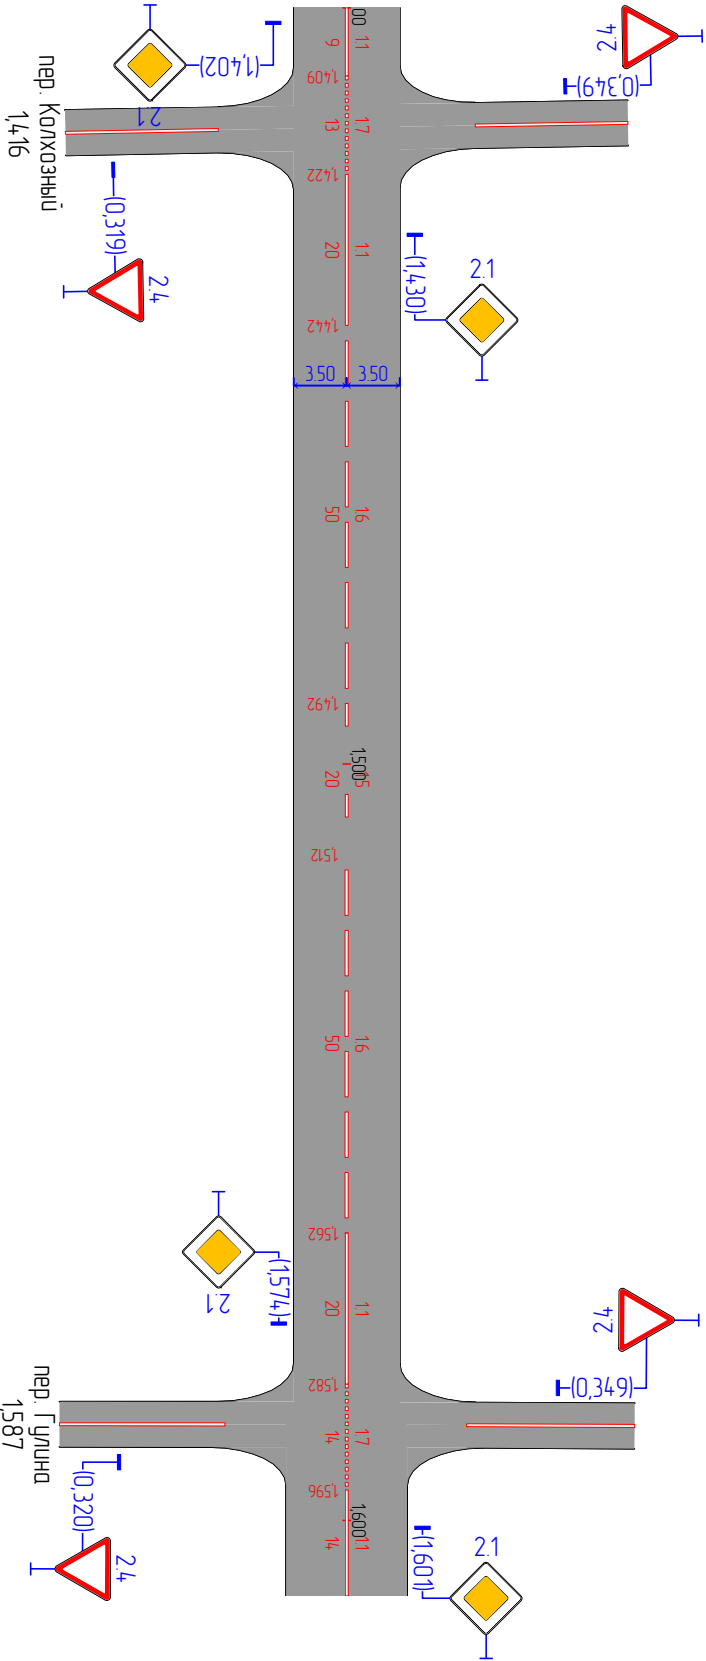

Дорожная разметка следа	11 1,400 1,409	17 1,409 - 1,422	11 1,422 - 1,442	16 1,442 - 1,492	15 1,492 - 1,512	16 1,512 - 1,562	11 1,562 - 1,582	17 1,582 - 1,596	11 1,596 - 1,610
Ширина следа, м	Проезжая часть		Зональные карманы		3,50 (а/б) 1,400 - 1,587				
Дорожные ограждения и устройства следа	На разделительной		На обочине						


Ширина следа, м	Зональные карманы	
Проезжая часть	На обочине	
Дорожные ограждения и устройства следа	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,610 – км 1,800

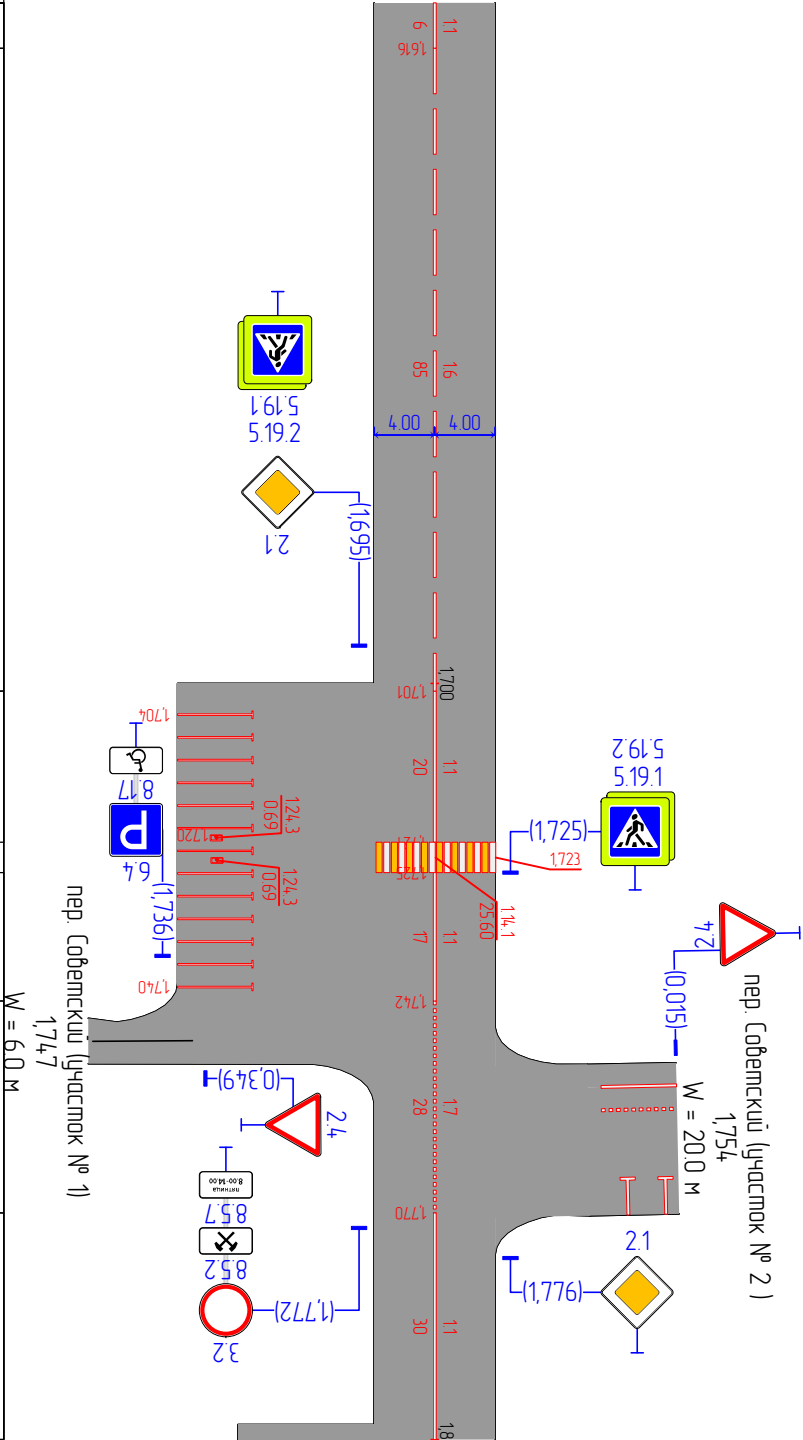


Дорожная разметка следа	11	16	11	11	11	11	11
Ширина следа, м	1610	1616	1701	1701	1721	1725	1742
Проезжая часть	4.00 (в/д)	1610 - 1700	1700 (в/д)	1700 - 1745	1742 - 1770	1770 - 1800	1800 - 1800
Зональные карманы							
На разделительной							
Дорожные ограждения и устройства следа							
На обочине							

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,800 – км 1,990

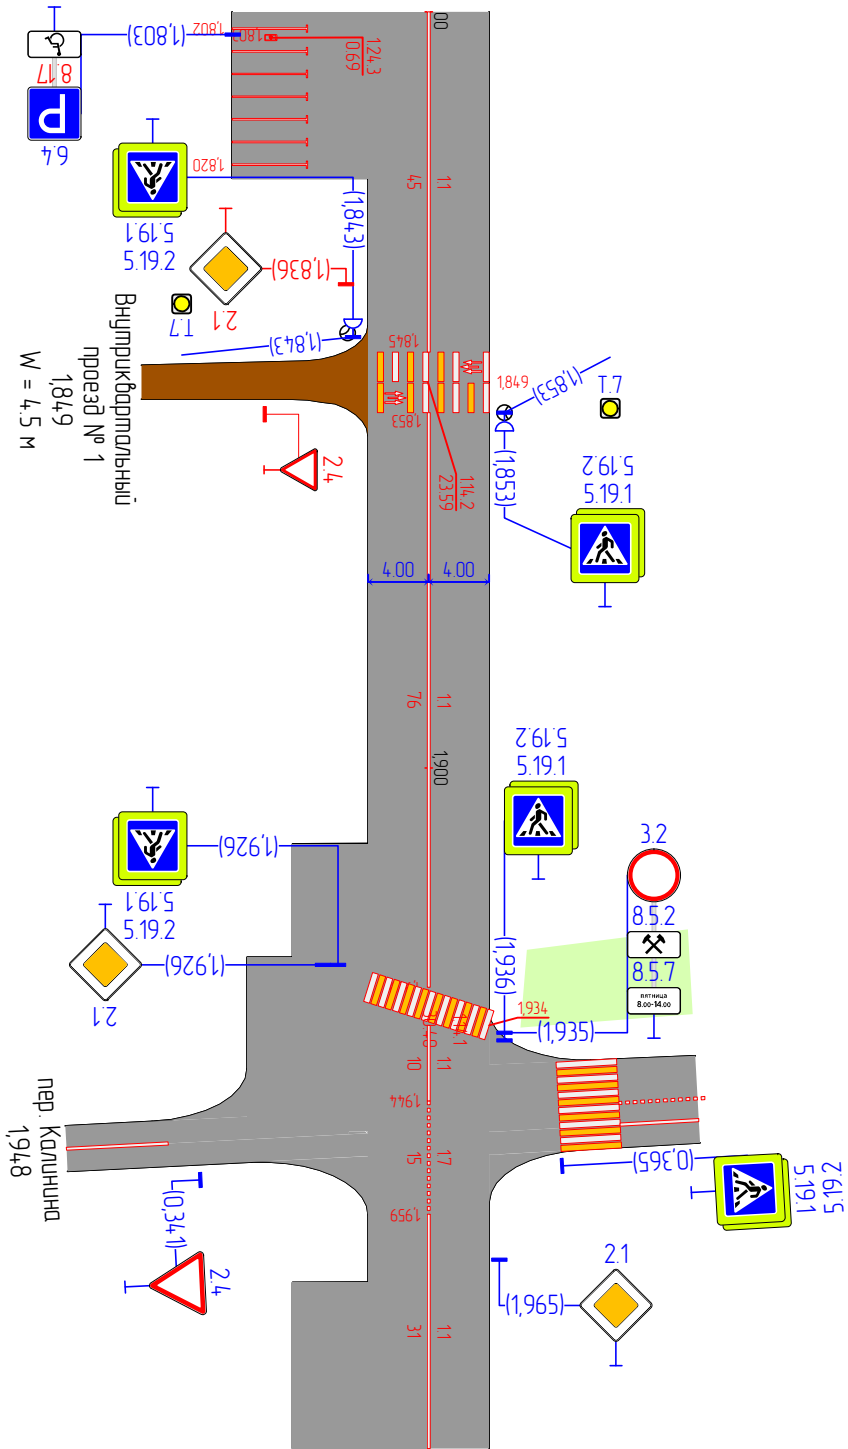

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 2,600 – км 2,790


Ширина следа, м	Зональные карманы	3,25 (в/б границей) 2,600 - 2,790
Проезжая часть		
Дорожные ограждения и устройства следа	На обочине	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

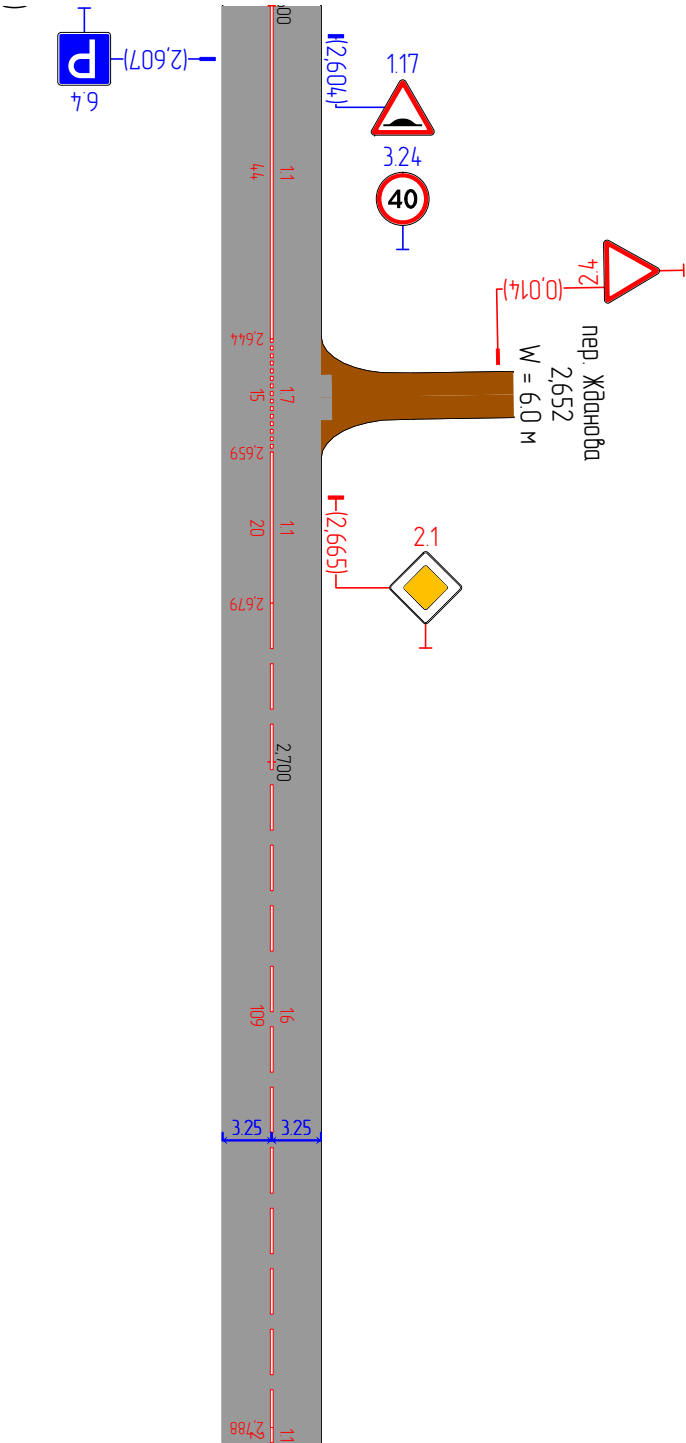

Дорожная разметка следа		11	17	11	3,25 (в/б границей) 2,600 - 2,790
Ширина следа, м		2,600 - 2,644	2,644 - 2,659	2,659 - 2,679	
Проезжая часть					
Зональные карманы					16
На разделительной					2,679 - 2,788
Дорожные ограждения и устройства следа					1,7
На обочине					1,7


Ширина следа, м	Зональные карманы	
Дорожные ограждения и устройства следа	Проезжая часть	3,25 (в/б радиусом) 3,010 - 3,200
	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 3,010 – км 3,200

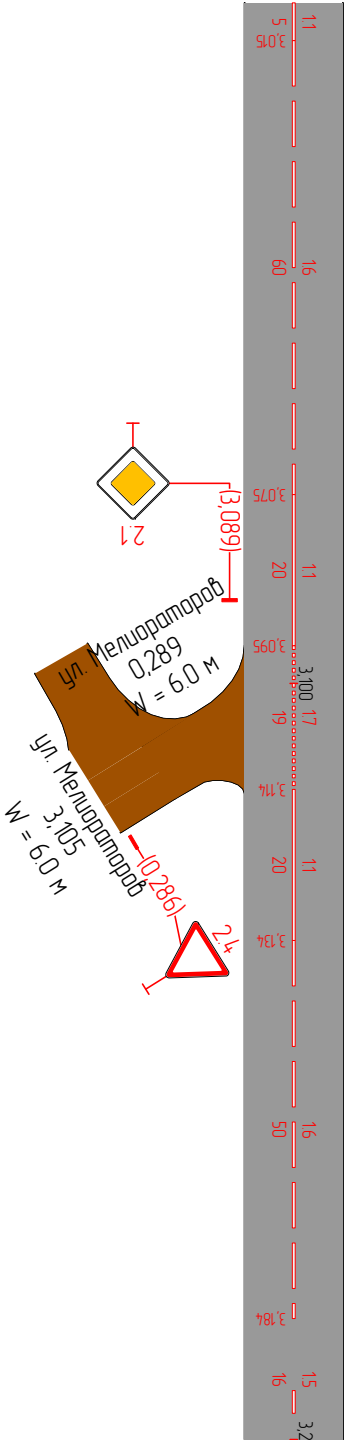

Дорожная разметка следа	11	16	11	17	11	16	15
	3,010 - 3,075	3,075 - 3,075	3,075 - 3,095	3,095 - 3,114	3,114 - 3,134	3,134 - 3,184	3,184 - 3,200
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,25 (в/б радиусом) 3,010 - 3,200					
	Зональные карманы						
Дорожные ограждения и устройства следа	На разделительной						
	На обочине						

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 3,200 – км 3,400



Ширина следа, м	Зональные карманы	
	Проезжая часть	На обочине
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


3,25 (в/д границей)
3,200 – 3,400

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	Зональные карманы
	На разделительной	На обочине
Дорожные ограждения и дорожные знаки		
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

15
3,200 – 3,400
3,25 (в/д границей)
3,200 – 3,400

Ширина следа, м	Зональные карманы	
Дорожные ограждения и устройства следа	Проезжая часть	3,25 (в/д эрозиями) 3,400 - 3,600
Дорожная разметка следа	На обочине	
	На разделительной	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Красногвардейская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 3,400 – км 3,600

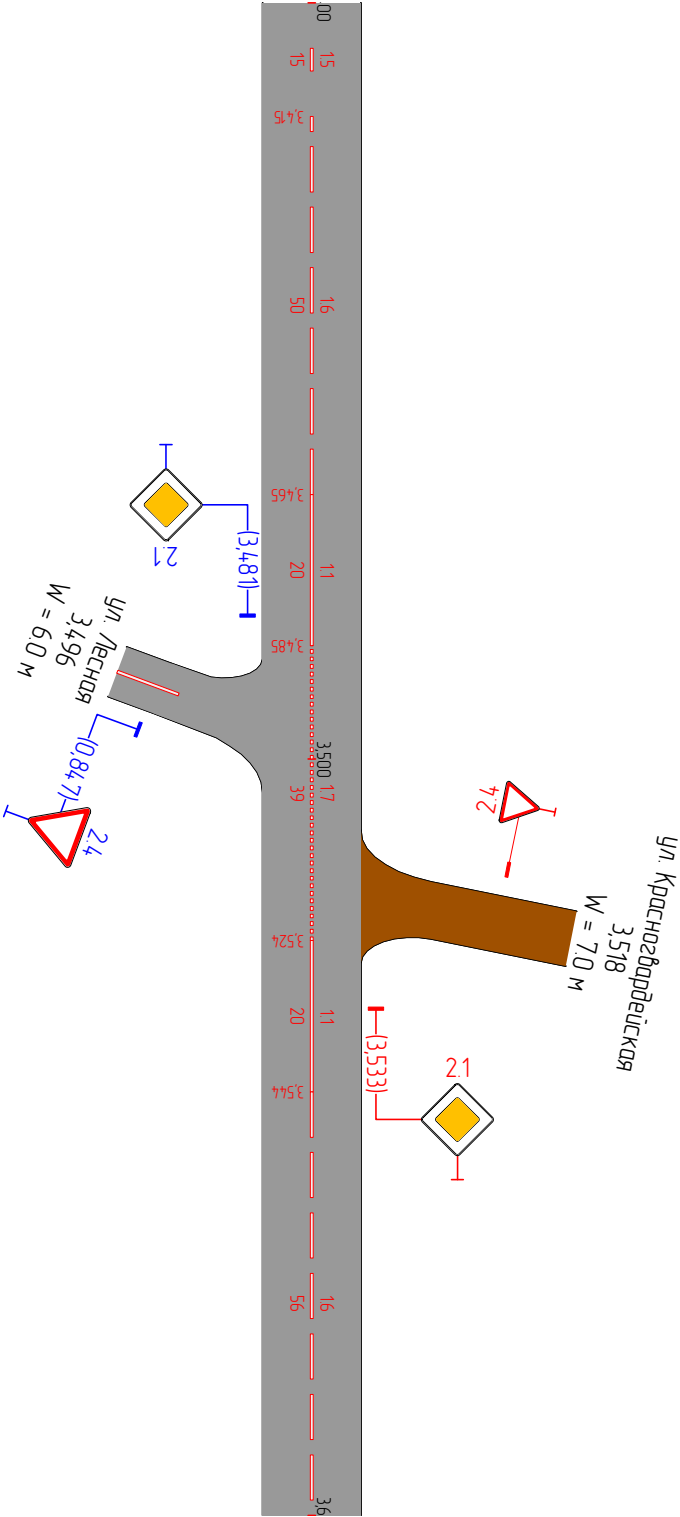

Дорожная разметка следа	15 3,400 - 3,415	16 3,415 - 3,465	11 3,465 - 3,485	17 3,485 - 3,524	11 3,524 - 3,544	16 3,544 - 3,600
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,25 (в/д эрозиями) 3,400 - 3,600				
Дорожные ограждения и устройства следа	Зональные карманы					
	На разделительной					
	На обочине					


Ширина следа, м	Звездные карманы	
Проезжая часть		3,00 (а/б) 0,000 - 0,200
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине	
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Комсомольская

Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 0,000 – км 0,200

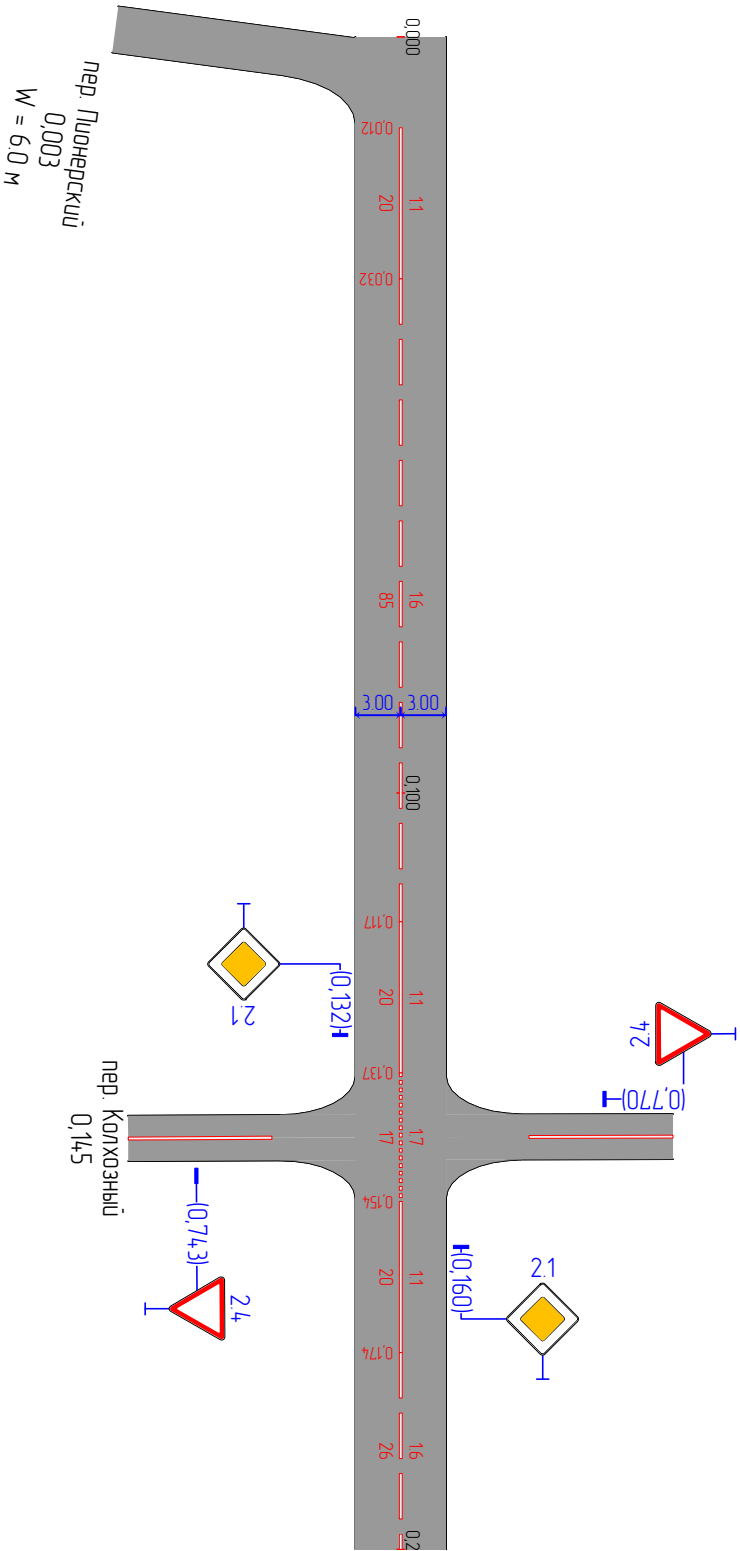

Дорожная разметка следа	11 0,012 - 0,032	16 0,032 - 0,117	11 0,117 - 0,137	17 0,137 - 0,154	11 0,154 - 0,174	16 0,174 - 0,200
Ширина следа, м	Проезжая часть					
Дорожные ограждения и дорожные устройства	Звездные карманы					
	На разделительной					
	На обочине					


Ширина следа, м	Звездные короны	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,400 - 0,600
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На разделительной полосе	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Комсомольская

Выполнено по состоянию на май 2025 г.


км 0,400 – км 0,600

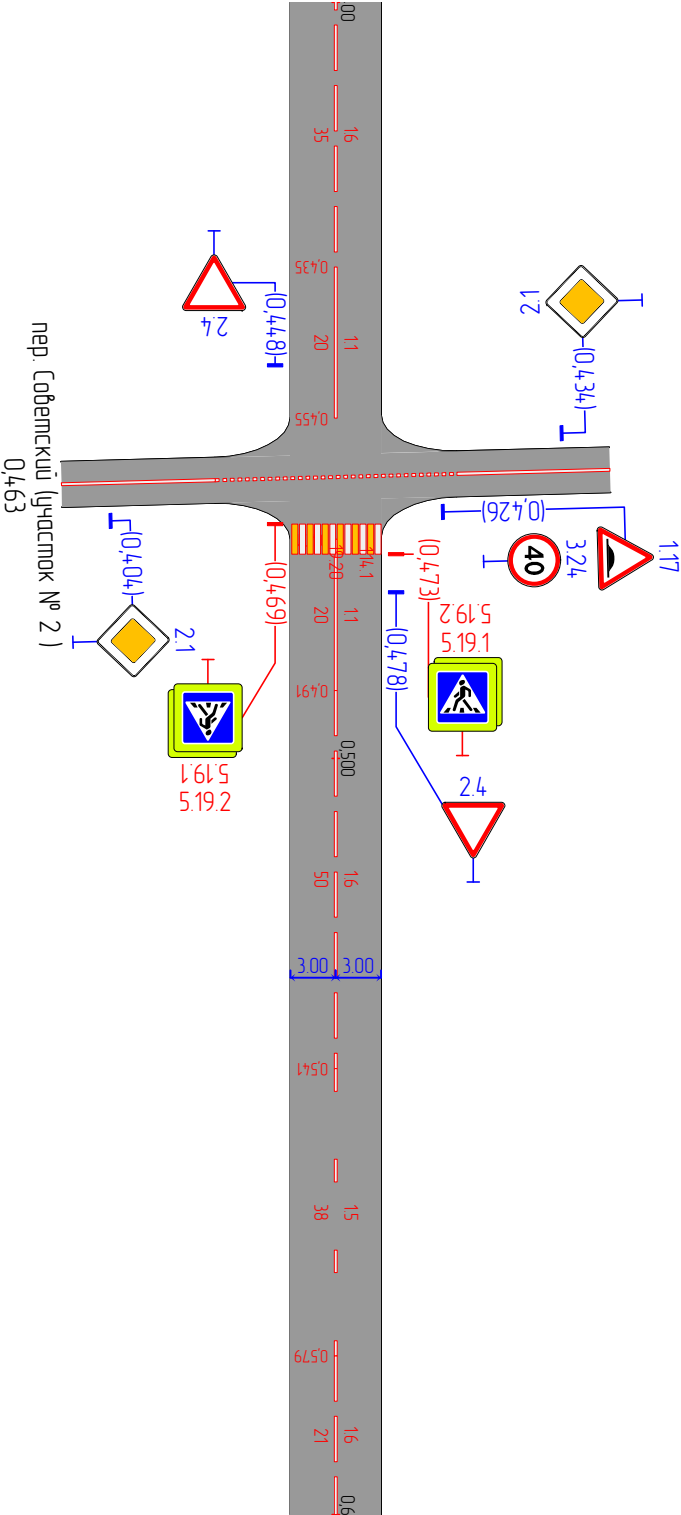

Дорожная разметка следа	16	11	11	16	15	16
Ширина следа, м	0,400 - 0,435	0,435 - 0,455	0,471 - 0,491	0,491 - 0,541	0,541 - 0,579	0,579 - 0,600
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Звездные короны	Звездные короны	Звездные короны	Звездные короны	Звездные короны	Звездные короны
Дорожная разметка следа	На обочине	На обочине	На обочине	На обочине	На обочине	На обочине

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Комсомольская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,000 – км 1,190

Ширина следа, м	Звездные карманы	2,50 (а, б) 1000 - 1190
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и надporожные устройства следа	На обочине	
	На раздельной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		



Дорожная разметка следа		11 1000 - 1000	16 1000 - 1060	15 1060 - 1131	16 1131 - 1181	11 1181 - 1190
Ширина следа, м	Проезжая часть					
	Звездные карманы	250 (а/б) 1000 - 1190				
Дорожные ограждения и надporожные устройства следа	На раздельной устройстве следа					
	На обочине					


Ширина следа, м	Звездные коридоры	
Дорожные ограждения и дорожные ограждающие устройства следа	Проезжая часть	2,50 м/дп 1,190 - 1,400
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На разделительной	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Комсомольская


Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 1,190 – км 1,400

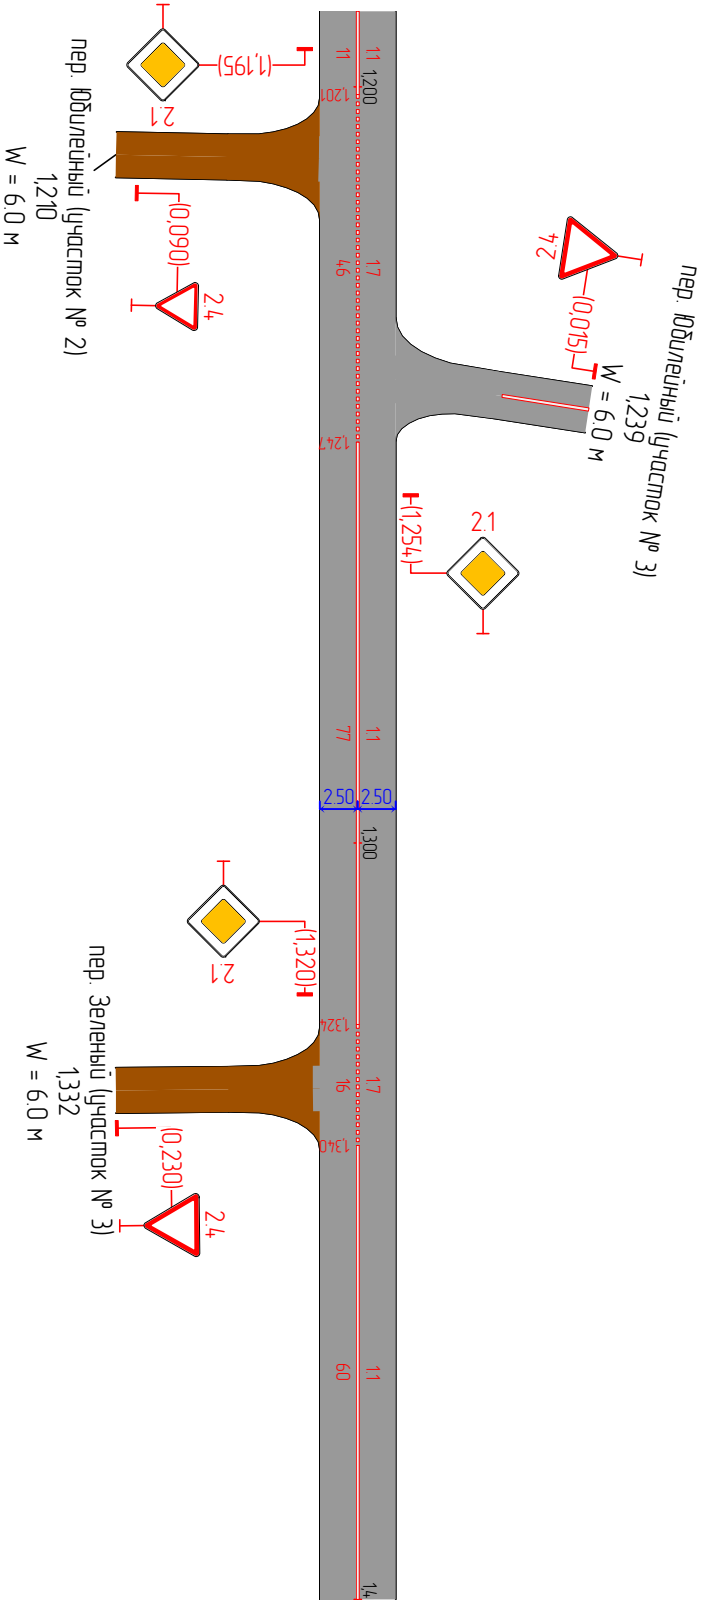

Дорожная разметка следа	11	17	11	17	11
Ширина следа, м	1,190 - 1,201	1,201 - 1,247	1,247 - 1,324	1,324 - 1,340	1,340 - 1,400
Дорожные ограждения и дорожные ограждающие устройства следа	Звездные коридоры	2,50 м/дп 1,190 - 1,400			
	На обочине				

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Комсомольская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,400 – км 1,538

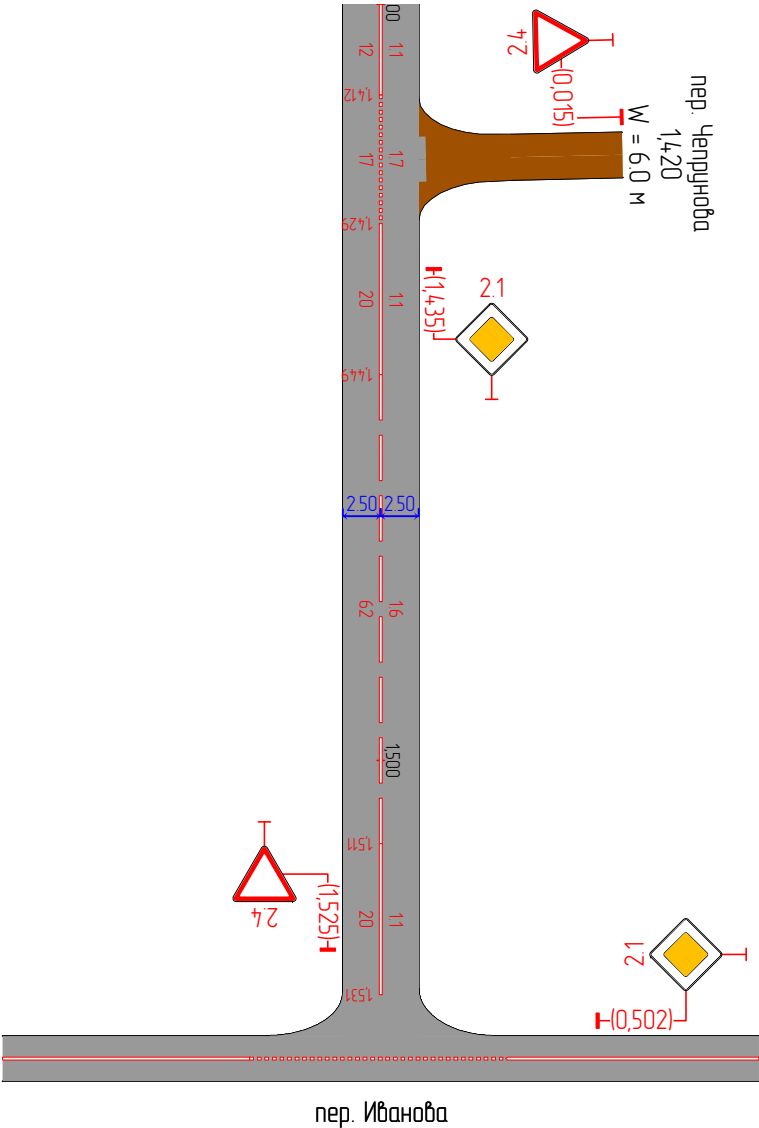


Дорожная разметка спора		11	17	11	16	11	
Ширина спора, м		1400 - 1412	1412 - 1429	1429 - 1449	1449 - 1511	1511 - 1531	
Проезжая часть		2.50 (0, 0) 1400 - 1539					
Знаковые коридоры							
Дорожные ограждения и дорожные устройства спора							
На раздельном							
На обочине							

Ширина спора, м	Знаковые коридоры	2.50 (0, 0) 1400 - 1539
Дорожные ограждения и дорожные устройства спора	На обочине	
Дорожные ограждения и дорожные устройства спора	На раздельном	
Дорожная разметка спора		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Лесная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,150

Звездные корданы	
Ширина следа, м	3 00 (в/б) 0,000 - 0,150
Проезжая часть	
На обочине	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	
На разделительной	
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	

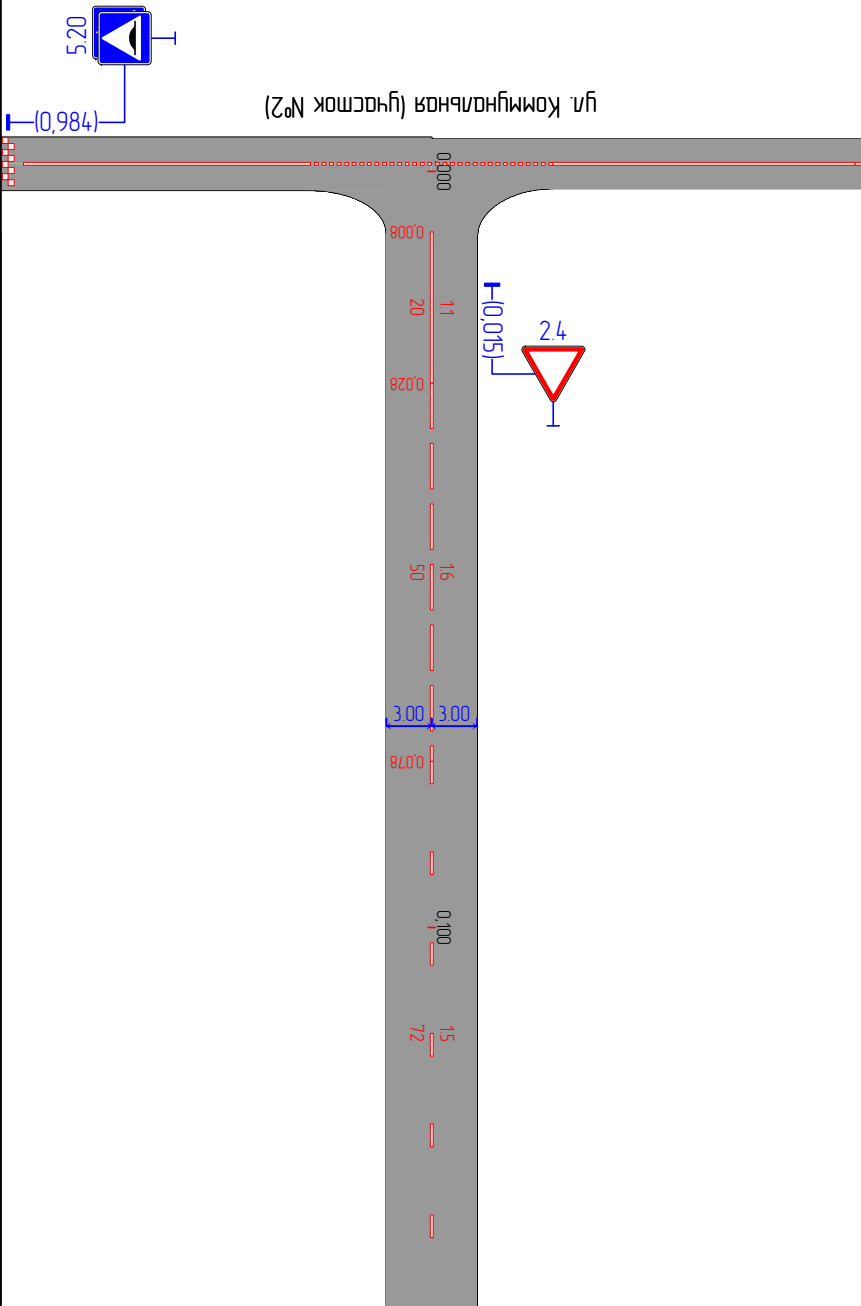

Дорожная разметка следа		11 0,008 - 0,028	16 0,028 - 0,078	15 0,078 - 0,150
Ширина следа, м	Проезжая часть			
	Звездные корданы			3 00 (в/б) 0,000 - 0,150
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На разделительной			
	На обочине			


Ширина следа, м	Звездные карманы	
	Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,150 - 0,350
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Лесная

Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 0,150 – км 0,350

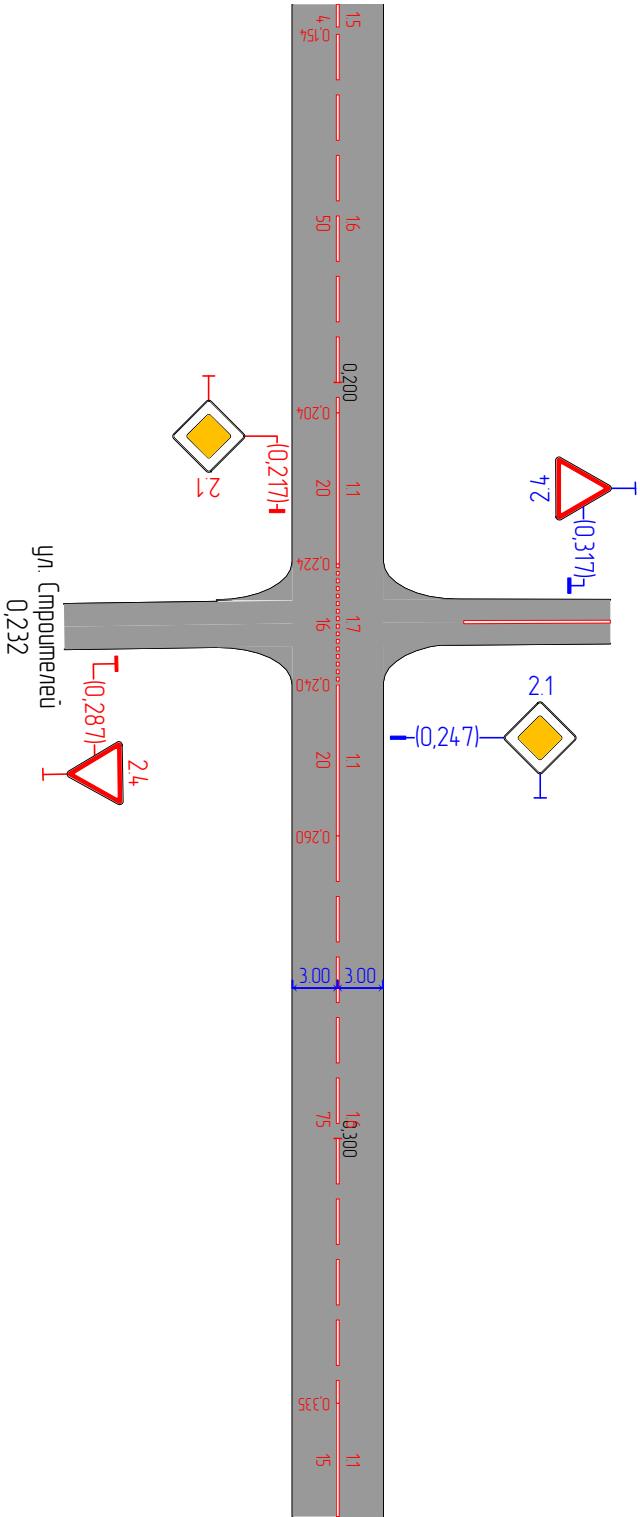


Дорожная разметка следа	15 0,150 0,154	16 0,154 - 0,204	11 0,204 - 0,224	17 0,224 - 0,240	11 0,240 - 0,260	16 0,260 - 0,335	11 0,335 - 0,350
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,150 - 0,350					
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	Звездные карты						
	На разделительной						
	На обочине						

Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На обочине	
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		


3,00 (в/д)
0,350 - 0,550

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Лесная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,350 – км 0,550

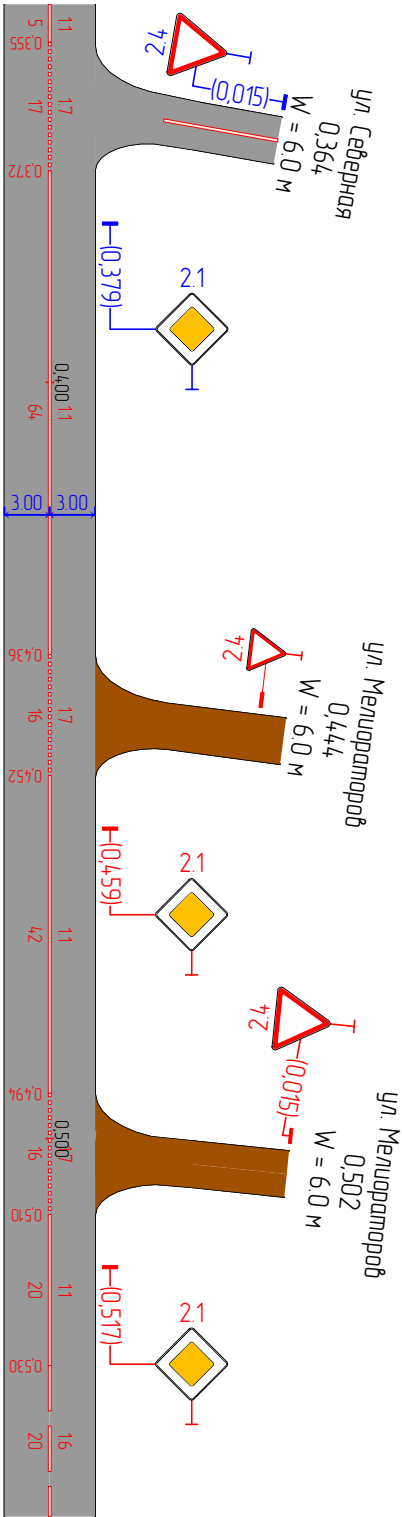

Дорожная разметка следа	11	17	11	17	11	17	11	16
Ширина следа, м	0,360	0,355 - 0,372	0,372 - 0,436	0,436 - 0,452	0,452 - 0,494	0,494 - 0,510	0,510 - 0,530	0,530 - 0,550
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На обочине	На разделительной	На обочине	На разделительной	На обочине	На разделительной	На обочине	На разделительной


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Лесная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,550 – км 0,750



Ширина следа, м	Звездные карманы	
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На обочине	3,00 (в/д) 0,550 - 0,750
	На раздельной полосе	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Дорожная разметка следа		16 0,550 - 0,580	15 0,580 - 0,750
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,550 - 0,750	
	Звездные карманы		
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На раздельной полосе		
	На обочине		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Лесная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,750 – км 0,859

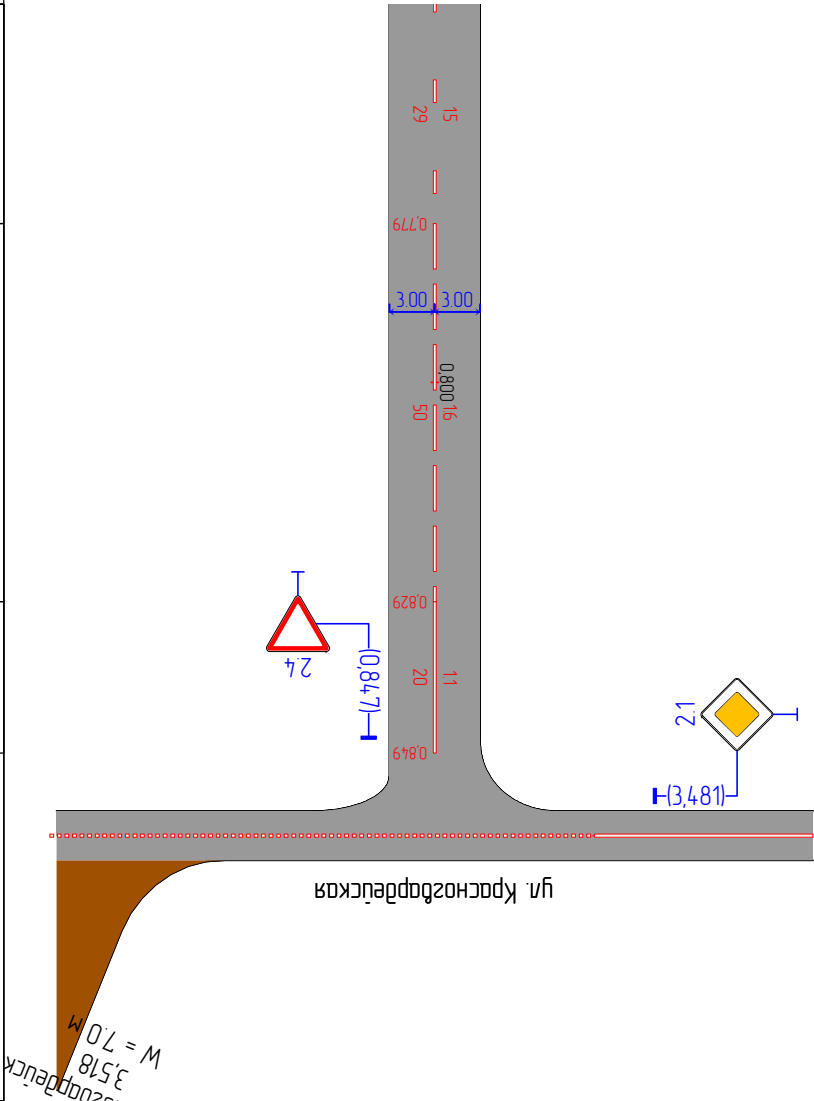

Дорожная разметка съезда		15	16	11	
0.750 - 0.779		0.779 - 0.829	0.829 - 0.849		
Ширина съезда, м		3.00 (a/d)			
Проезжая часть		Звездные карманы			
Дорожные ограждения и дорожные устройства съезда		На раздельном			
		На обочине			

Ширина съезда, м	Звездные карманы		
	Проезжая часть	3.00 (a/d)	
Дорожные ограждения и дорожные устройства съезда	На обочине		
	На раздельном		
Дорожная разметка съезда			
Элементы в плане			


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Луговая
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

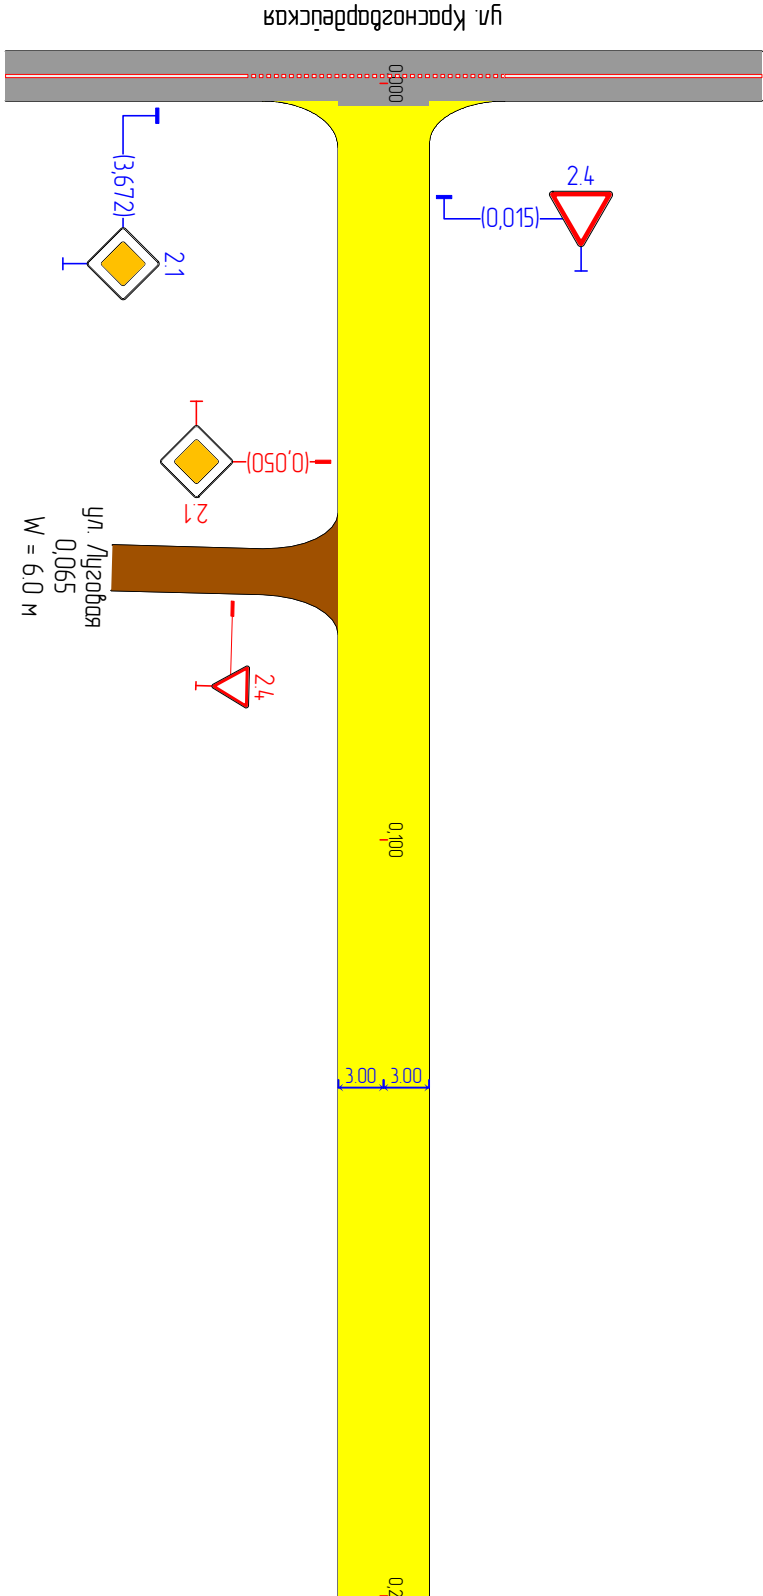

Звездные кордны	
Проезжая часть	3.00 (шир.) 0.003 - 0.200
На обочине	
На разделительной устройстве следа	
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	3.00 (шир.) 0.003 - 0.200
Звездные кордны	
На разделительной устройстве следа	
На обочине	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Луговая
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,400




Дорожная разметка strada	
Ширина strada, м	Проезжая часть
	Звездные карманы
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	
	На раздельном
	На обочине

Ширина strada, м	Звездные карманы
	Проезжая часть
	Звездные карманы
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	
	На раздельном
	На обочине
Дорожная разметка strada	
Элементы в плане	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Луговая
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,400 – км 0,569

Ширина следа, м	Звездные корданы	3,00 (шед) 0,400 – 0,569
	Проезжая часть	
	На обочине	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На разделительной	
	Дорожная разметка следа	
Элементы в плане		



Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (шед) 0,400 – 0,569
	Звездные корданы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На разделительной	
	На обочине	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Мелиораторов
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

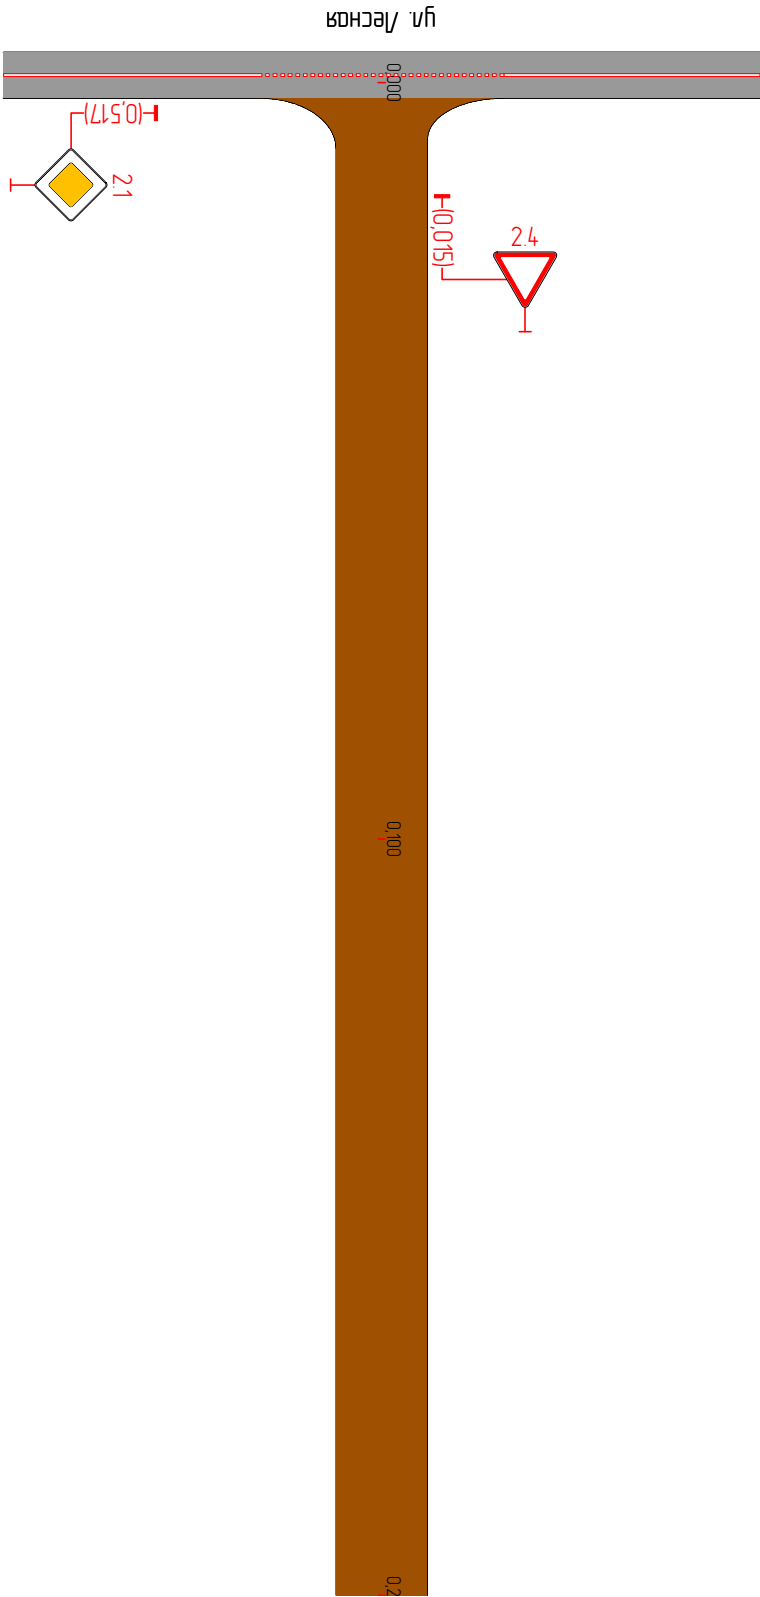


Дорожная разметка strada		
Ширина strada, м	Проезжая часть	3.00 (судит) 0.002 - 0.200
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	Знак 21	
	На разделительной	
На обочине		

Ширина strada, м	Знак 21	3.00 (судит) 0.002 - 0.200
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка strada		
Элементы в плане		

Ширина следа, м	Звездные корданы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства	Проезжая часть	300 (внутр) 0,200 - 0,302
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На разделительной полосе	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Мелиораторов
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,304

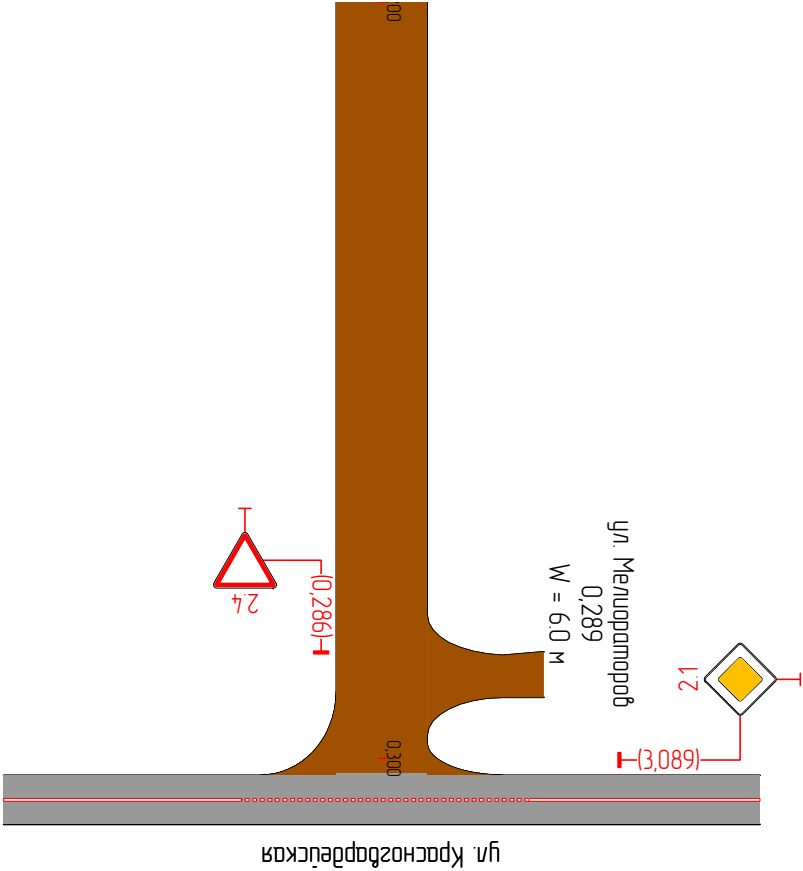

Дорожная разметка следа			
Ширина следа, м	Проезжая часть	300 (внутр) 0,200 - 0,302	
	Звездные корданы		
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На разделительной		
	На обочине		

Ширина следа, м	Звездные карманы	
	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,000 - 0,200
Дорожные ограждения и надобновляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельной устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Набережная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

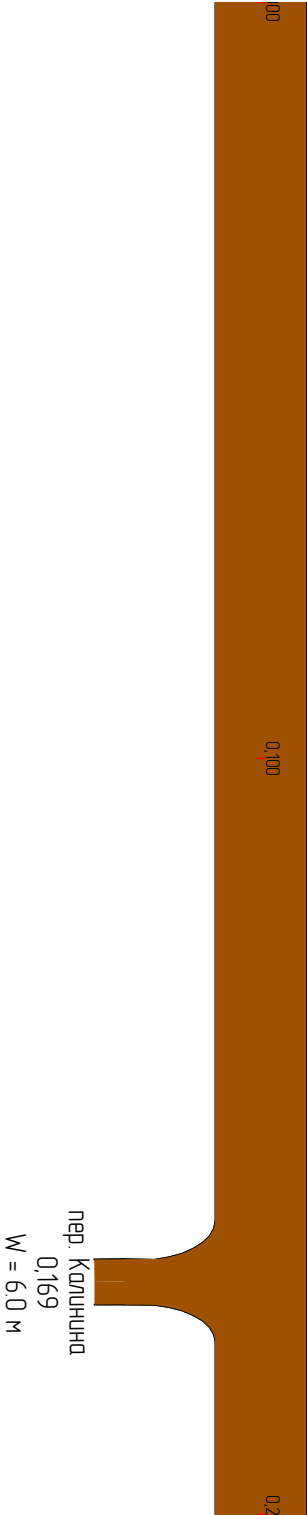

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,000 - 0,200
	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и надобновляющие устройства следа	На раздельной устройстве следа	
	На обочине	

Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и надporожные устройства следа	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,200 - 0,400
	На обочине	
Дорожная разметка следа	На раздельном устройстве следа	
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Набережная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,400

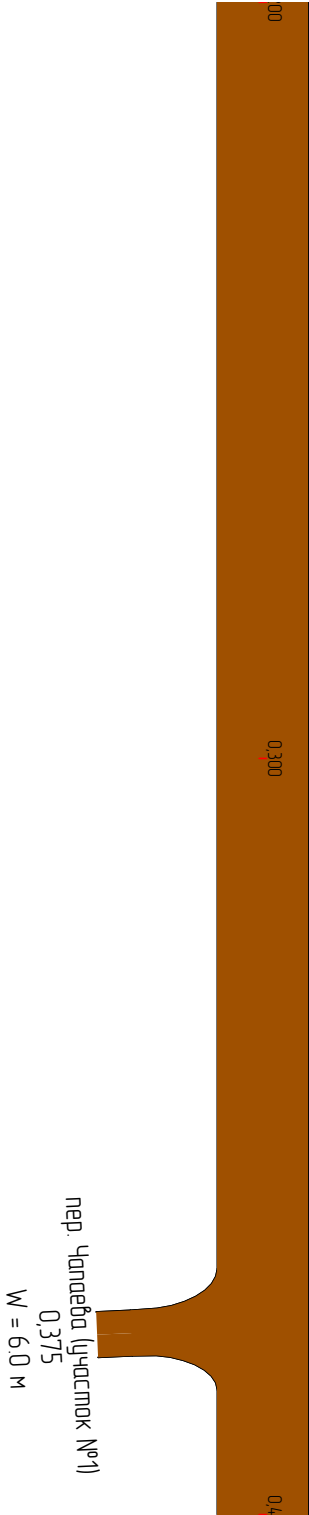

Дорожная разметка strada	
Ширина strada, м	Проезжая часть Звездные карманы
Дорожные ограждения и надгравные устройства strada	На раздельной На обочине

Ширина следа, м	Зазездные карманы	
Дорожные ограждения и порождающие устройства следа	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,400 - 0,600
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На разделительной	
	Дорожная разметка следа	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Набережная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,400 – км 0,600

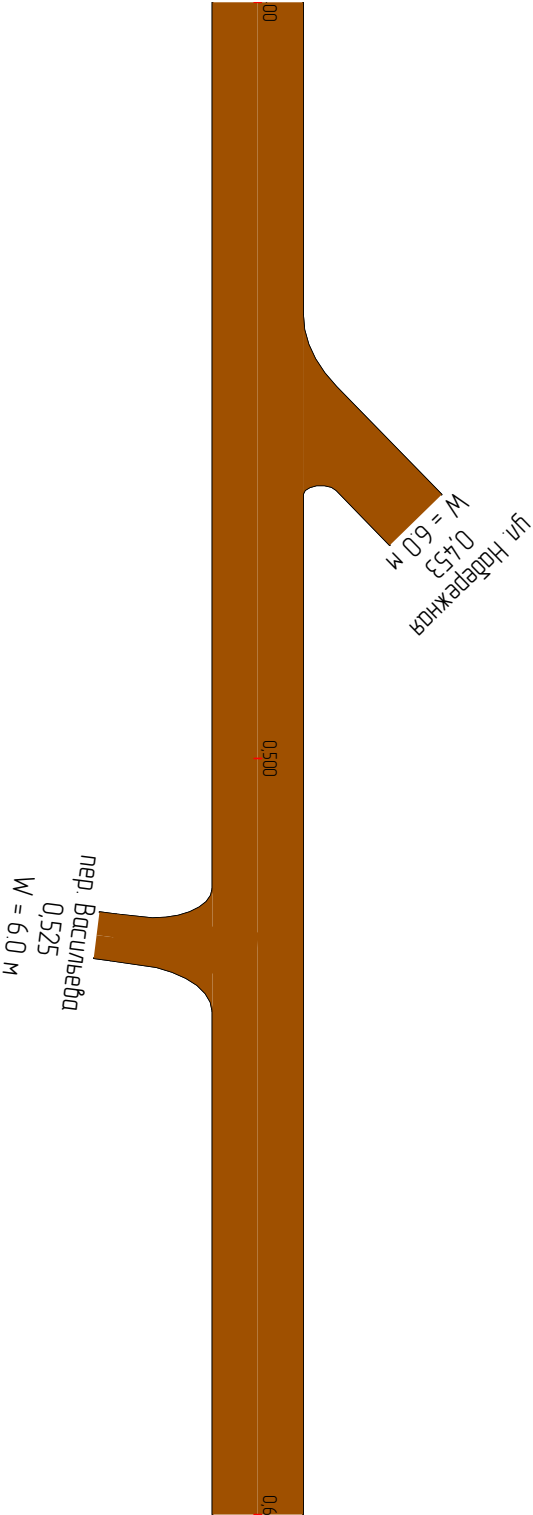

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	Проезжая часть 3,00 (всего) 0,400 - 0,600
Дорожные ограждения и порождающие устройства следа	Зазездные карманы
	На разделительной
	На обочине

Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,600 - 0,800
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На разделительной полосе	
	Дорожная разметка следа	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Набережная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,600 – км 0,800

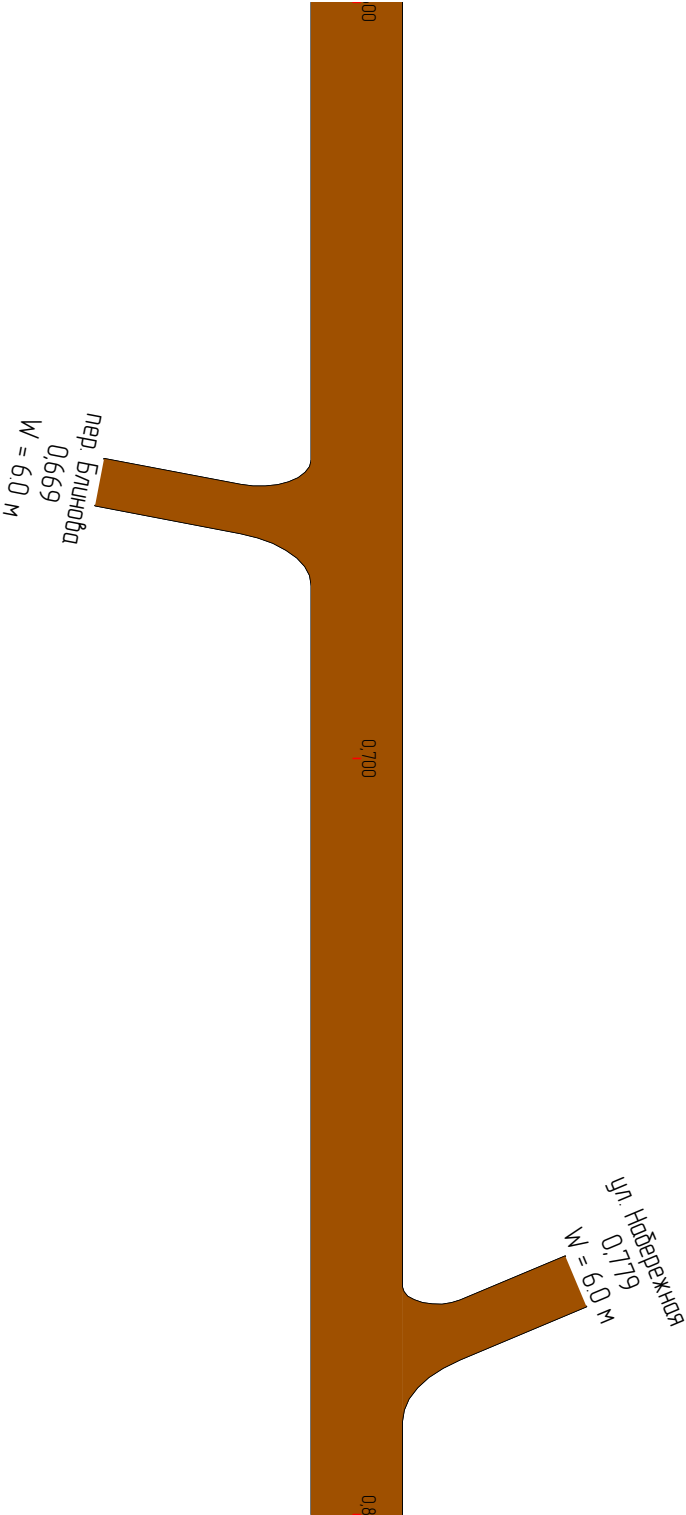

Дорожная разметка strada		
Ширина strada, м	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,600 - 0,800
	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На разделительной	
	На обочине	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Набережная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,800 – км 1,000

Ширина следа, м	Зазездные карманы	3,00 (всунт) 0,800 - 1,000
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и надобняющие устройства следа	На обочине	
	На раздвительной устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		



Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (всунт) 0,800 - 1,000
	Зазездные карманы	
Дорожные ограждения и надобняющие устройства следа	На раздвительной	
	На обочине	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Набережная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,000 – км 1,055



Ширина следа, м	Звездные карманы	
	Проезжая часть	3 00 (ручн) 1,000 - 1,055
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельной устройства следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3 00 (ручн) 1,000 - 1,055
	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На раздельной	
	На обочине	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Озерная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

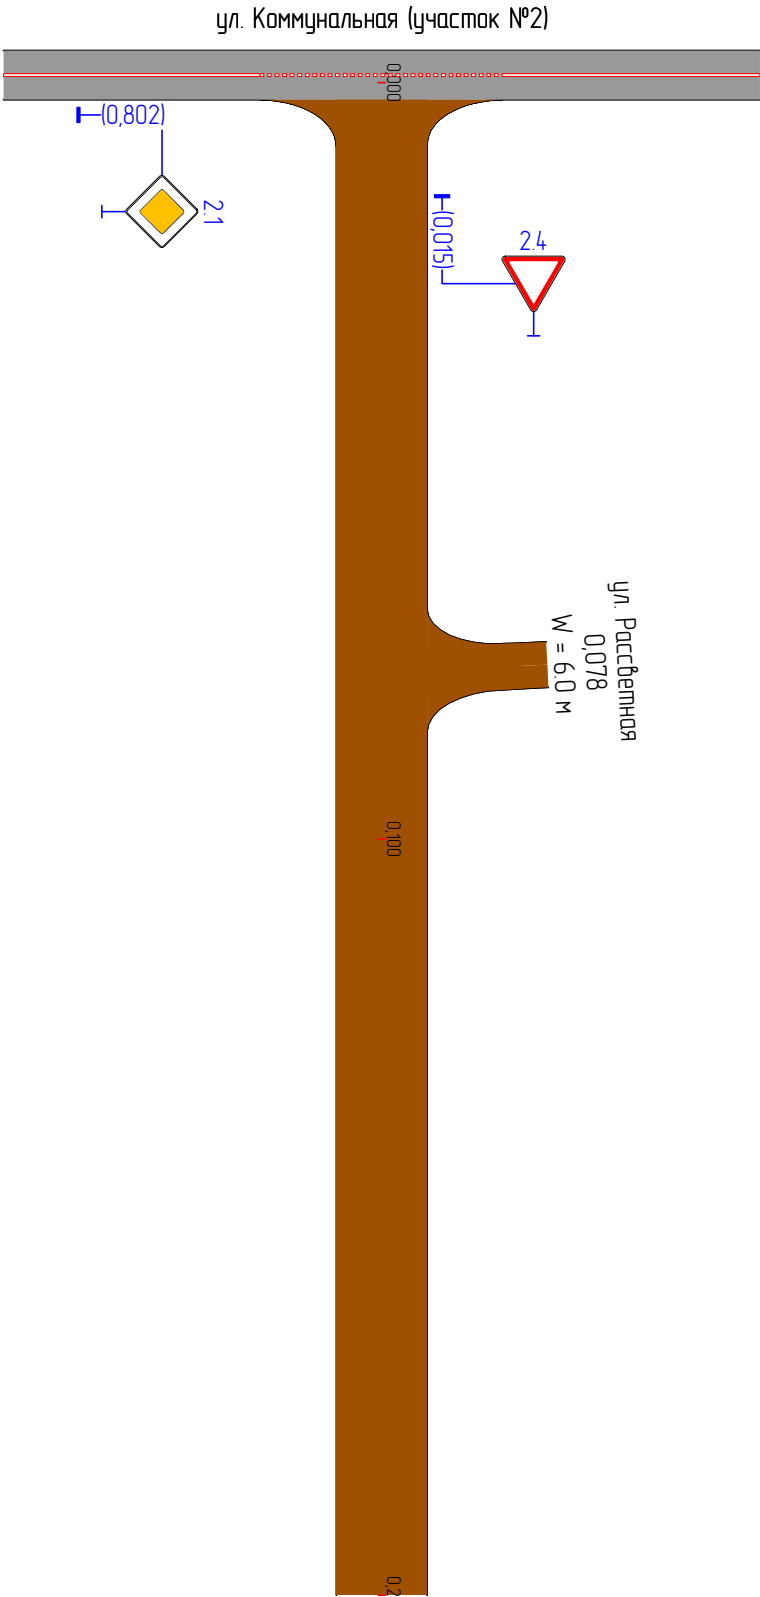


Дорожная разметка strada			
Ширина strada, м	Проезжая часть		
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Знаковые коридоры		
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На раздельном		
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На обочине		

Ширина следа, м	Знаковые коридоры	
	Проезжая часть	3,00 (судит) 0,000 - 0,200
Дорожные ограждения и маркирующие устройства следа	На обочине	
	На раздельный	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


Ширина следа, м	Звездные карманы	
	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,200 - 0,400
Дорожные ограждения и порождающие устройства следа	На обочине	
	На раздельной устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Озерная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,400

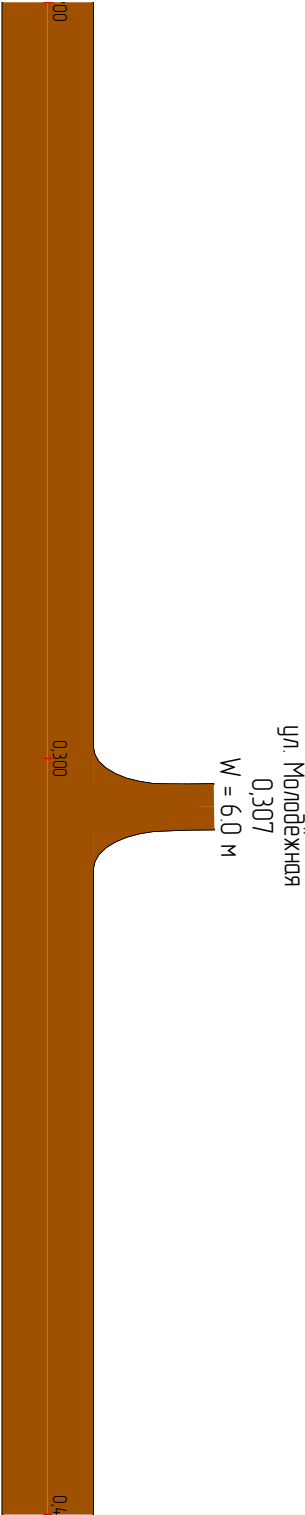

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,200 - 0,400
	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и порождающие устройства следа	На раздельной	
	На обочине	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Озерная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,400 – км 0,600




Засеженные корданы	
Ширина следа, м	Проезжая часть
3,00 (всего) 0,400 - 0,600	
Дорожные ограждения и надоборывающие устройства следа	На обочине
	На раздельном устройстве следа
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	Проезжая часть
3,00 (всего) 0,400 - 0,600	
Дорожные ограждения и надоборывающие устройства следа	На обочине
	На раздельном устройстве следа
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Озерная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,600 – км 0,800

Ширина следа, м	Зазездные карманы	3,00 (всего) 0,600 - 0,800
	Проезжая часть	
	На обочине	
Дорожные ограждения и надобновляющие устройства следа		
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		



Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,600 - 0,800
	Зазездные карманы	
Дорожные ограждения и надобновляющие устройства следа		
На обочине		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Озерная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,800 – км 1,000



Ширина следа, м		Заземные карманы
Проезжая часть		3.00 (всего) 0.800 - 1.000
Дорожные ограждения и надоборудованные устройства следа	На обочине	
	На раздельном устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3.00 (всего) 0.800 - 1.000
	Заземные карманы	
Дорожные ограждения и надоборудованные устройства следа	На раздельном устройстве следа	
	На обочине	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Озерная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,000 – км 1,106



Ширина следа, м	Звездные корданы	300 (ручн) 1000 - 1106
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	300 (ручн) 1,000 - 1,106
	Звездные корданы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На раздельной устройстве следа	
	На обочине	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Октябрьская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,400 – км 0,600

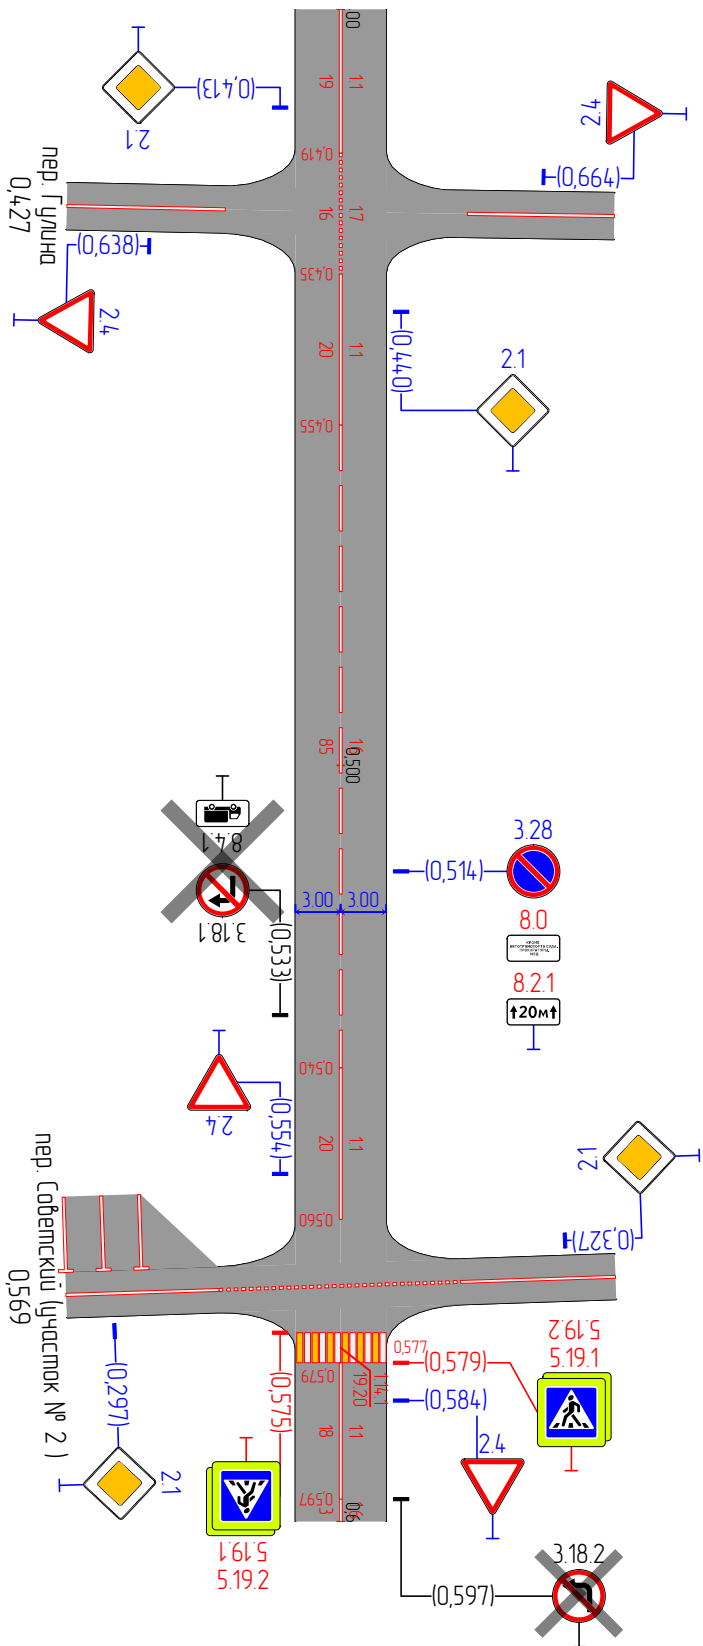


Ширина следа, м	Звездные корданы	
Поездная часть		3,00 (в/д) 1,200 - 1,400
Дорожные ограждения и порождающие устройства следа	На обочине	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Октябрьская

Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 1,200 – км 1,400

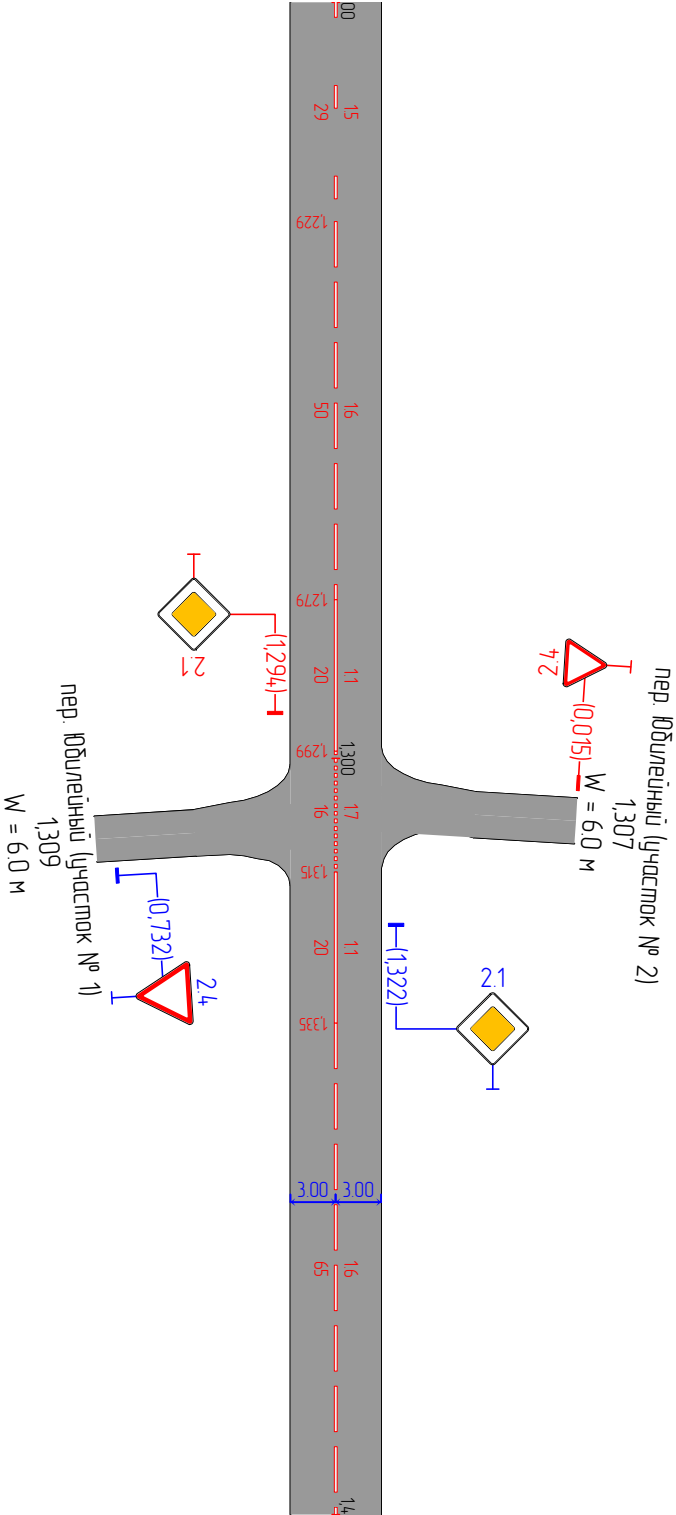

Дорожная разметка следа	15	16	11	17	11	16
	1200 - 1229	1229 - 1279	1279 - 1299	1299 - 1335	1335 - 1335	1335 - 1400
Ширина следа, м	3,00 (в/д) 1,200 - 1,400					
Поездная часть						
Звездные корданы						
Дорожные ограждения и порождающие устройства следа	На обочине					


Ширина следа, м	Звездные корданы	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 л/д/п 1600 - 1730
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На разделительной полосе	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Октябрьская

Выполнено по состоянию на май 2025 г.


км 1,600 – км 1,730

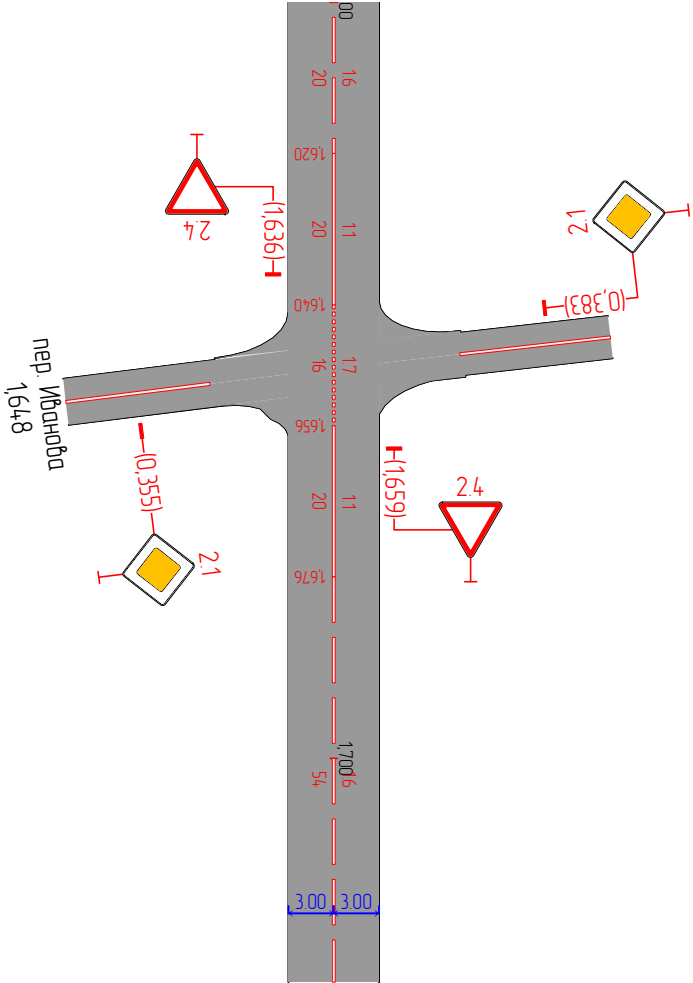

Дорожная разметка следа	16	11	17	11	16
Ширина следа, м	1600 - 1620	1620 - 1640	1640 - 1656	1656 - 1676	1676 - 1730
Проезжая часть	3,00 л/д/п 1600 - 1730				
Звездные корданы					
Дорожные ограждения и дорожные знаки					
На разделительной полосе					
На обочине					

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Первомайская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,600 – км 0,800


Ширина следа, м	Звездные карманы	
Проезжая часть		3,00 (в/д) 0,600 - 0,800
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине	
На разделительной полосе		
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

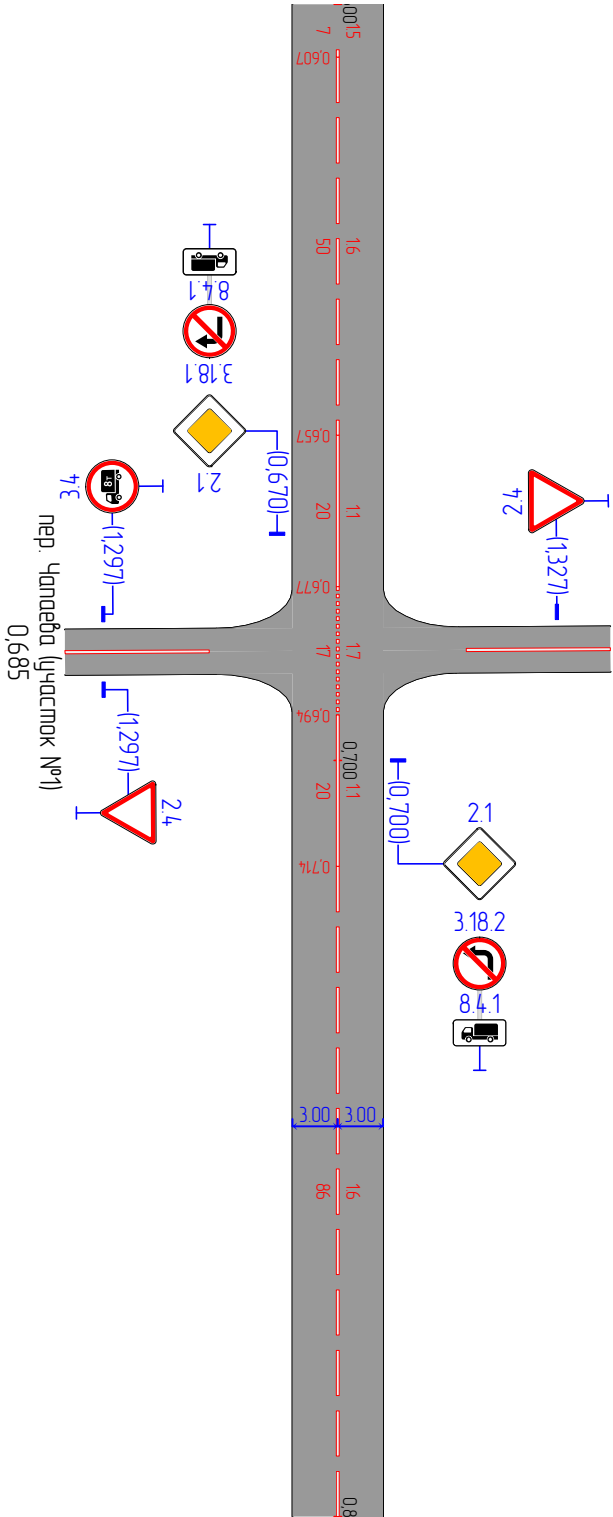

Дорожная разметка следа	15 0,600 0,607	16 0,607 - 0,657	11 0,657 - 0,677	17 0,677 - 0,694	11 0,694 - 0,714	16 0,714 - 0,800
Ширина следа, м						
Проезжая часть						
Звездные карманы						
Дорожные ограждения и дорожные устройства						
На разделительной полосе						
На обочине						


Звездные карты	
Проезжая часть	3,00 (в/д) 1,000 - 1,200
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
На обочине	
Дорожная разметка	
Элементы в плане	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Первомайская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,000 – км 1,200

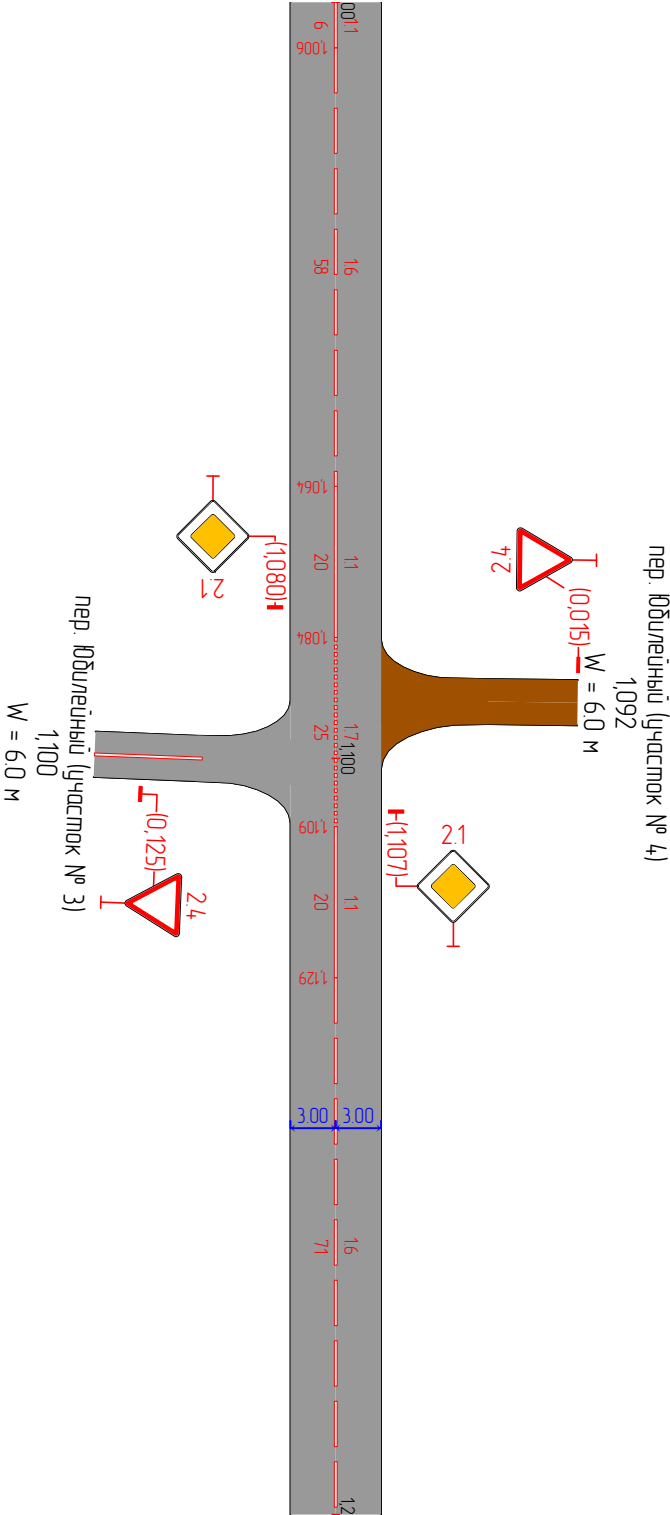

Дорожная разметка	сграда	11	16	11	17	11	16
Ширина сграда	м	1000 1006	1006 - 1064	1064 - 1084	1084 - 1109	1109 - 1129	1129 - 1200
Проезжая часть	Звездные карты						
Дорожные ограждения и направляющие устройства	На раздельном на обочине						


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Первомайская
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,200 – км 1,365

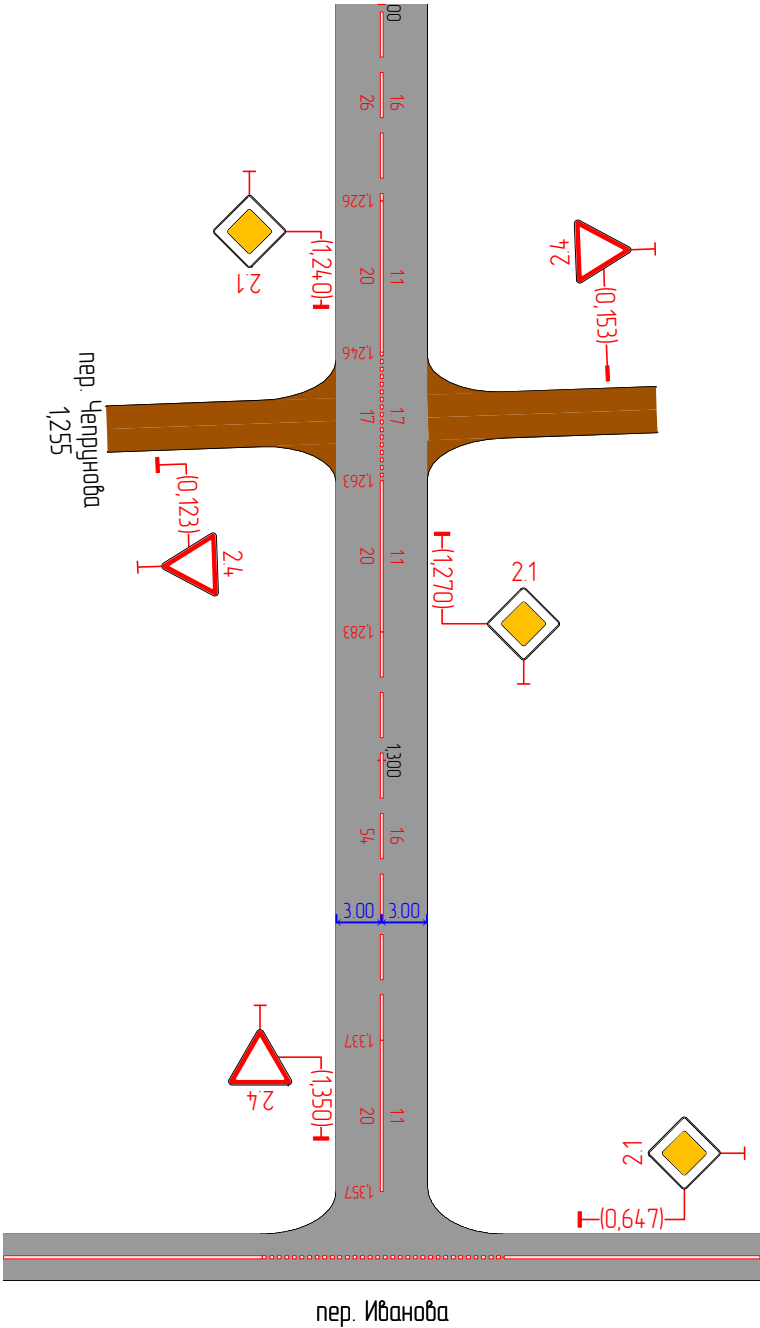

Звездные карты	Ширина следа, м
Проезжая часть	3,00 (а/б) 1,200 - 1,365
На обочине	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	

Дорожная разметка следа	16 1,200 - 1,226	11 1,226 - 1,246	17 1,246 - 1,263	11 1,263 - 1,283	16 1,283 - 1,337	11 1,337 - 1,357
Ширина следа, м	Проезжая часть	Звездные карты		3,00 (а/б) 1,200 - 1,365		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На раздельной	На обочине				

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Северная
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,400

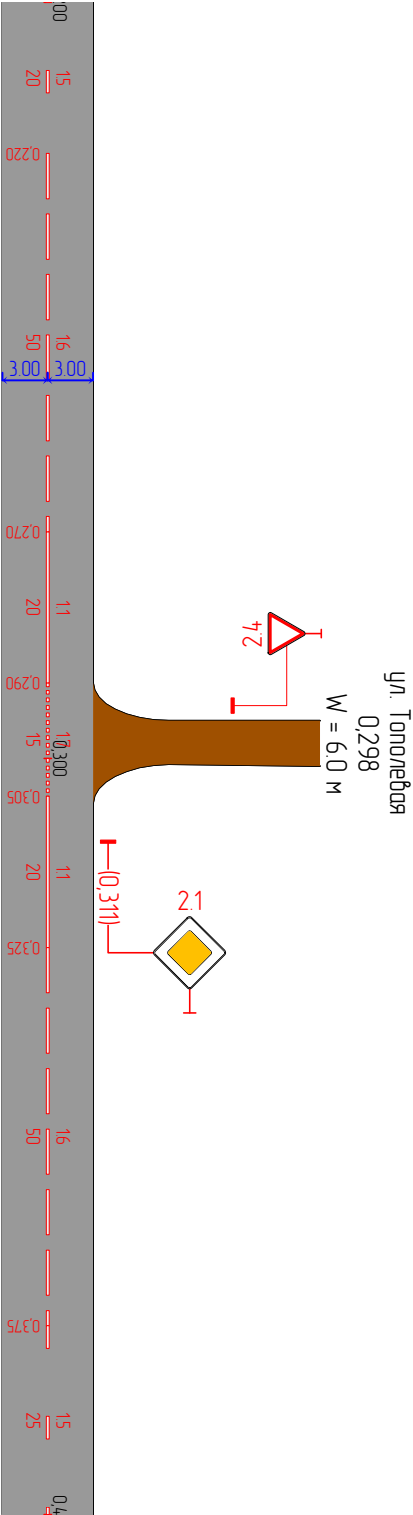

Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	Проезжая часть	3.00 (в/д) 0.200 - 0.400
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На разделительной полосе	
	Дорожная разметка следа	

Дорожная разметка следа	15	16	11	17	11	16	15
	0,200 - 0,220	0,220 - 0,270	0,270 - 0,290	0,290 - 0,305	0,305 - 0,325	0,325 - 0,375	0,375 - 0,400
Ширина следа, м	Проезжая часть 3,00 (в/д) 0,200 - 0,400						
	Звездные карманы						
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На раздельной						
	На обочине						


Ширина следа, м	Звездные корданы	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 (а/б) 0,400 - 0,567
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На разделительной полосе	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Северная

Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 0,400 – км 0,570

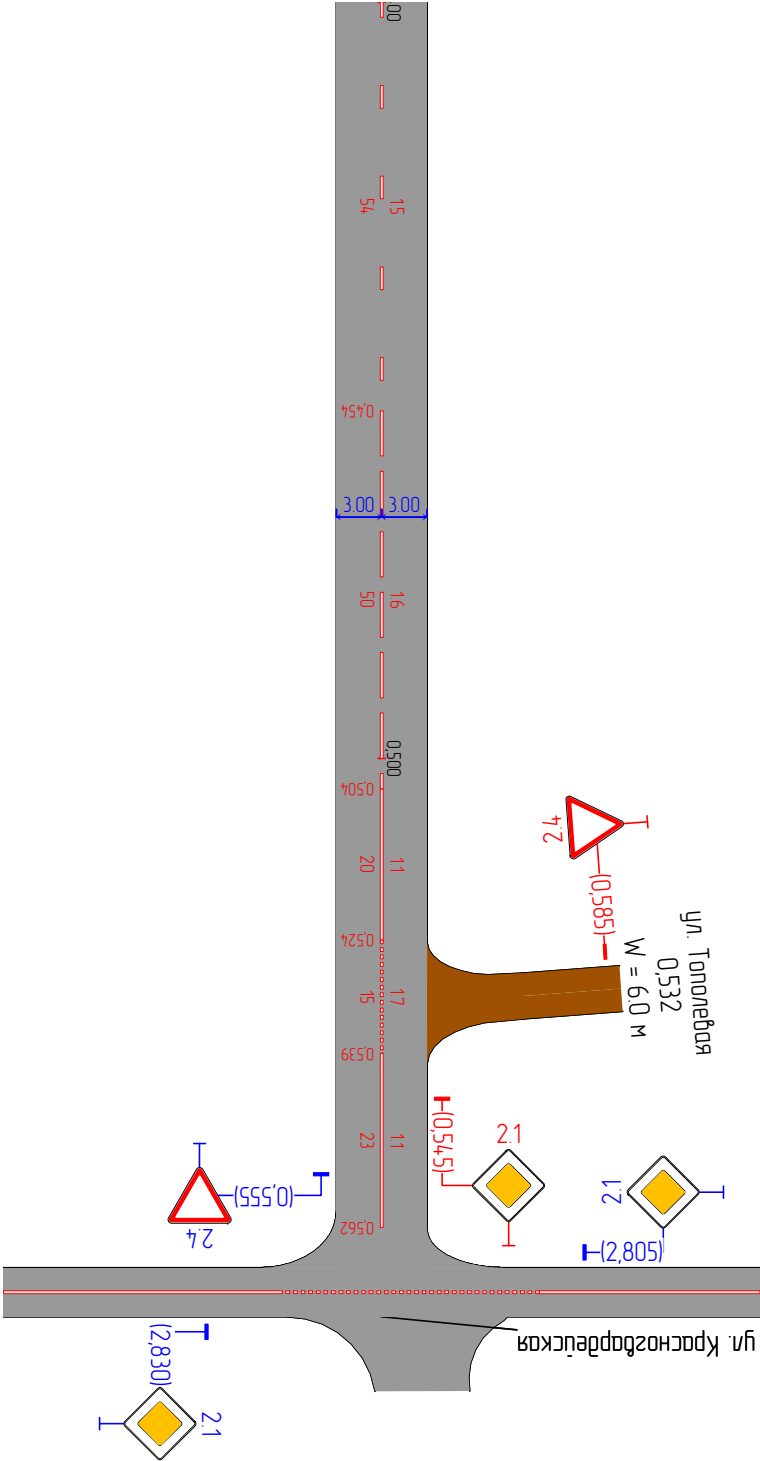

Дорожная разметка следа	15 0,400 - 0,454	16 0,454 - 0,504	11 0,504 - 0,524	17 0,524 - 0,539	11 0,539 - 0,562	3,00 (а/б) 0,400 - 0,570
Ширина следа, м	Проезжая часть	Звездные корданы				
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На разделительной полосе	На обочине				

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Строителей
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200




Ширина следа, м	Зазездные карманы	
	Проезжая часть	3.00 (в/д) 0.000 - 0.200
Дорожные ограждения и надобновляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельной устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3.00 (в/д) 0.000 - 0.200
	Зазездные карманы	
Дорожные ограждения и надобновляющие устройства следа	На раздельной устройстве следа	
	На обочине	


Звездные карманы		
Проезжая часть	300 (в/д) 0,350 - 0,437	300 (горизонт) 0,437 - 0,550
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Строителей
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,350 – км 0,550

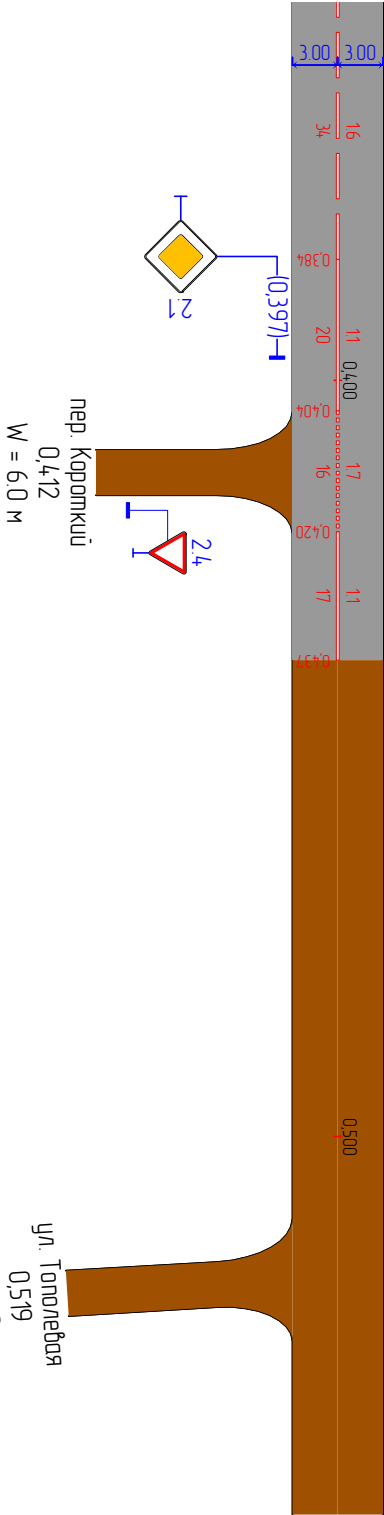

Дорожная разметка	16 0,350 - 0,384		11 0,384 - 0,404	17 0,404 - 0,420	11 0,420 - 0,437	
Ширина проезжей части, м	3,00 (в/д) 0,350 - 0,437		3,00 (в/д) 0,437 - 0,550			
Дорожные ограждения и направляющие устройства	Звездные карты					
На обочине						
На разделительной устройстве						

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Строителей
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,550 – км 0,625

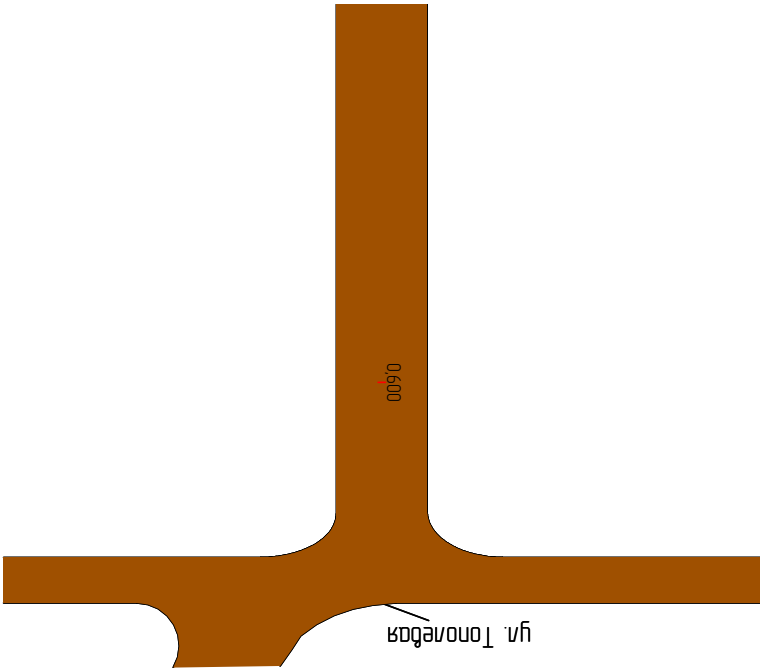


Дорожная разметка strada		
Ширина strada, м	Проезжая часть	3 00 (грунт) 0,550 – 0,625
	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На разделительной	
	На обочине	

Ширина strada, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	Проезжая часть	3 00 (грунт) 0,550 – 0,625
	На обочине	
Дорожная разметка strada		
Элементы в плане		

Звездные карты	
Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,150 - 0,350
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
На обочине	
На разделительной устройства	
Дорожная разметка	
Элементы в плане	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Ленина (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,150 – км 0,350

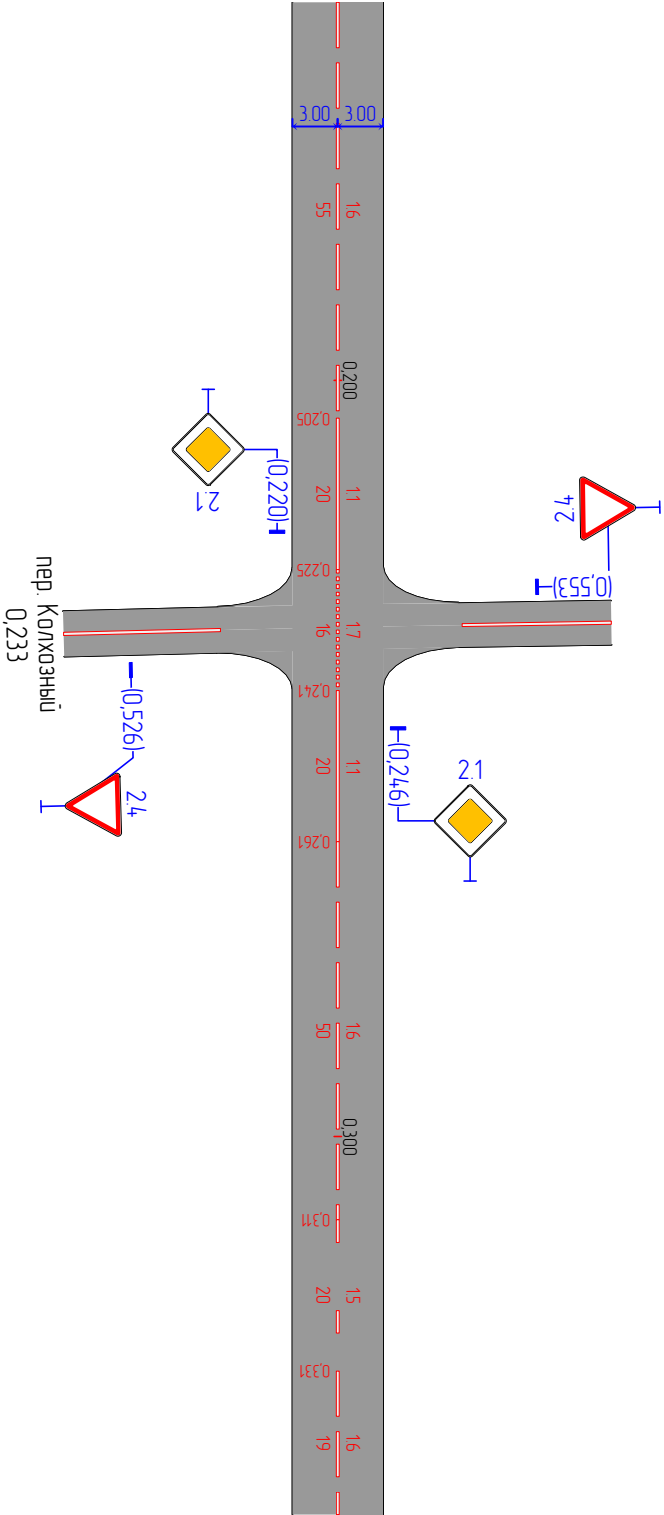

Дорожная разметка	16 0,150 - 0,205	11 0,205 - 0,225	17 0,225 - 0,241	11 0,241 - 0,261	16 0,261 - 0,311	15 0,311 - 0,331	16 0,331 - 0,350
Ширина проезжей части, м				3,00 (в/д) 0,150 - 0,350			
Дорожные ограждения и направляющие устройства							
На обочине							

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Ленина (участок № 2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,250 – км 0,450

Ширина следа, м	Звездные короны	
Проезжая часть	На обочине	3,00 (в/д) 0,250 - 0,450
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На раздельном устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

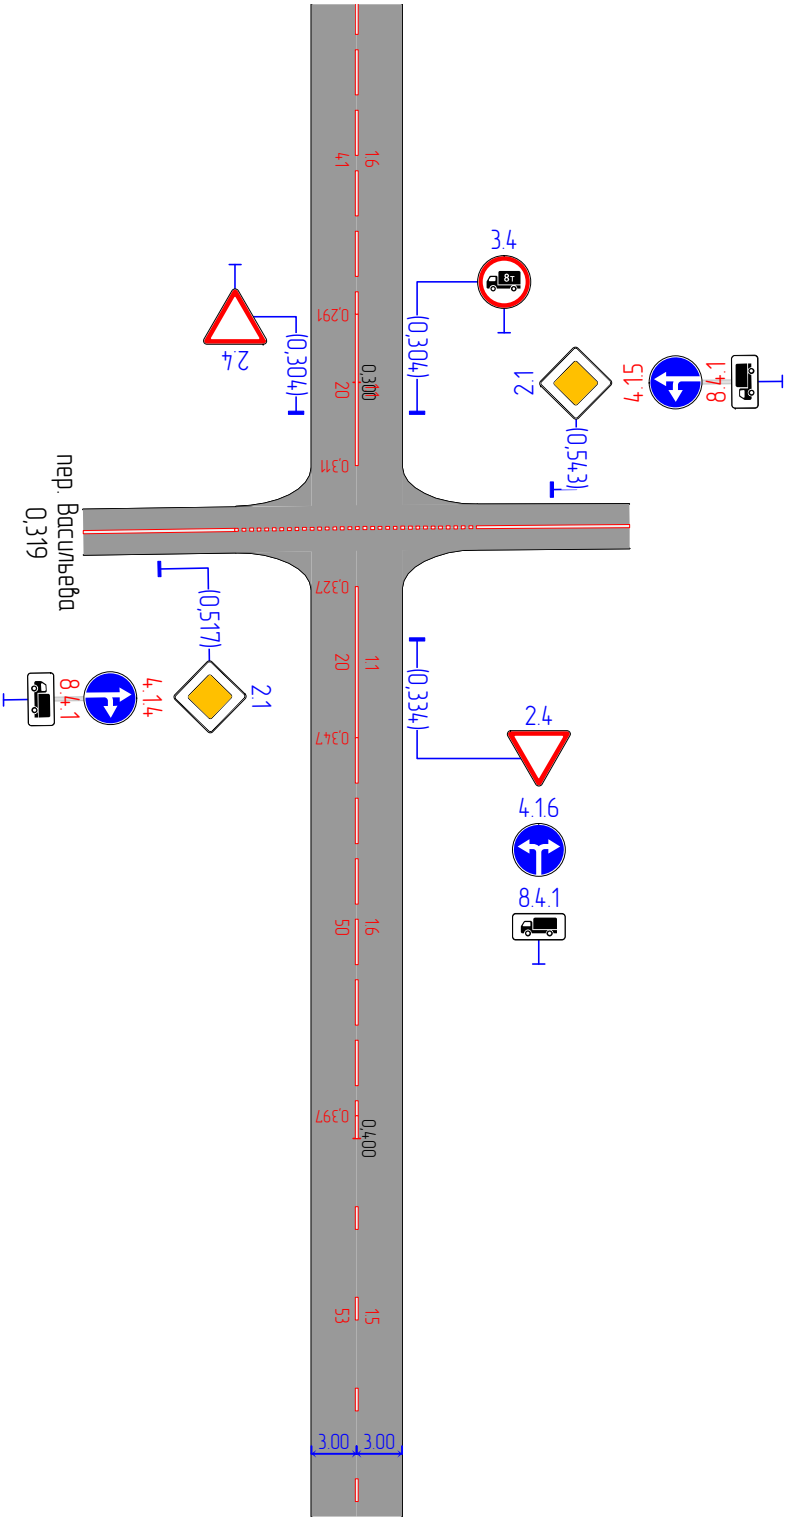

Дорожная разметка следа	16 0,250 - 0,291	11 0,291 - 0,311	11 0,327 - 0,347	16 0,347 - 0,397	15 0,397 - 0,450
Ширина следа, м	Проезжая часть	Звездные короны		3,00 (в/д) 0,250 - 0,450	
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На раздельном устройстве следа	На обочине			


Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 (в/д)
Дорожная разметка следа	На обочине	0,650 - 0,850
Элементы в плане	На разделительной полосе	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Ленина (участок № 2)

Выполнено по состоянию на май 2025 г.


км 0,650 – км 0,850

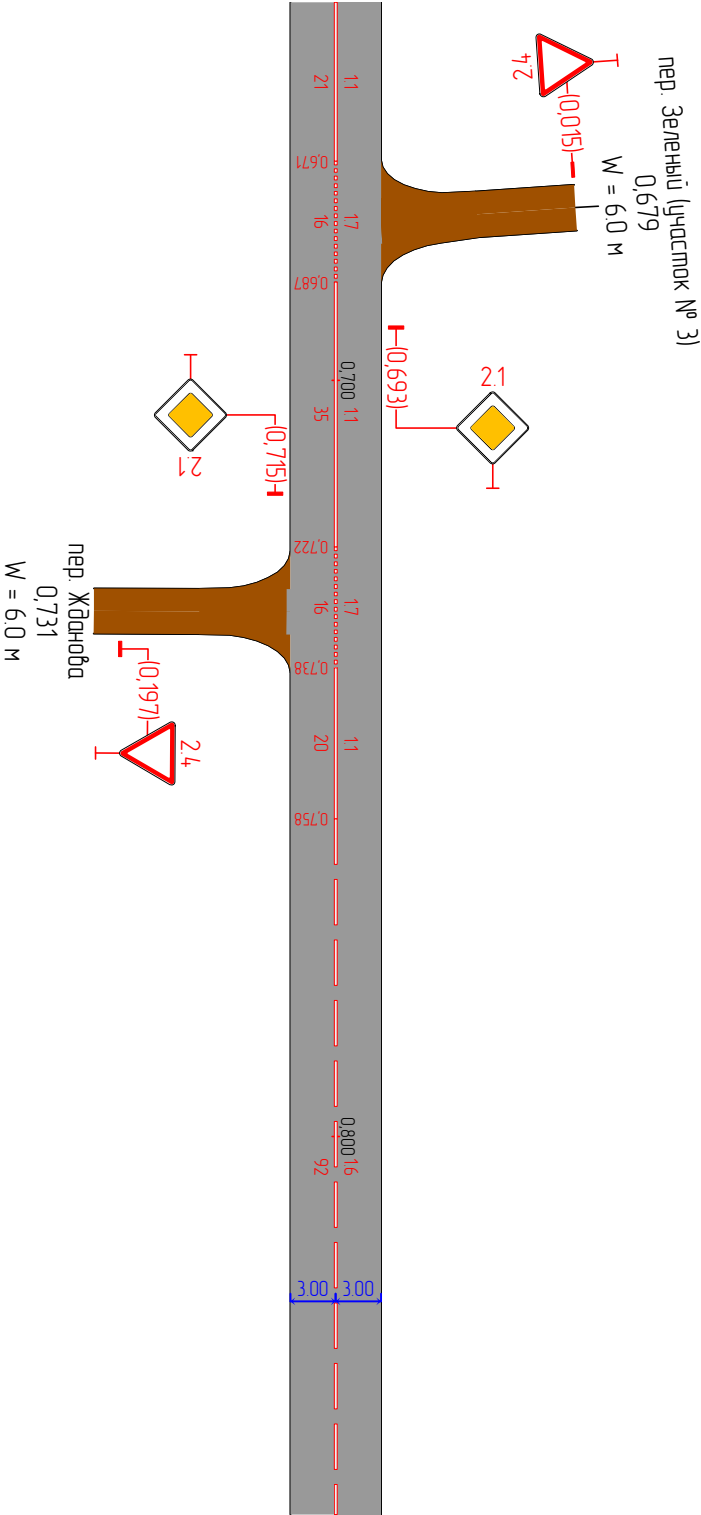

Дорожная разметка следа	11 0,650 - 0,671	17 0,671 - 0,687	11 0,687 - 0,722	17 0,722 - 0,738	11 0,738 - 0,758	16 0,758 - 0,850
Ширина следа, м	3,00 (в/д) 0,650 - 0,850					
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Звездные карманы					
Дорожная разметка следа	На разделительной полосе	На обочине				


Ширина следа, м	Звездные карты	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	Проезжая часть На обочине	300 (а/б) 0,850 - 0,960
Дорожная разметка следа	На разделительной устройстве следа	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Ленина (участок № 2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,850 – км 0,960

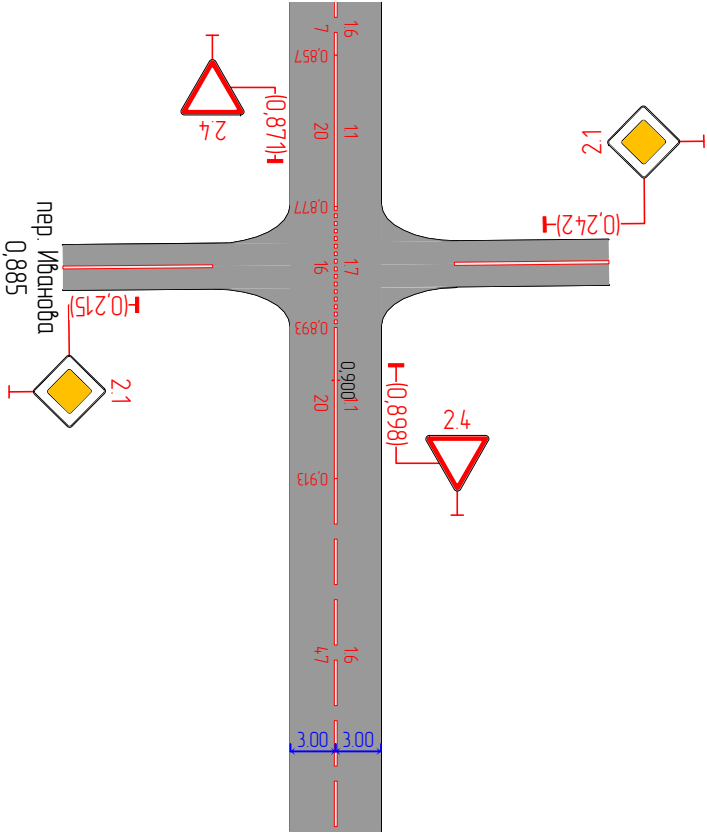

Дорожная разметка следа	16 0,850 0,857	11 0,857 - 0,877	17 0,877 - 0,893	11 0,893 - 0,913	16 0,913 - 0,960
Ширина следа, м	Проезжая часть	Звездные карты		300 (а/б) 0,850 - 0,960	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На разделительной устройстве следа	На обочине			

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Крестьянская (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,150

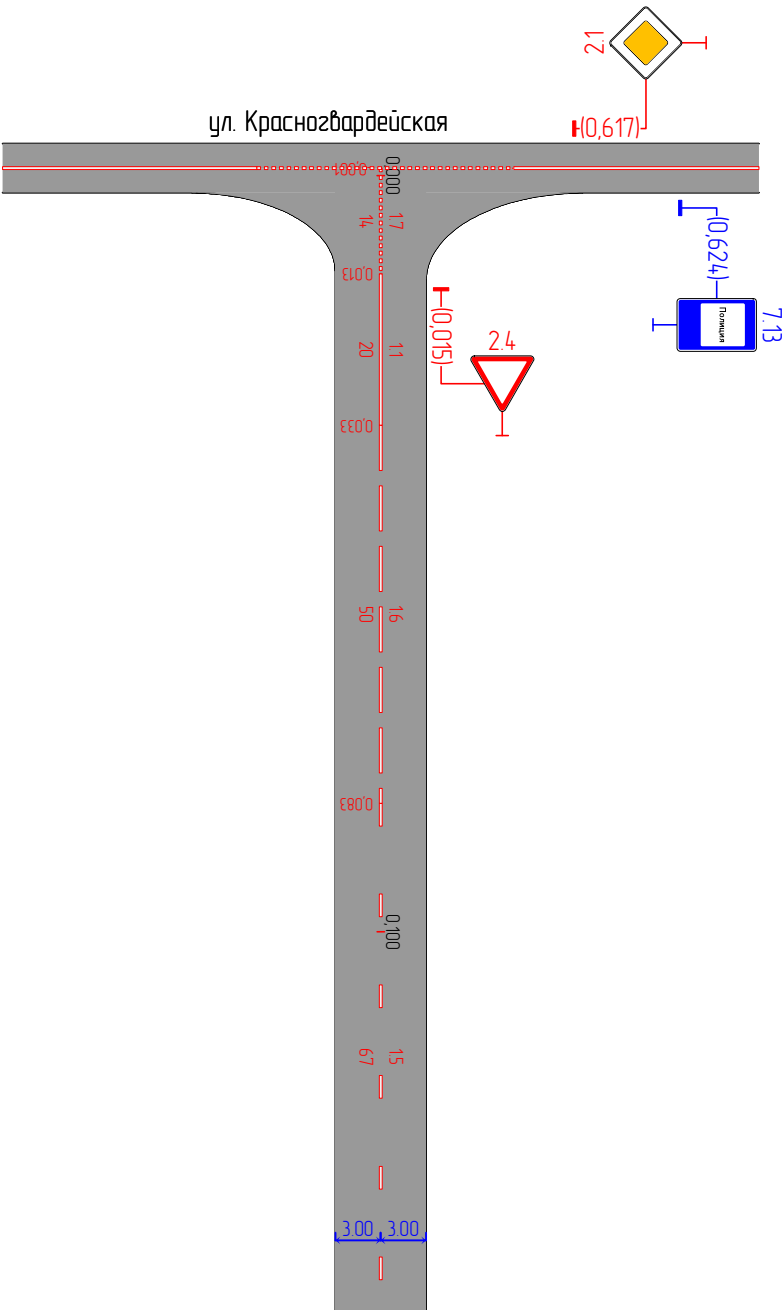


Дорожная разметка спвода		17	11	16	15
		-0.001 - 0.013	0.013 - 0.033	0.033 - 0.083	0.083 - 0.150
Ширина спвода, м	Проезжая часть				
	Засезные карманы	3.00 м/дл 0.000 - 0.150			
Дорожные ограждения и направляющие устройства спвода	На разделительной				
	На обочине				

Ширина следа, м	Засезные карманы	3.00 м/дл 0.000 - 0.150			
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	Проезжая часть				
	На обочине				
Дорожная разметка следа					
Элементы в плане					

Ширина следа, м	Засездные карманы	
	Проезжая часть	3,00 (а/б) 0,150 - 0,350
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Крестьянская (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,150 – км 0,350

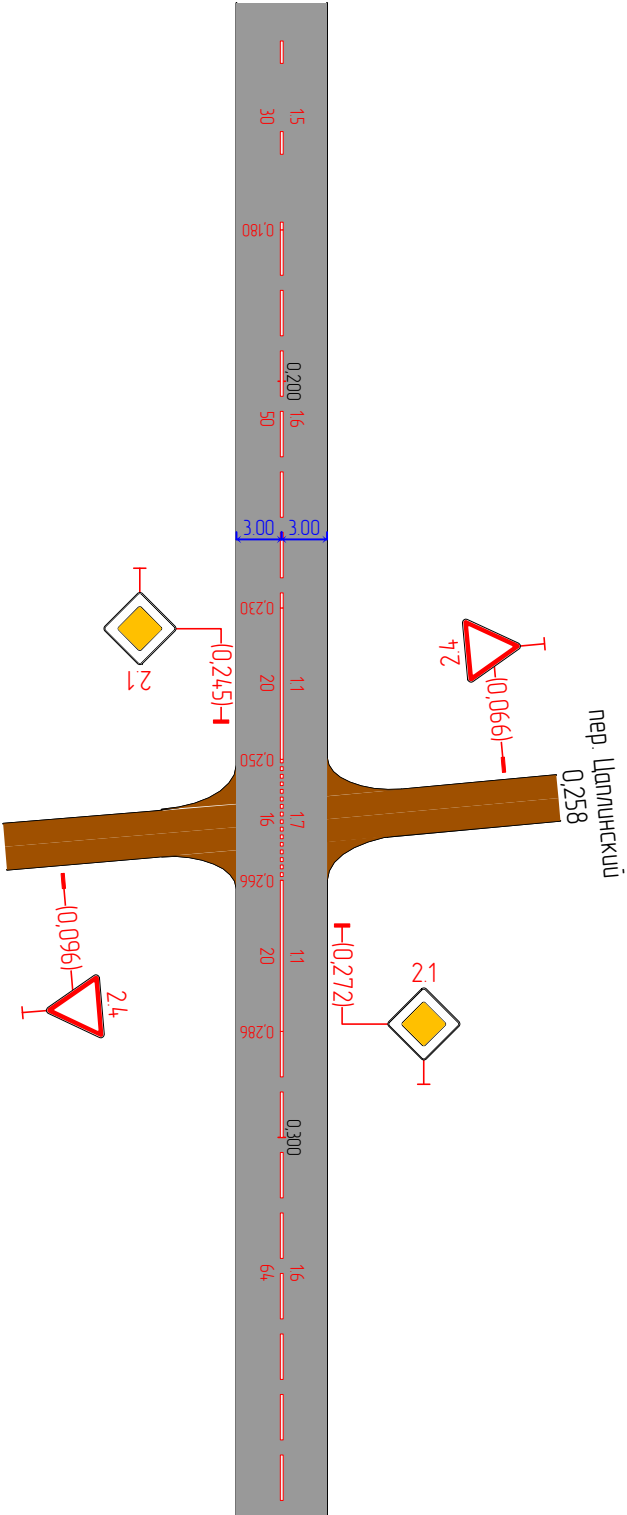

Дорожная разметка следа	15 0,150 - 0,180	16 0,180 - 0,230	11 0,230 - 0,250	17 0,250 - 0,266	11 0,266 - 0,286	16 0,286 - 0,350
Ширина следа, м	Проезжая часть	Засездные карманы	3,00 (а/б) 0,150 - 0,350			
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На раздельительной	На обочине				


Ширина следа, м	Заседные карманы	3,00 (в/д) 0,350 - 0,500
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

ул. Крестьянская (участок № 1)

Выполнено по состоянию на май 2025 г.


км 0,350 – км 0,500

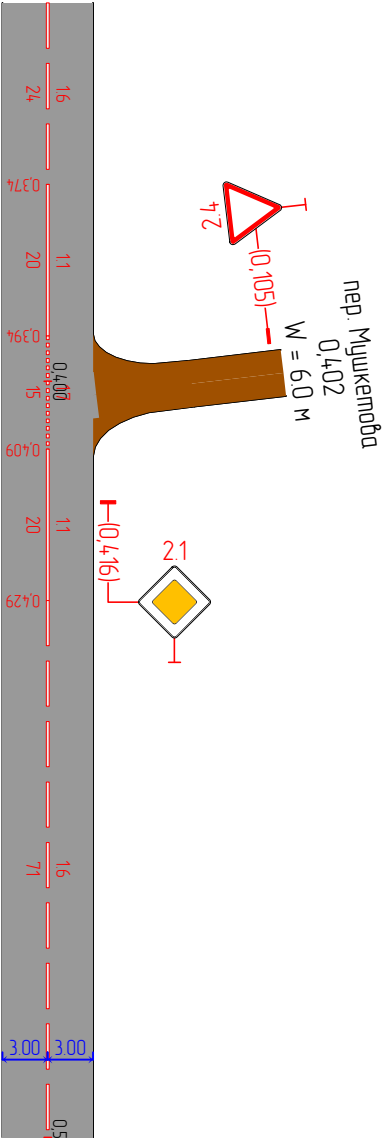

Дорожная разметка спвода	¹⁶ 0,350 - 0,374	¹¹ 0,374 - 0,394	¹⁷ 0,394 - 0,409	¹¹ 0,409 - 0,429	¹⁶ 0,429 - 0,500
Ширина спвода, м	Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,350 - 0,500			
	Заседные карманы				
Дорожные ограждения и направляющие устройства спвода	На раздельительной				
	На обочине				


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Крестьянская (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,710 – км 0,900

Ширина следа, м	Заседные карманы	
Проезжая часть	На обочине	3,00 (а/б) 0,710 - 0,900
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

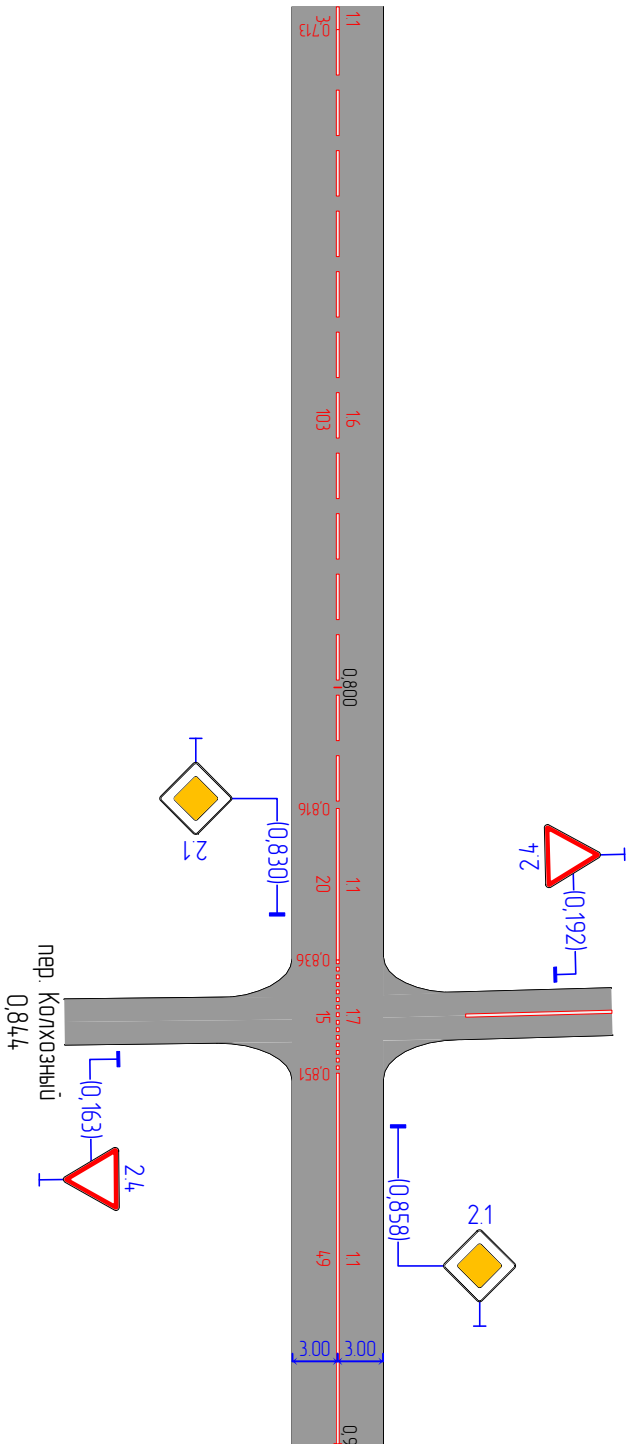

Дорожная разметка следа	11	16	11	17	11
Ширина следа, м	3,00 (а/б) 0,710 - 0,900	3,00 (а/б) 0,710 - 0,900	0,816 - 0,836	0,836 - 0,857	0,857 - 0,900
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	На разделительной	Заседные карманы	Проезжая часть	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Крестьянская (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,100 – км 1,250

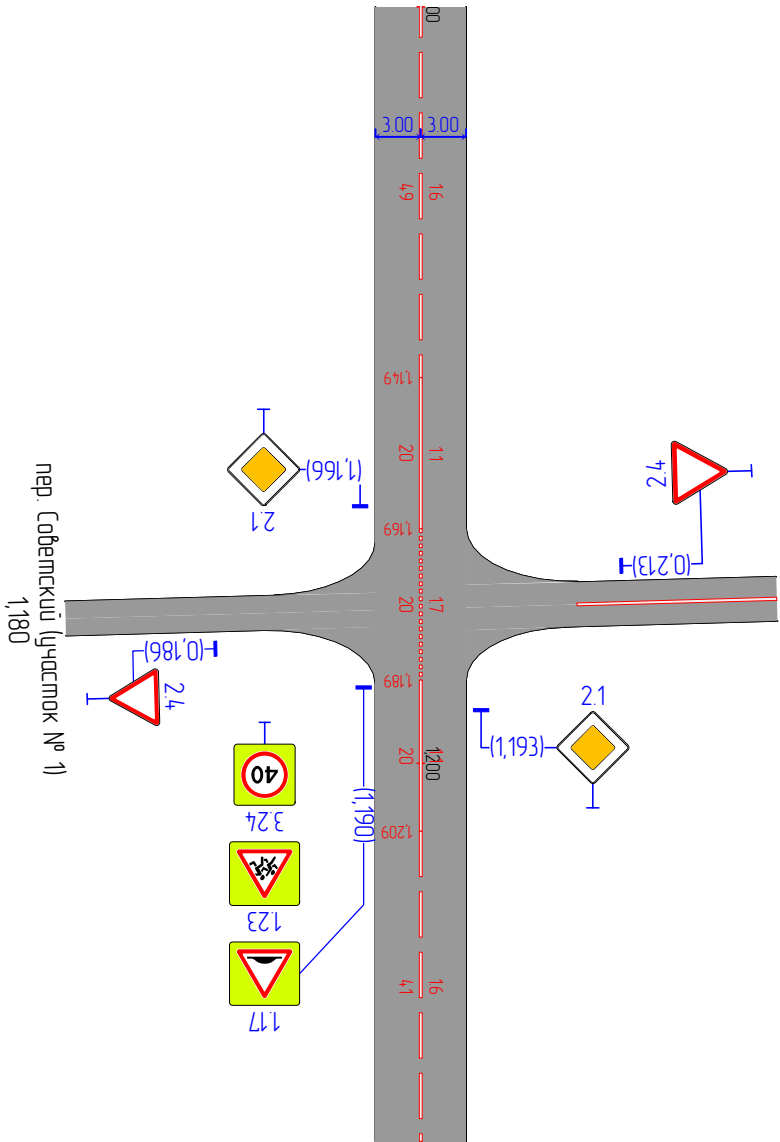


Дорожная разметка съезда		16	11	17	11	16
		1,100 - 1,149	1,149 - 1,169	1,169 - 1,189	1,189 - 1,209	1,209 - 1,250
Ширина съезда, м	Проезжая часть	3,00 (а/б)				
	Засезонные корданы					
Дорожные ограждения и направляющие устройства съезда	На раздельной					
	На обочине					

Ширина съезда, м	Засезонные корданы	
Проезжая часть		3,00 (а/б) 1,100 - 1,250
Дорожные ограждения и направляющие устройства съезда	На обочине	
Дорожная разметка съезда	На раздельной	
Элементы в плане		

Ширина следа, м	Заседные карманы	
	Проезжая часть	3,00 (0,78) 1,450 - 1,650
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Крестьянская (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,450 – км 1,650

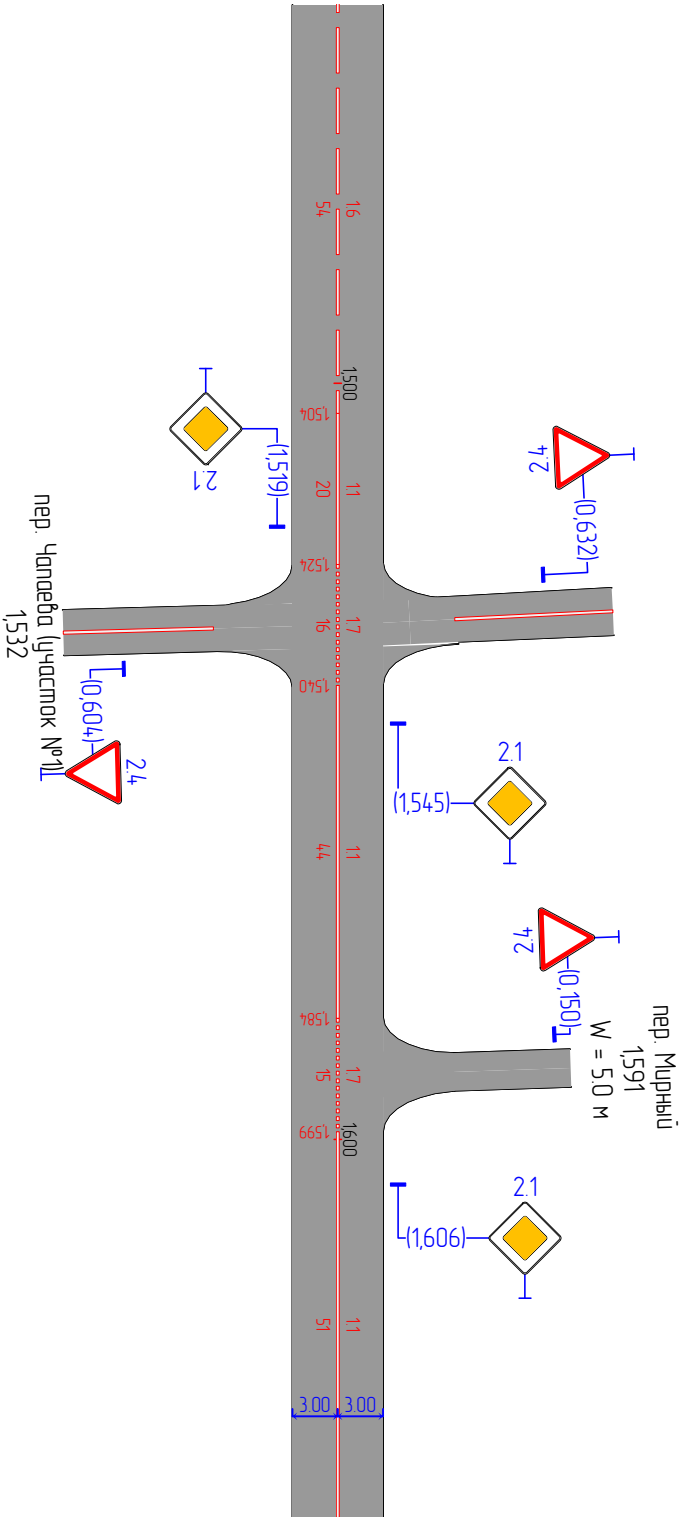

Дорожная разметка следа	16 1,450 - 1,504	11 1,504 - 1,524	17 1,524 - 1,540	11 1,540 - 1,584	17 1,584 - 1,599	11 1,599 - 1,650
Ширина следа, м	Проезжая часть	Заседные карманы		3,00 (0,78) 1,450 - 1,650		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На раздельительной	На обочине				


Ширина следа, м	Заязные карманы	
Проезжая часть		3,00 (0,75) 1,650 - 1,850
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
Дорожная разметка следа	На раздельной части	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Крестьянская (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,650 – км 1,850

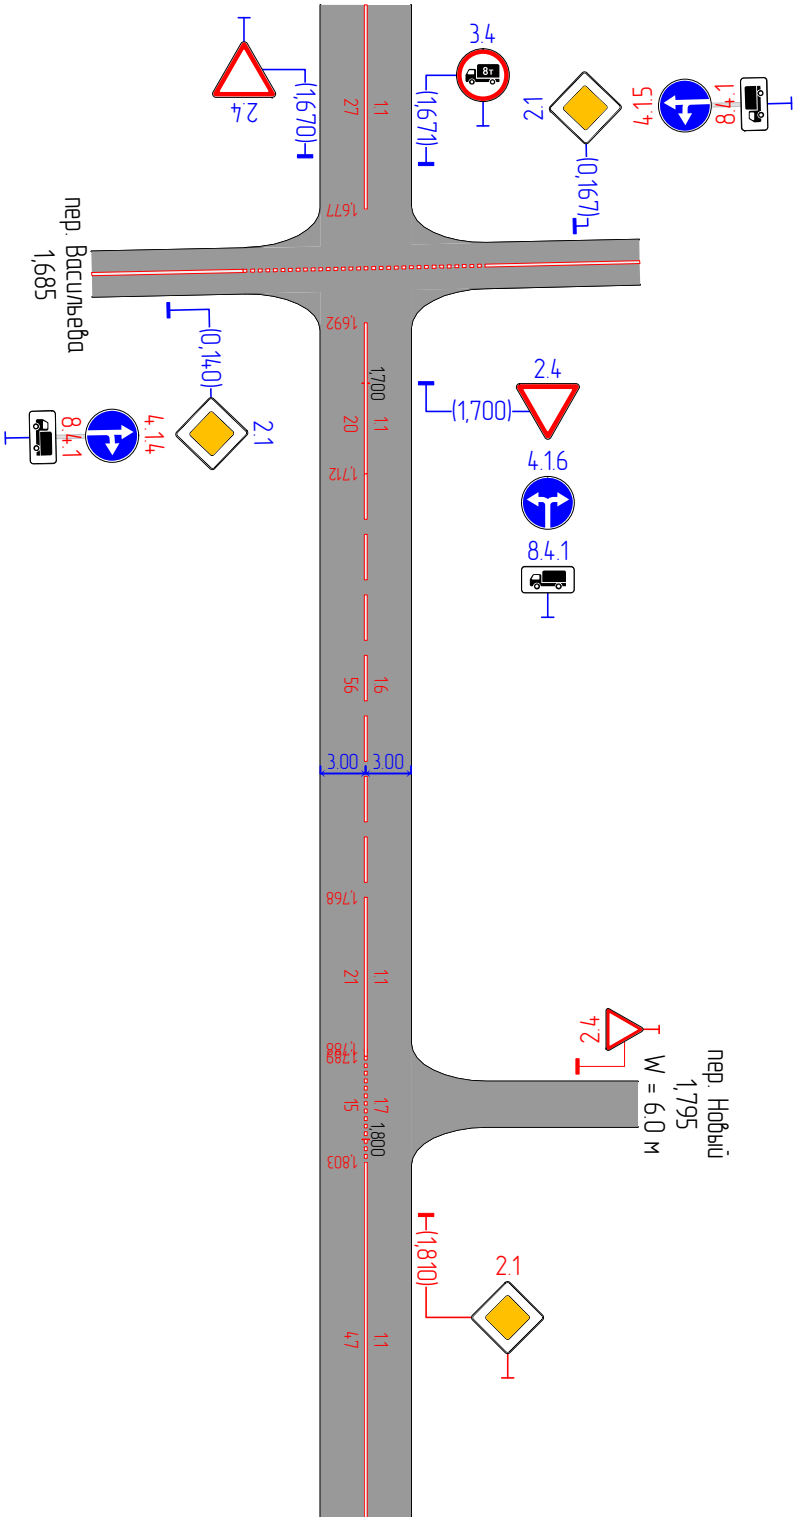

Дорожная разметка следа	11 1,650 - 1,677	11 1,692 - 1,712	16 1,712 - 1,768	11 1,768 - 1,789	17 1,788 - 1,803	11 1,803 - 1,850
Ширина следа, м	Проезжая часть	Заязные карманы	3,00 (0,75) 1,650 - 1,850			
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На раздельной части	На обочине				


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Крестьянская (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,850 – км 1,876

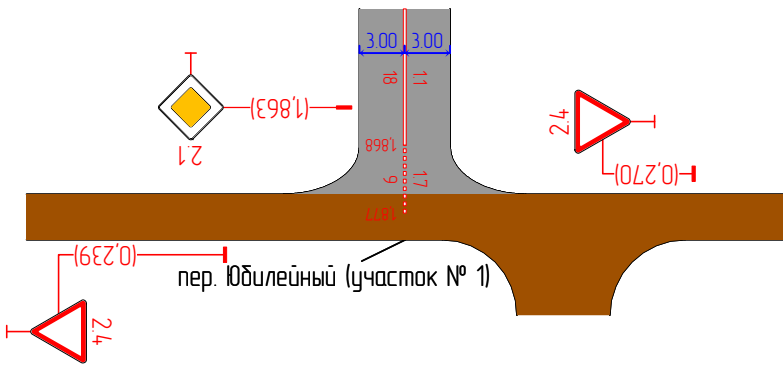

Дорожная разметка strada		11	17
		1850 - 1868	1868 1877
Ширина strada, м	Проезжая часть	3.00 (a/b)	
	Засезные карманы	1850 - 1876	
Дорожные ограждения и направляющие устройства strada		На раздѣлительной	На обочине

Ширина следа, м	Засезные карманы	
	Проезжая часть	3.00 (a/b) 1850 - 1876
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На раздѣлительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Крестьянская (участок № 2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,119

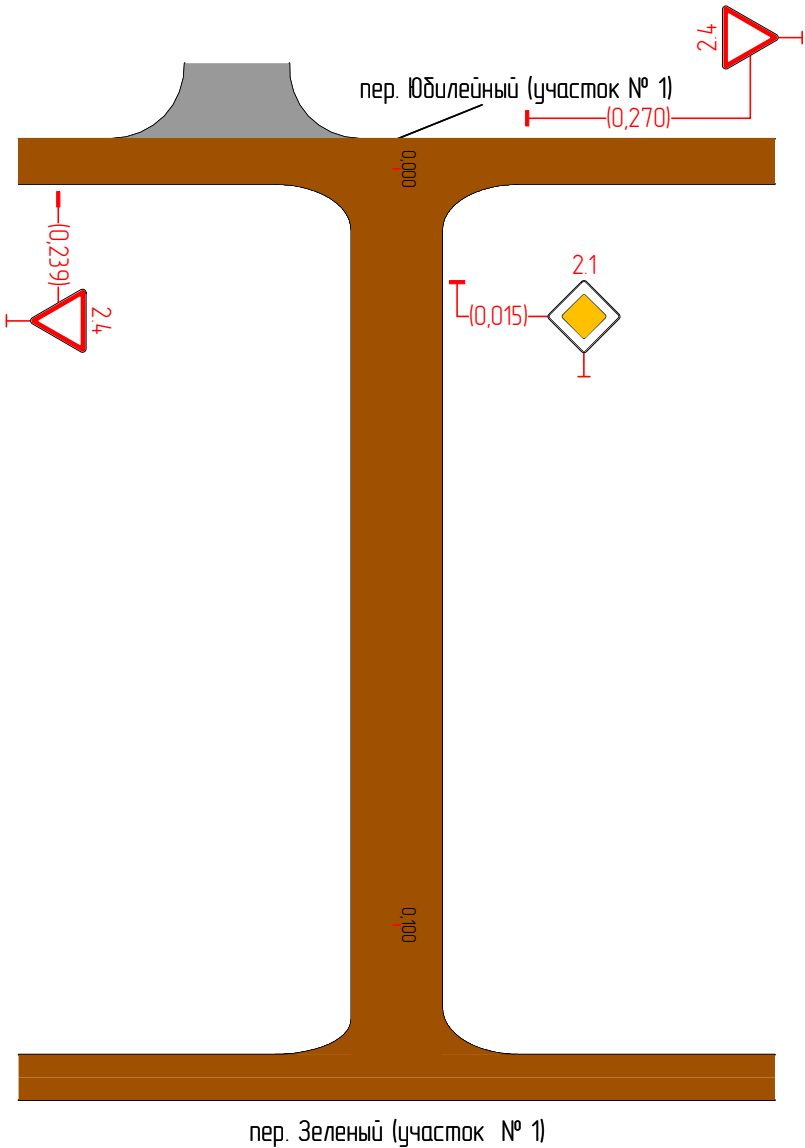


Дорожная разметка strada		
Ширина strada, м	Проезжая часть	
	Засездные карманы	3.00 (карман) 0.000 - 0.119
Дорожные ограждения и направляющие устройства strada	На раздѣлительной	
	На обочине	

Ширина следа, м	Засездные карманы	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	Проезжая часть	3.00 (карман) 0.000 - 0.119
	На обочине	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Ширина следа, м	Элезыные карманы	
	Проезжая часть	1,50 (вдоль) 0,000 - 0,039
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине	1,50 (вдоль) 0,039 - 0,100
	На разделительной полосе	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,100

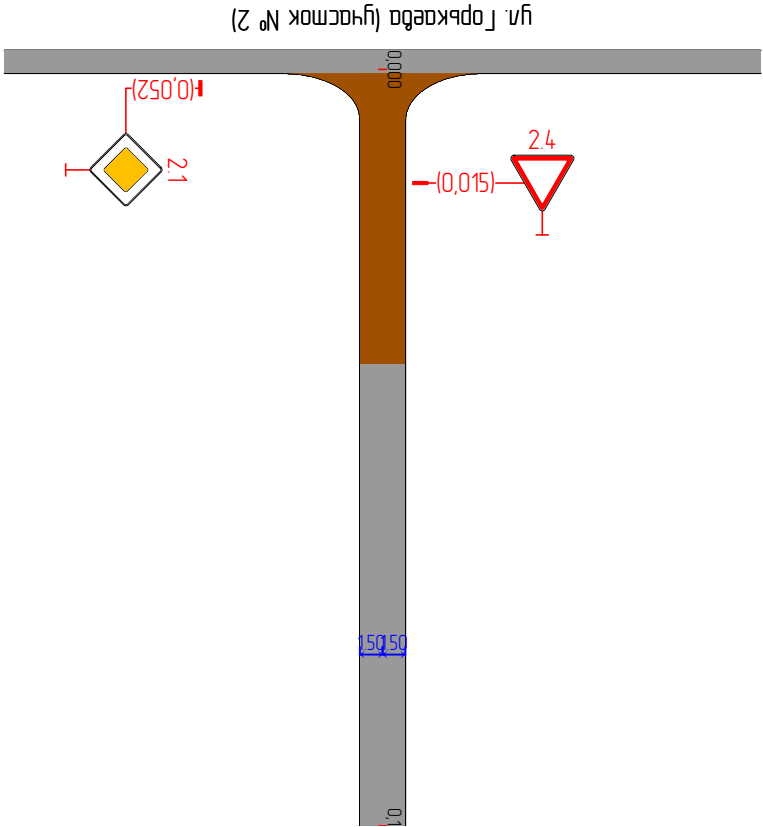

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	Проезжая часть
	1,50 (вдоль) 0,000 - 0,039
Дорожные ограждения и дорожные устройства	Элезыные карманы
	1,50 (вдоль) 0,039 - 0,100
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине

Ширина следа, м	Звездные карманы	
Проезжая часть	150 (а/В)	210 (а/В)
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине	На разделительной полосе
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,100 – км 0,210

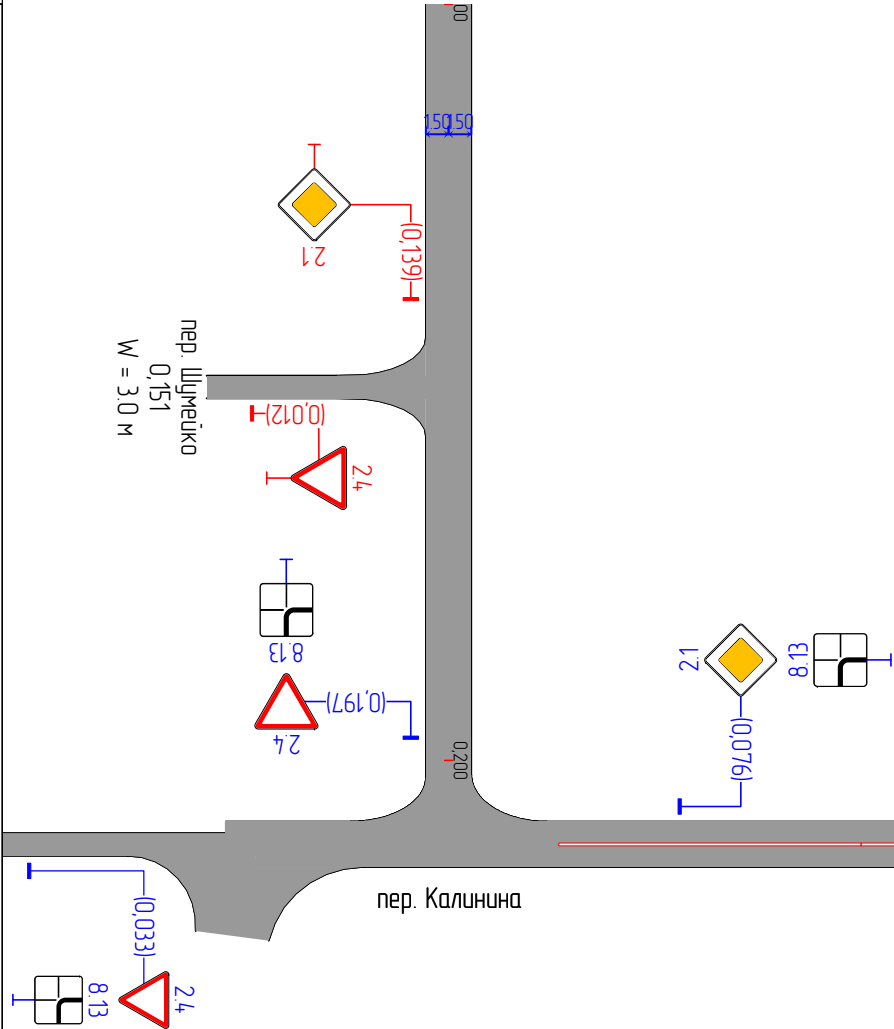

Дорожная разметка следа			
Ширина следа, м	Проезжая часть	150 (а/В) 0,100 - 0,208	
	Звездные карманы		
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На раздельной		
	На обочине		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,155


Ширина следа, м	Звездные корданы
Проезжая часть	3,00 (в/б) 0,000 - 0,155
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине
Дорожная разметка следа	На разделительной
Элементы в плане	

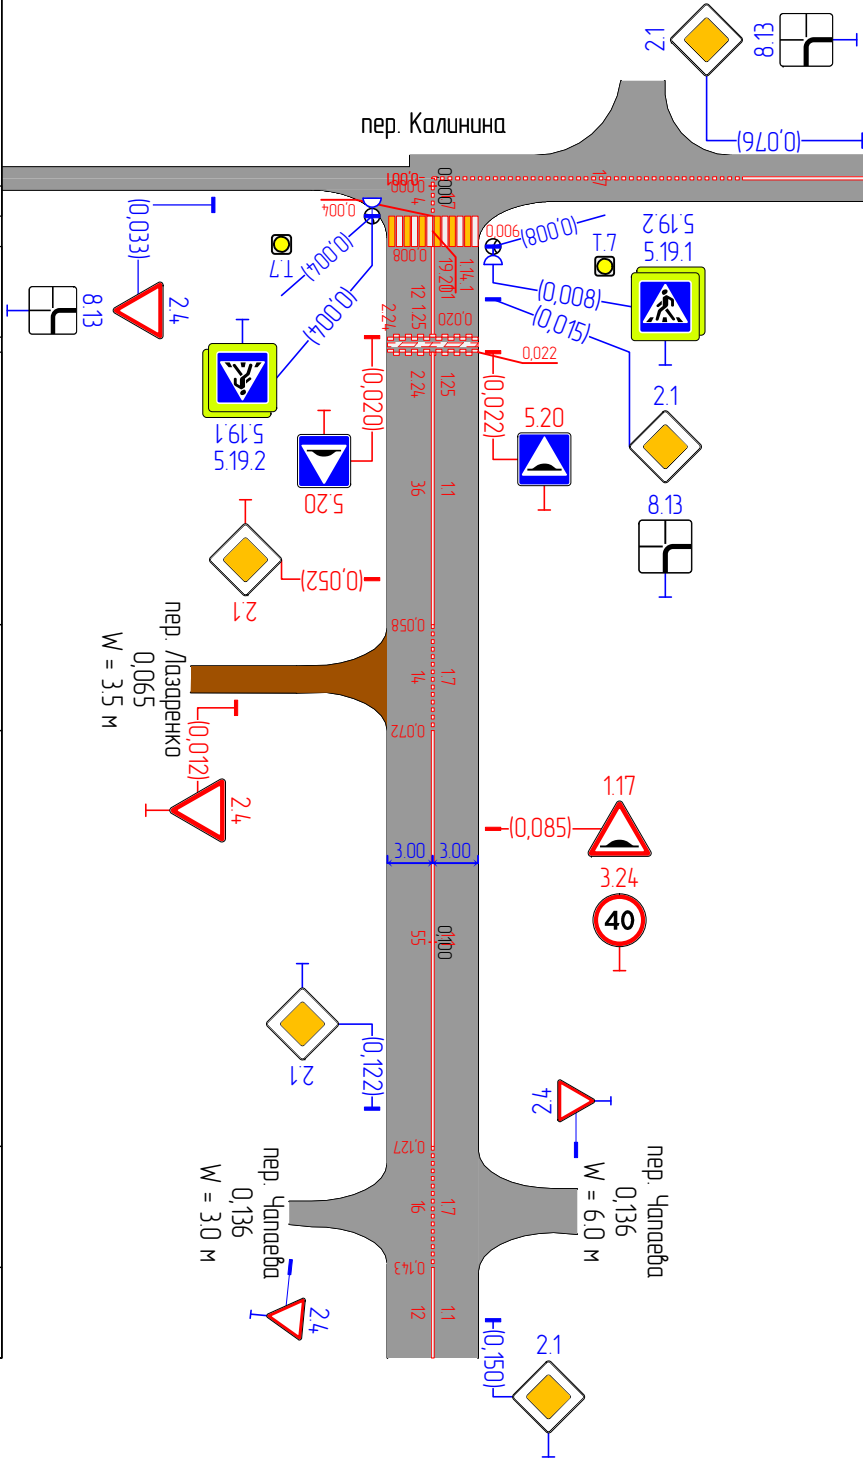

Дорожная разметка следа		17 0,000 0,004	11 0,008 - 0,020	11 0,022 - 0,058	17 0,058 - 0,072	11 0,072 - 0,127	17 0,127 - 0,143	11 0,143 - 0,155
Ширина следа, м	Проезжая часть							
	Звездные корданы	3,00 б/д/л 0,000 - 0,155						
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На раздельной							
	На обочине							

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,155 – км 0,350


Дорожная разметка strada		11	16
		0,155 - 0,163	0,163 - 0,182
Ширина strada, м	Проезжая часть	3,00 (0,16)	
	Звездные карманы	0,155 - 0,182	
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На раздельной		
	На обочине		

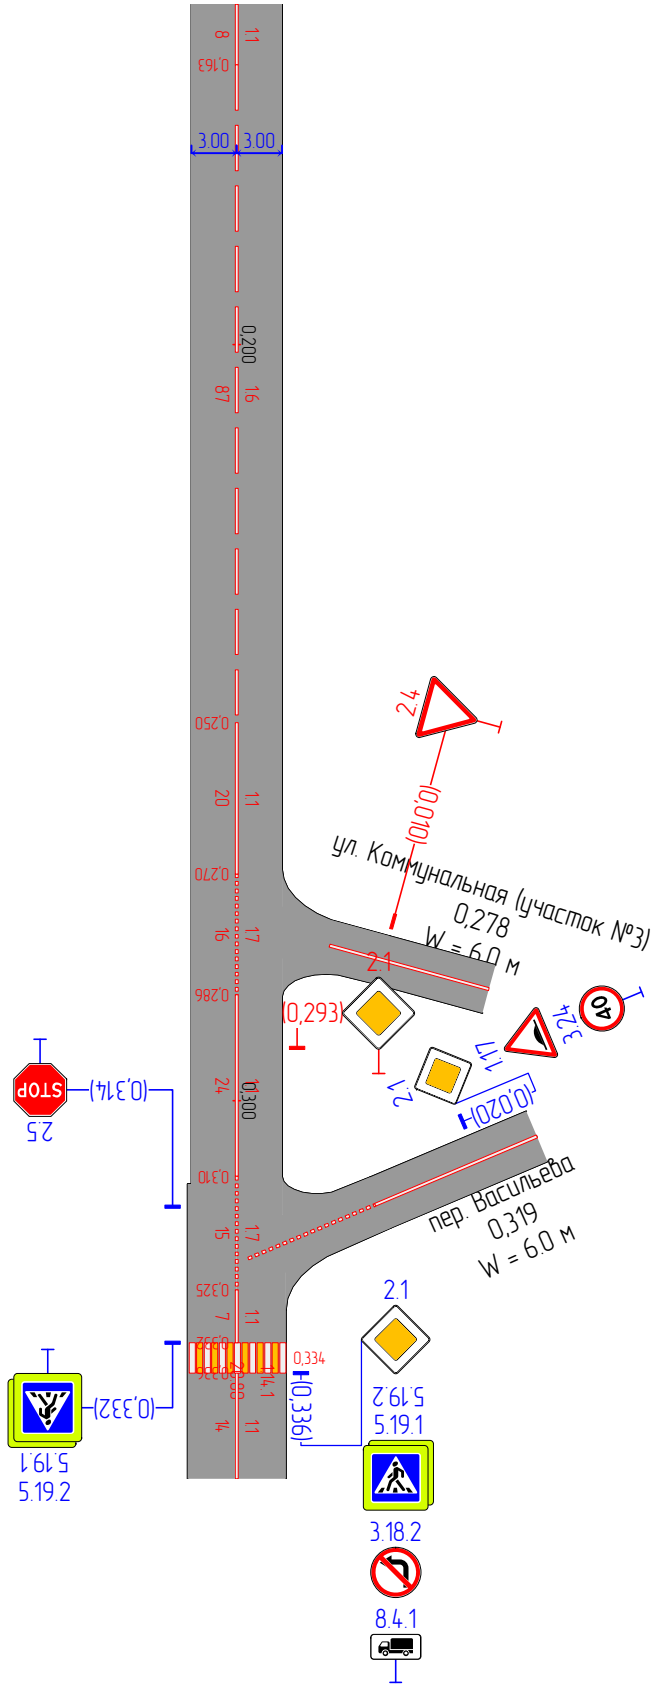

Ширина следа, м	Звездные карманы		
	Проезжая часть	3,00 (a, b) 0,155 - 0,182	
Дорожные ограждения и копирующие устройства следа	На обочине		
	На раздельной		
Дорожная разметка следа			
Элементы в плане			

Ширина следа, м	Звездные карманы	
Проезжая часть	На обочине	3,25 (а/б) 0,402 - 0,550
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На разделительной полосе	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,350 – км 0,550

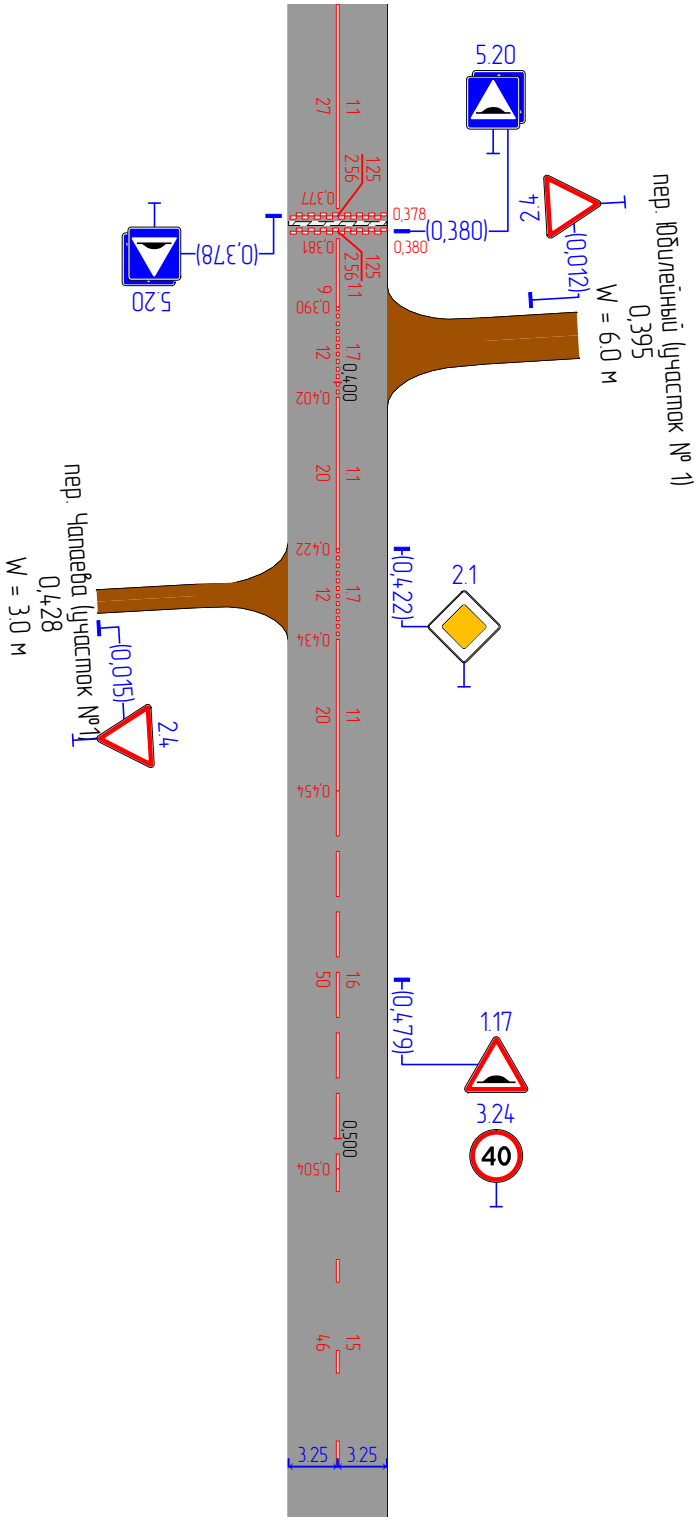

Дорожная разметка следа		11	17	11	16	15
Ширина следа, м	Проезжая часть	0,402 - 0,422	0,422 - 0,434	0,434 - 0,454	0,454 - 0,504	0,504 - 0,550
Звездные карманы	На разделительной полосе					
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине					


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,550 – км 0,770

Ширина следа, м	Звездные короны	3,25 (а/б) 0,550 - 0,770
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и надporожные устройства следа	На обочине	
	На раздельной устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

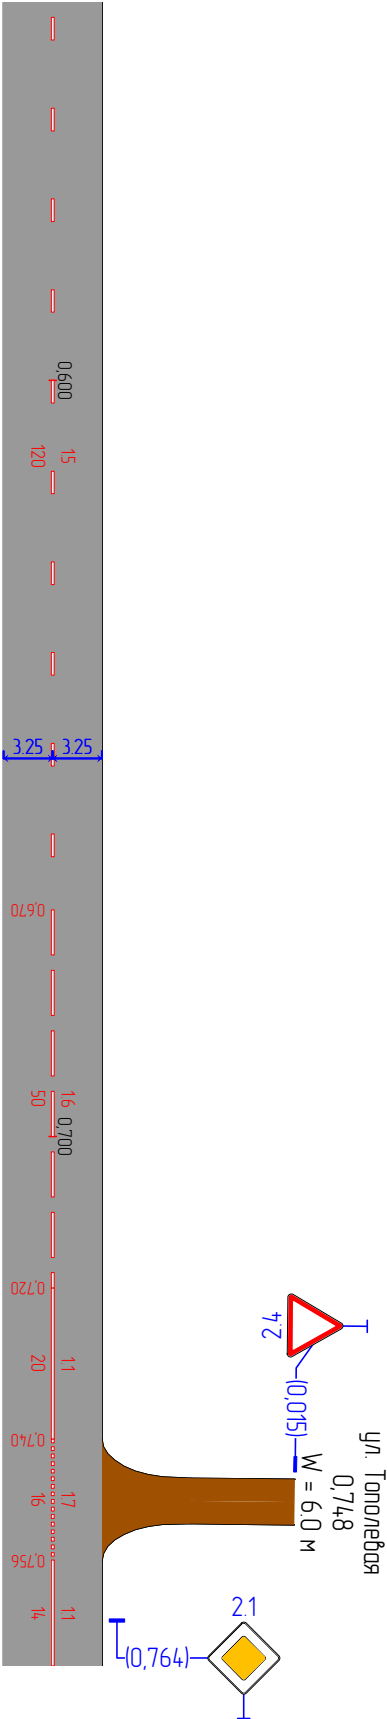

Дорожная разметка следа		15 0,550 - 0,670	16 0,670 - 0,720	11 0,720 - 0,740	17 0,740 - 0,756	11 0,756 - 0,770
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,25 (а/б) 0,550 - 0,770				
	Звездные короны					
Дорожные ограждения и надporожные устройства следа	На раздельной устройстве следа					
	На обочине					

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,990 – км 1,200




Ширина следа, м	Звездные корданы	
	Проезжая часть	3.50 л/д/л 0.990 - 1.200
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На обочине	
	На разделительной устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Дорожная разметка следа		11 0.990 - 1.007	16 1.007 - 1.057	15 1.057 - 1.200
Ширина следа, м	Проезжая часть			3.50 л/д/л 0.990 - 1.200
	Звездные корданы			
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На разделительной устройстве следа			
	На обочине			

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,200 – км 1,400


Ширина следа, м	Звездные координаты
Проезжая часть	3,50 (в/д) 1,200 – 1,400
Дорожные ограждения и порождающие устройства следа	На обочине
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	

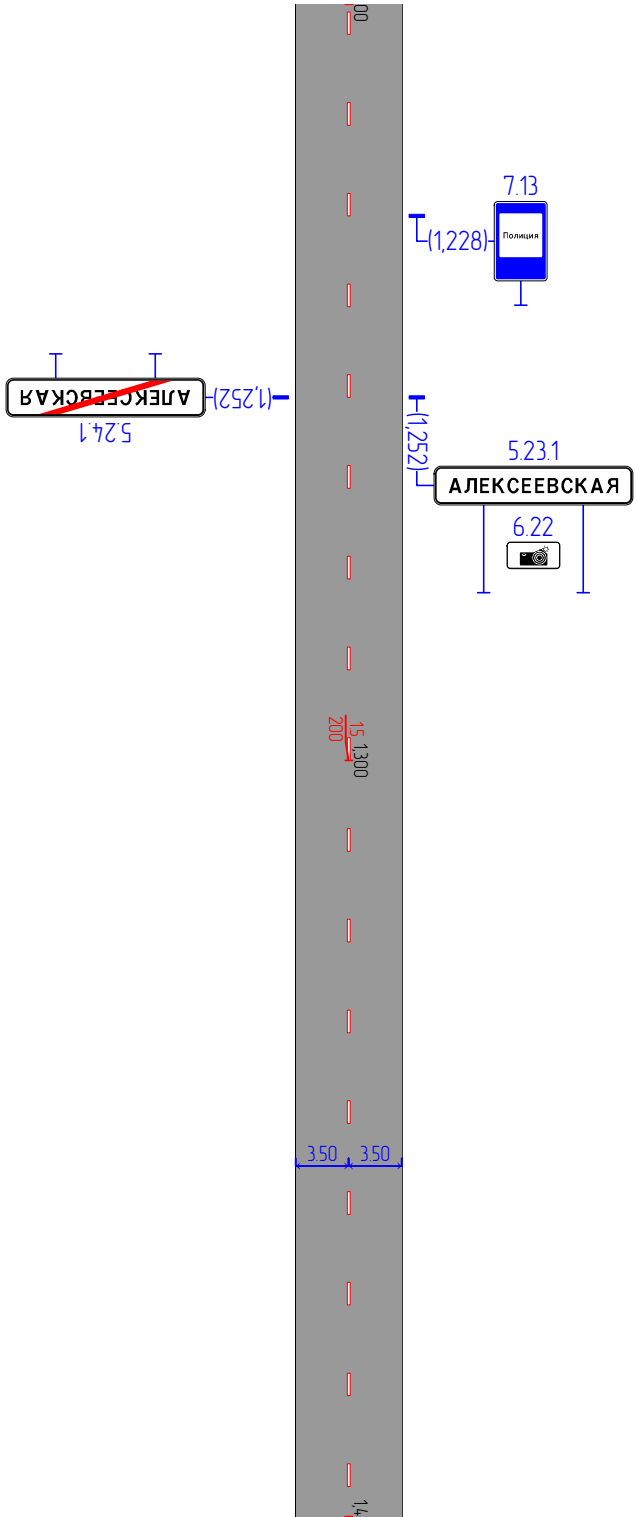

Дорожная разметка следа	15 1,200 – 1,400
Ширина следа, м	Проезжая часть Звездные координаты 3,50 (в/д) 1,200 – 1,400
Дорожные ограждения и порождающие устройства следа	На обочине

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,400 – км 1,606

Ширина следа, м	Звездные короны	3 50 (а/б) 1,400 - 1,606
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На обочине	
	На разделительной устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

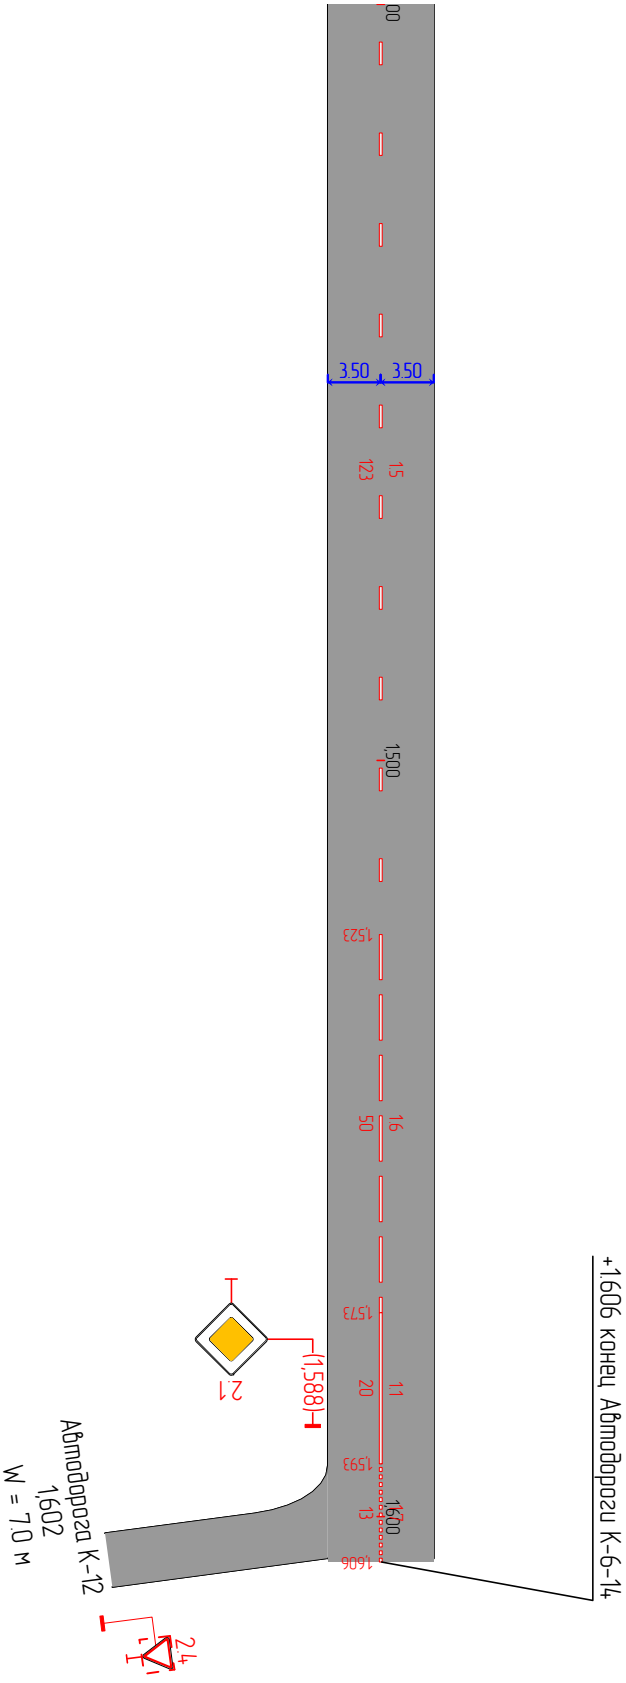


Дорожная разметка следа		15	16	11	17	
Ширина следа, м		1400 - 1523	1523 - 1573	1573 - 1593	1593 - 1606	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	Проезжая часть	Звездные короны	На обочине			
	На разделительной устройстве следа					


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Коммунальная (участок №2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,182 – км 0,402

Земельные участки	
Ширина следа, м	3,00 (а/б) 0,182 - 0,318
Проезжая часть	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На обочине
Дорожная разметка следа	На раздельном
Дорожная разметка следа	Элементы в плане

Дорожная разметка следа	16 0,182 - 0,250	11 0,250 - 0,270	17 0,270 - 0,286	11 0,286 - 0,310	17 0,310 - 0,325	11 0,325 - 0,336	11 0,336 - 0,377	11 0,377 - 0,390	11 0,390 - 0,402
Ширина следа, м	3,00 (а/б) 0,182 - 0,318								
Проезжая часть									
Земельные участки									
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На обочине								
Дорожная разметка следа									

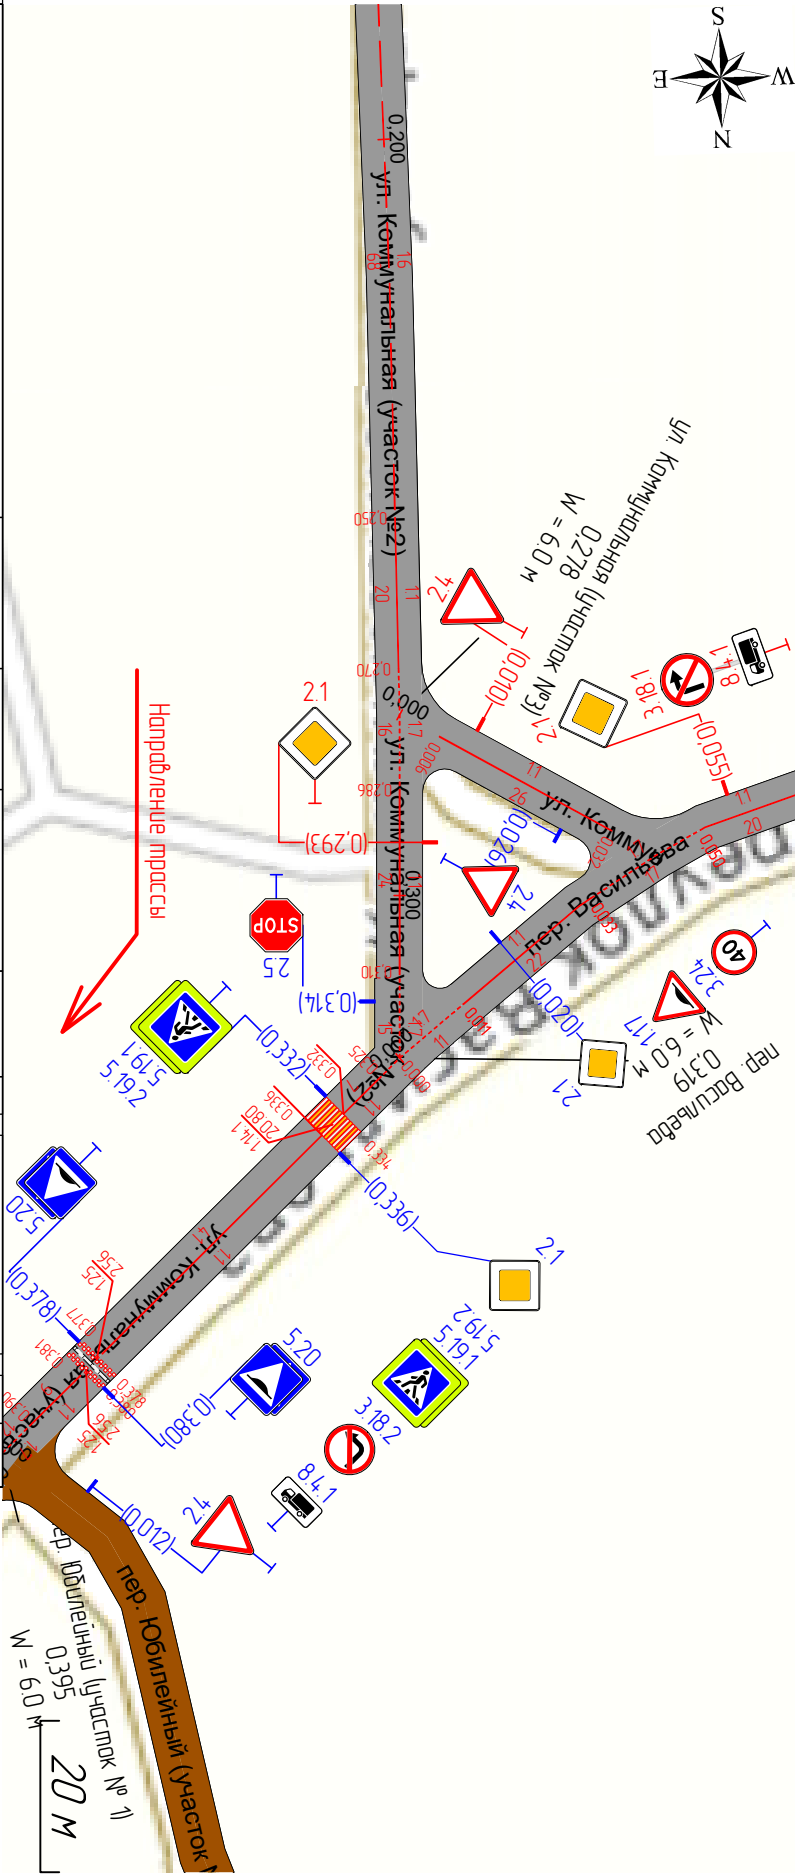


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Горькаева (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,170

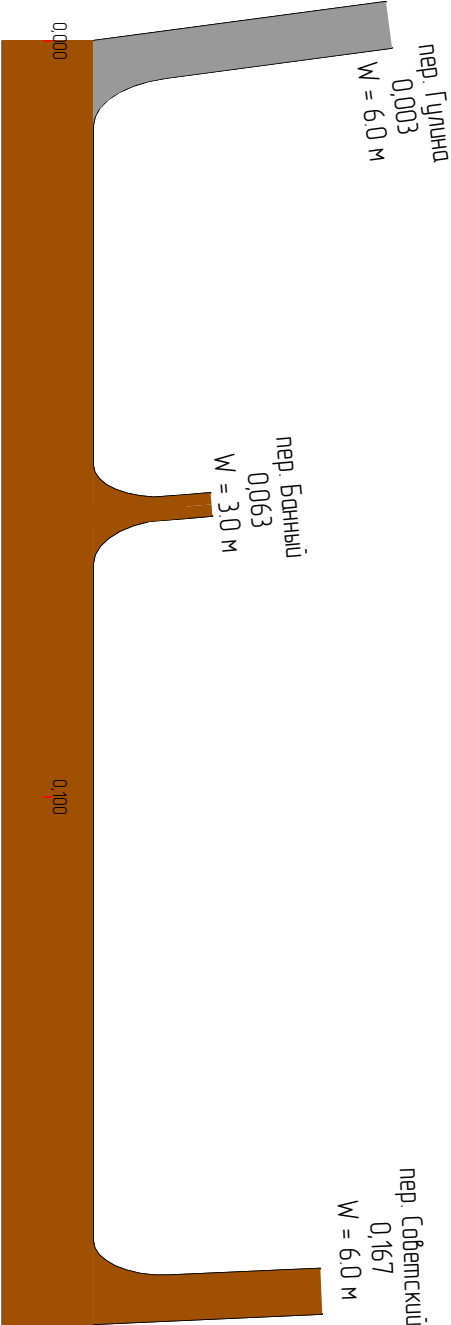

Звездные карты	Звездные карты
Проезжая часть	Проезжая часть
На обочине	На обочине
На разделительной устройстве следа	На разделительной устройстве следа
Дорожная разметка следа	Дорожная разметка следа
Элементы в плане	Элементы в плане

Дорожная разметка следа	Дорожная разметка следа
Проезжая часть	Проезжая часть
Звездные карты	Звездные карты
На разделительной устройстве следа	На разделительной устройстве следа
Дорожная разметка следа	Дорожная разметка следа
Элементы в плане	Элементы в плане


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Горькаяева (участок № 2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,154

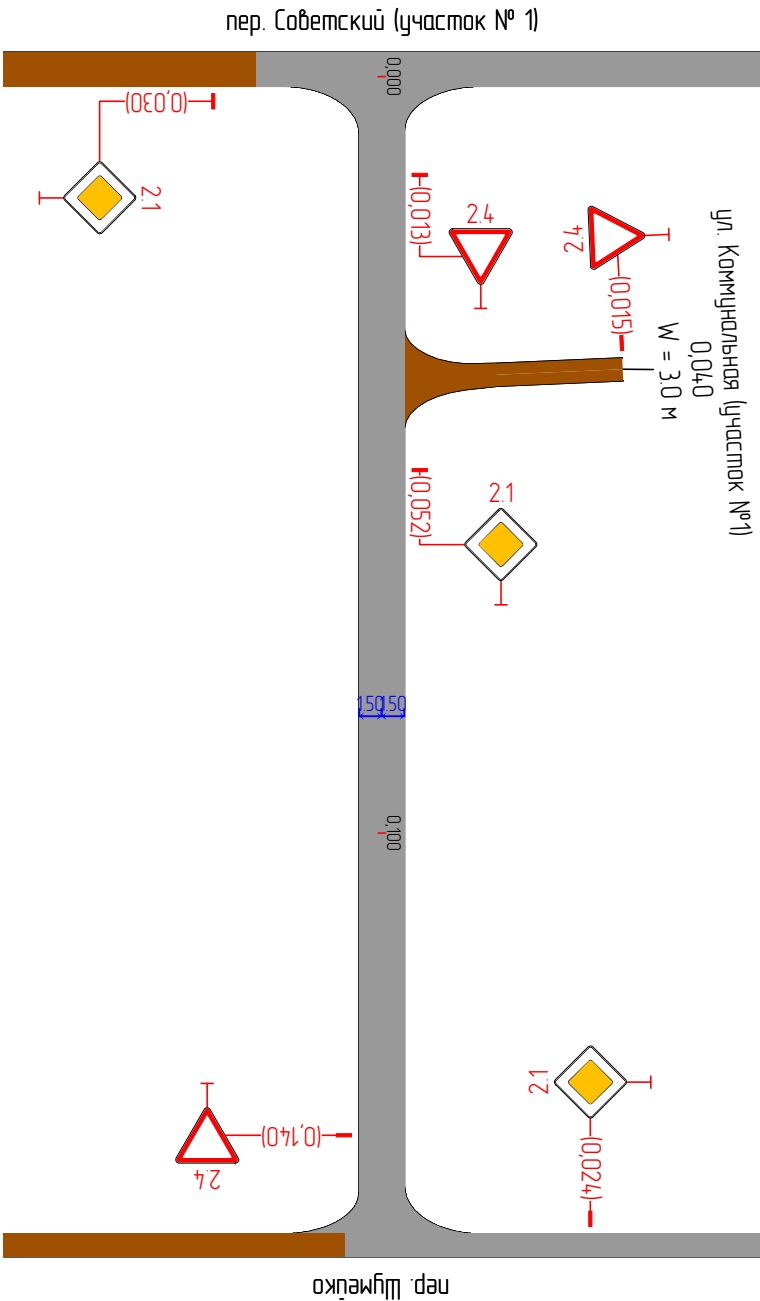

Дорожная разметка strada		
Ширина strada м	Проезжая часть	
	Знак	150 (a/b) 0,000 - 0,154
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На раздельной	
	На обочине	

Ширина strada м	Знак	
	Проезжая часть	150 (a/b) 0,000 - 0,154
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На обочине	
Дорожная разметка strada	На раздельной	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Тополевая
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

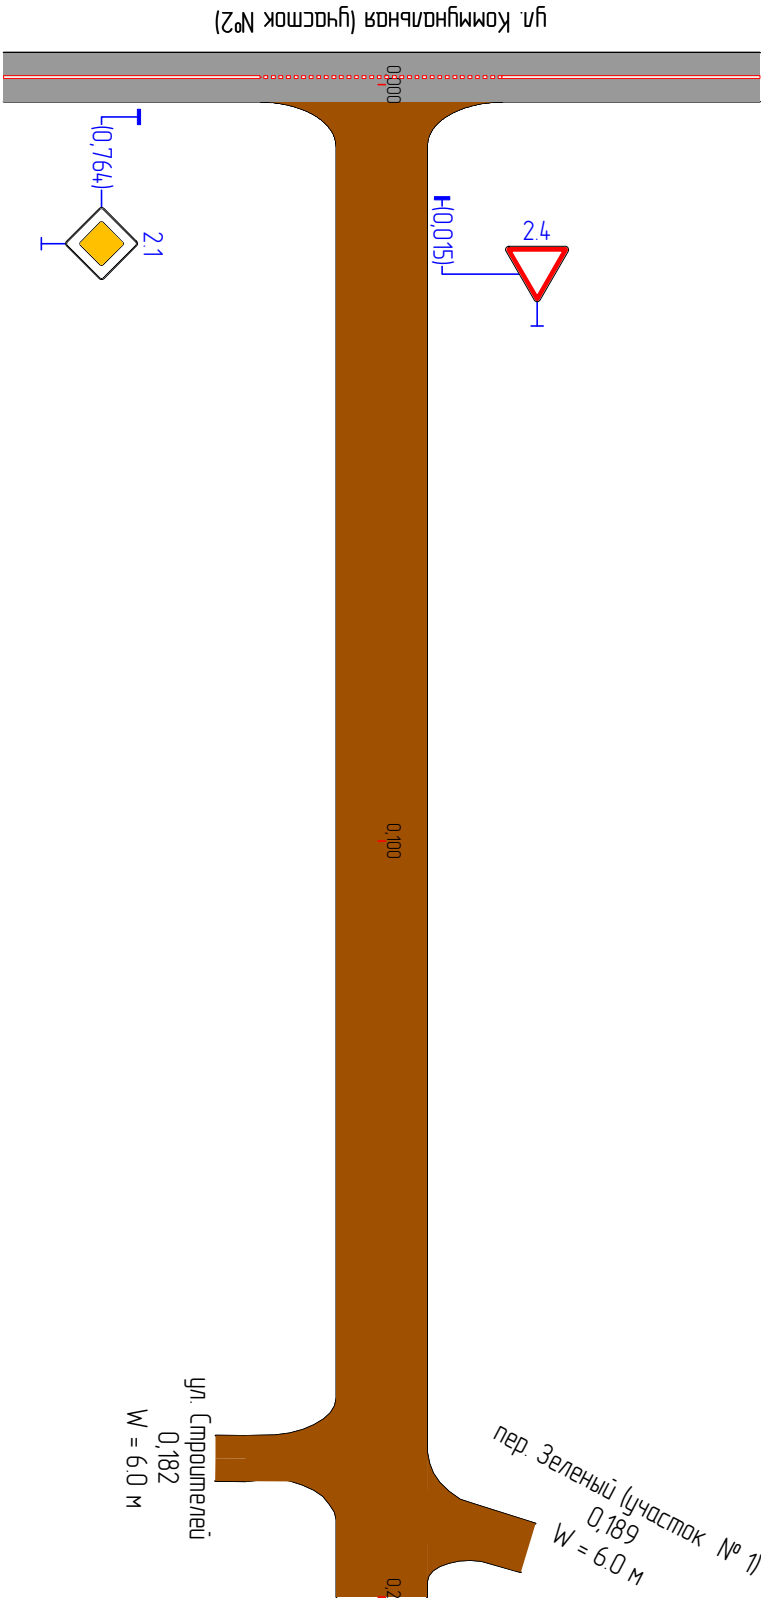


Знаковые корданы	Знаковые корданы
Проезжая часть	Проезжая часть
На обочине	На обочине
На разделительной устройстве	На разделительной устройстве
Дорожная разметка свето	Дорожная разметка свето
Элементы в плане	Элементы в плане

Дорожная разметка свето	Дорожная разметка свето
Проезжая часть	Проезжая часть
Знаковые корданы	Знаковые корданы
На разделительной устройстве	На разделительной устройстве
Дорожная разметка свето	Дорожная разметка свето
Элементы в плане	Элементы в плане


Ширина следа, м	Звездные корданы	
	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,200 - 0,400
Дорожные ограждения и надобновляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельной устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Тополевая
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,400

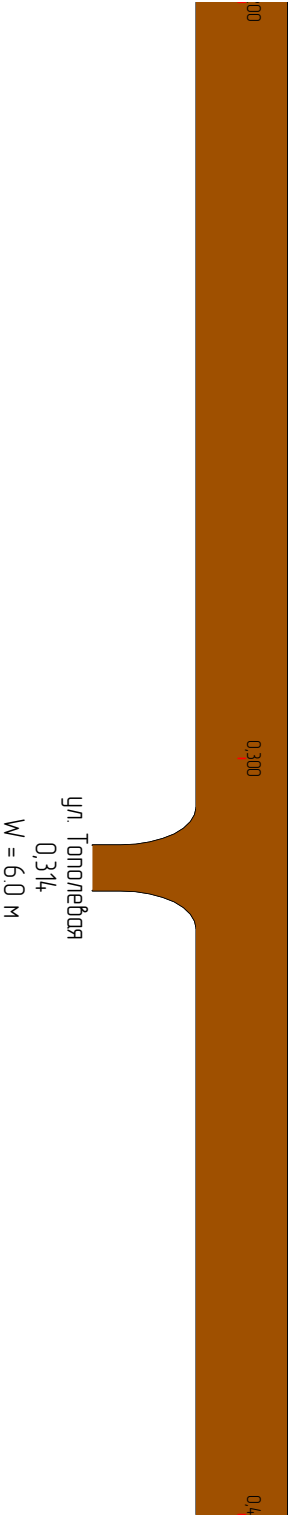

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,200 - 0,400
	Звездные корданы	
Дорожные ограждения и надобновляющие устройства следа	На раздельной устройстве следа	
	На обочине	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
ул. Тополевая
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,400 – км 0,599

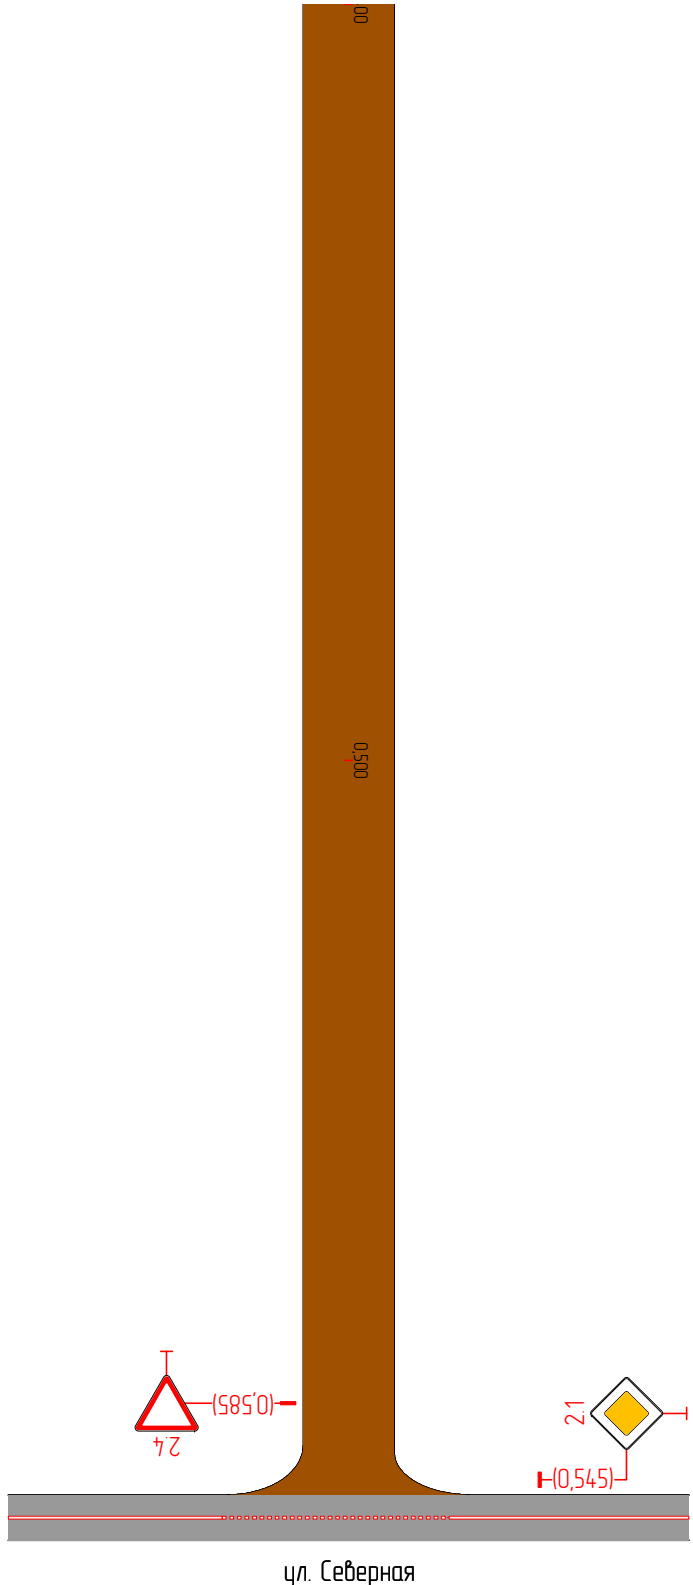

Дорожная разметка strada	
Ширина strada, м	Проезжая часть
	Звездные карманы
	На раздельном
	На обочине

Звездные карманы	
Ширина strada, м	Проезжая часть
	Звездные карманы
	На раздельном
	На обочине

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер 8-го Марта
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

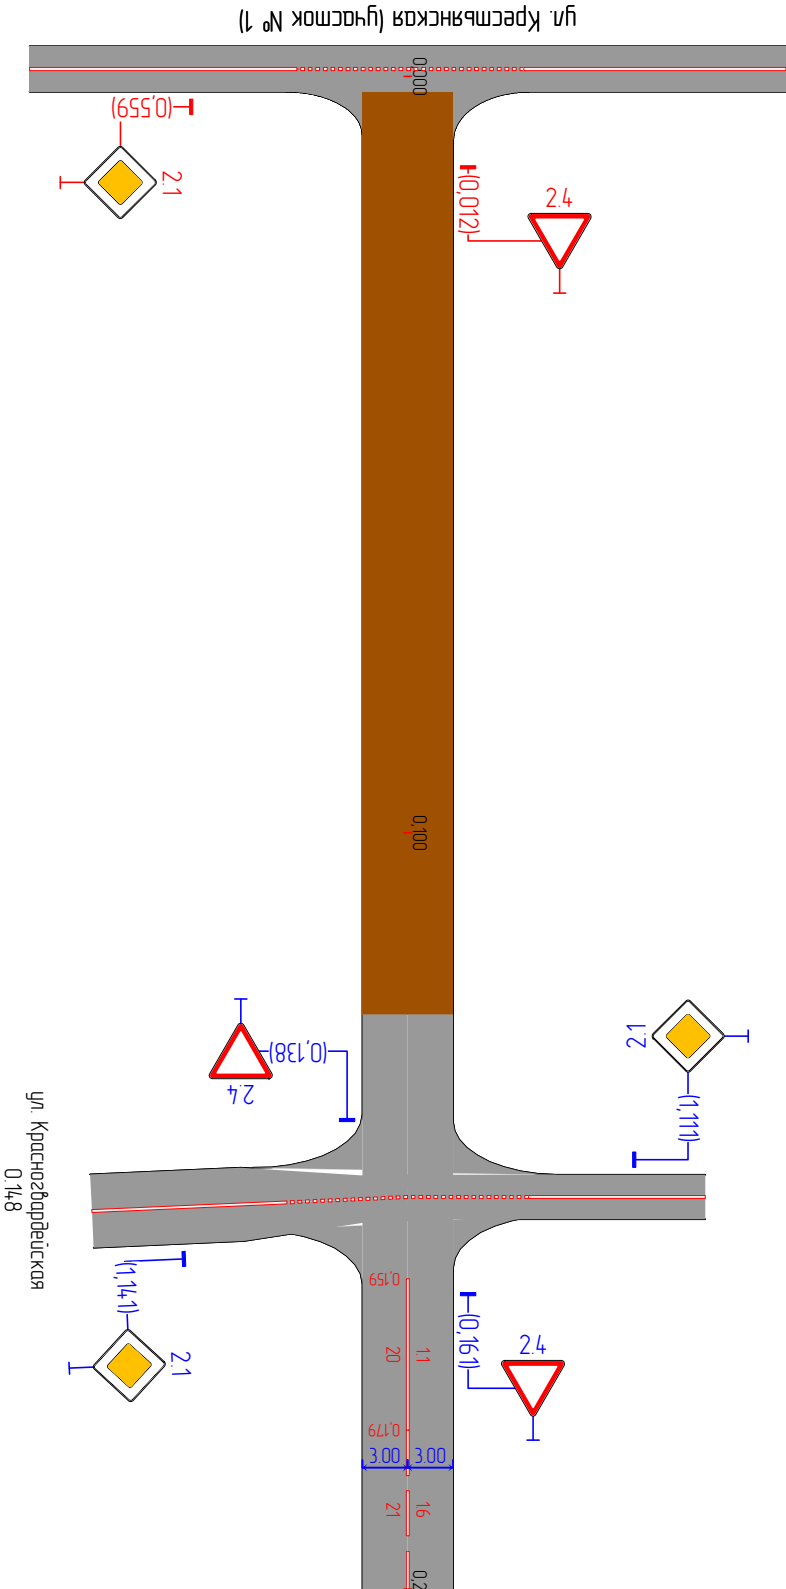

Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,002 - 0,124	3,00 (всего) 0,002 - 0,124
	Зональные карманы		
Дорожные ограждения и дорожные знаки			
устройства справа	На обочине		

Ширина слева, м	Зональные карманы		
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,002 - 0,124	3,00 (всего) 0,124 - 0,200
	На обочине		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			


Ширина следа, м	Зональные карманы	
Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,200 - 0,359	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На обочине	
	На раздельной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

пер 8-го Марта


Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 0,200 – км 0,402

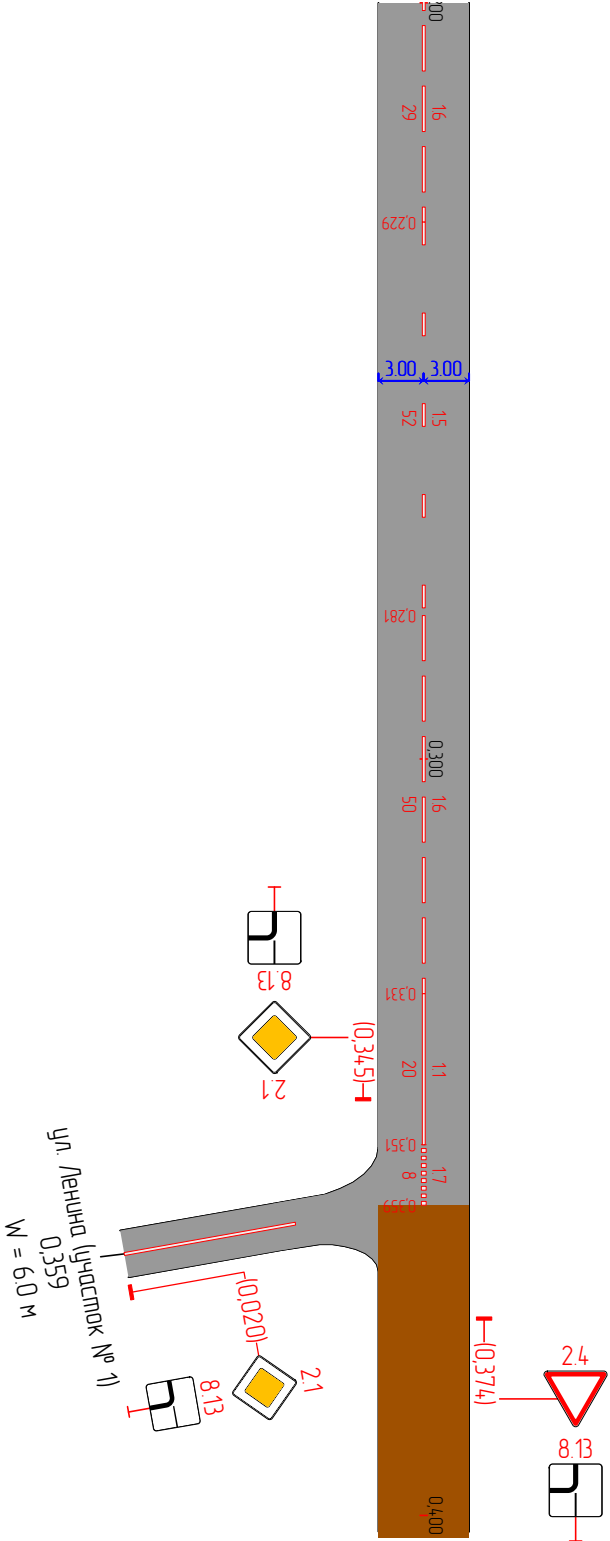

Дорожная разметка следа	16 0.200 - 0.229	15 0.229 - 0.281	16 0.281 - 0.331	11 0.331 - 0.351	17 0.351 - 0.359	3.00 (в/д) 0.359 - 0.402
Ширина следа, м	Проезжая часть	Зональные карманы				
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На раздельной	На обочине				

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Банный
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,189

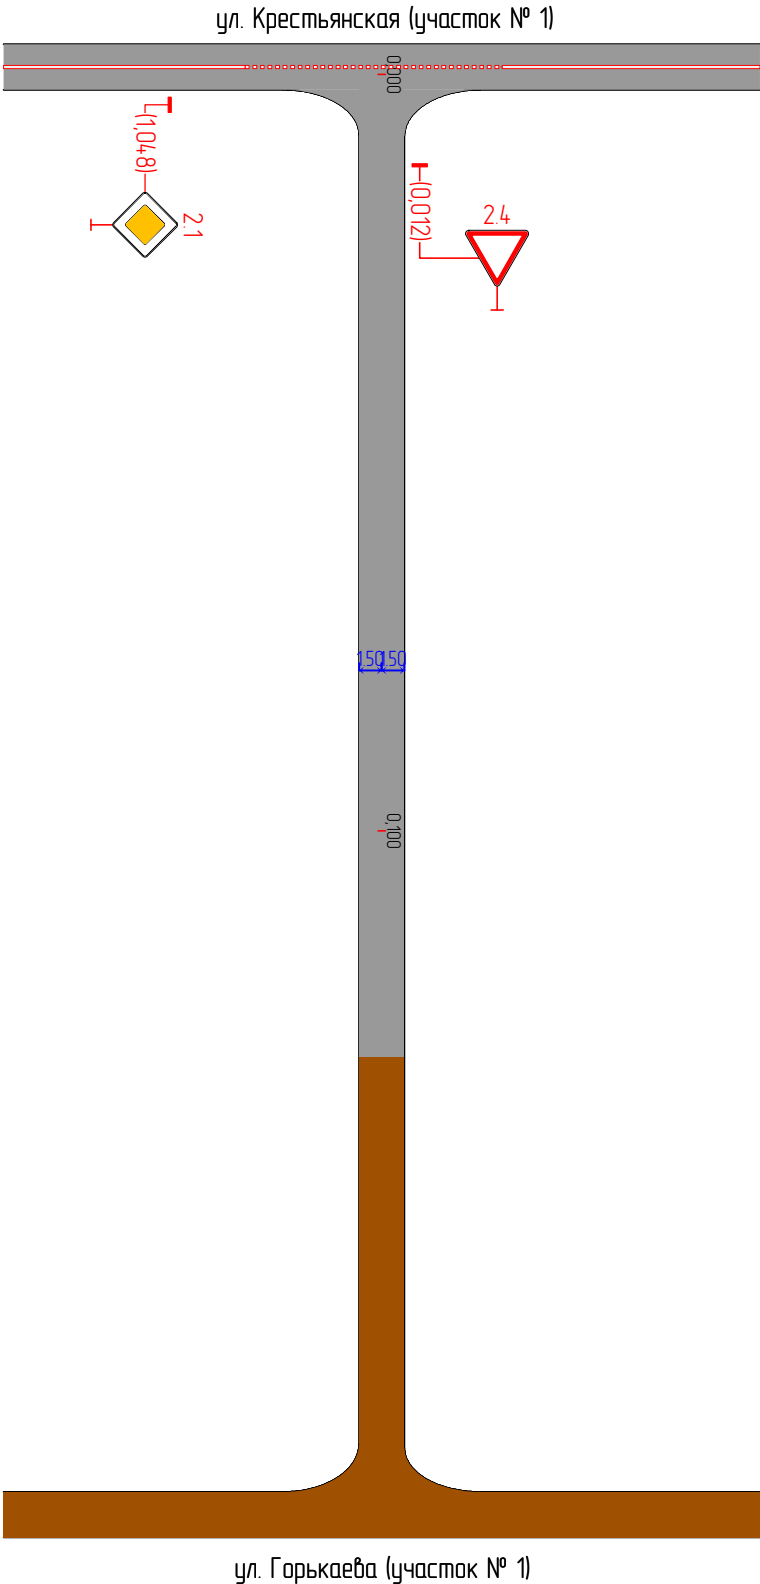


Дорожная разметка с/р/д			
Ширина с/р/д, м	Проезжая часть		
	Зональные карманы		
	На раздельной части		
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На обочине		

Ширина следа, м	Зональные карманы	
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и направляющие устойчивости следа	На обочине	150 (а/б) 0,000 - 0,130
	На раздельной	150 (а/б) 0,130 - 0,190
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Ширина следа, м	Зональные карманы	
Проезжая часть	3,00 (а/д)	3,00 (а/д)
Дорожные ограждения и устраивающие следа	На обочине	0,851 - 0,94,9
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Васильева
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,800 – км 0,948

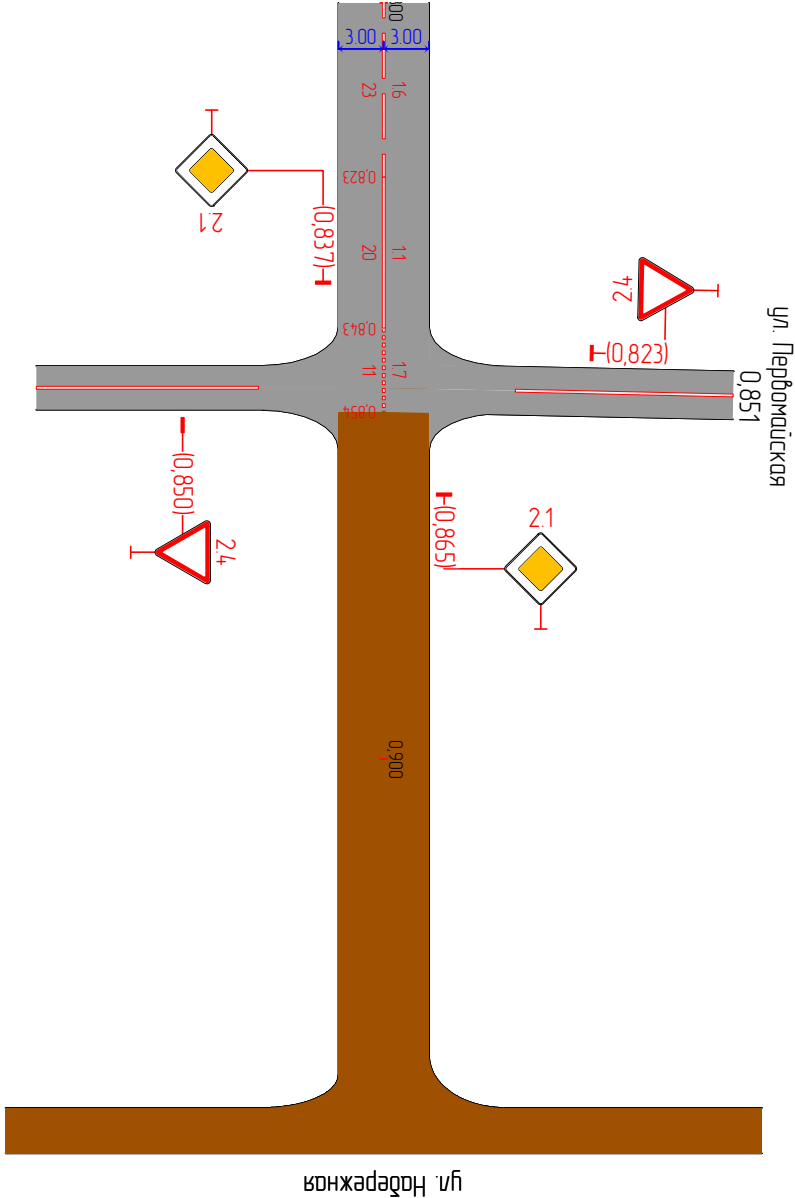

Дорожная разметка следа	16	11	17	
0,800 - 0,823	0,823 - 0,843	0,843 - 0,854		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (а/д)	0,800 - 0,851	3,00 (а/д)
Зональные карманы	На разделительной	0,851 - 0,94,9		
Дорожные ограждения и устраивающие следа	На обочине			


Ширина следа, м	Зоевые карманы	
Проезжая часть		3,00 (а/б) 0,200 - 0,400
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На обочине	
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

пер. Гулина

Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 0,200 – км 0,400

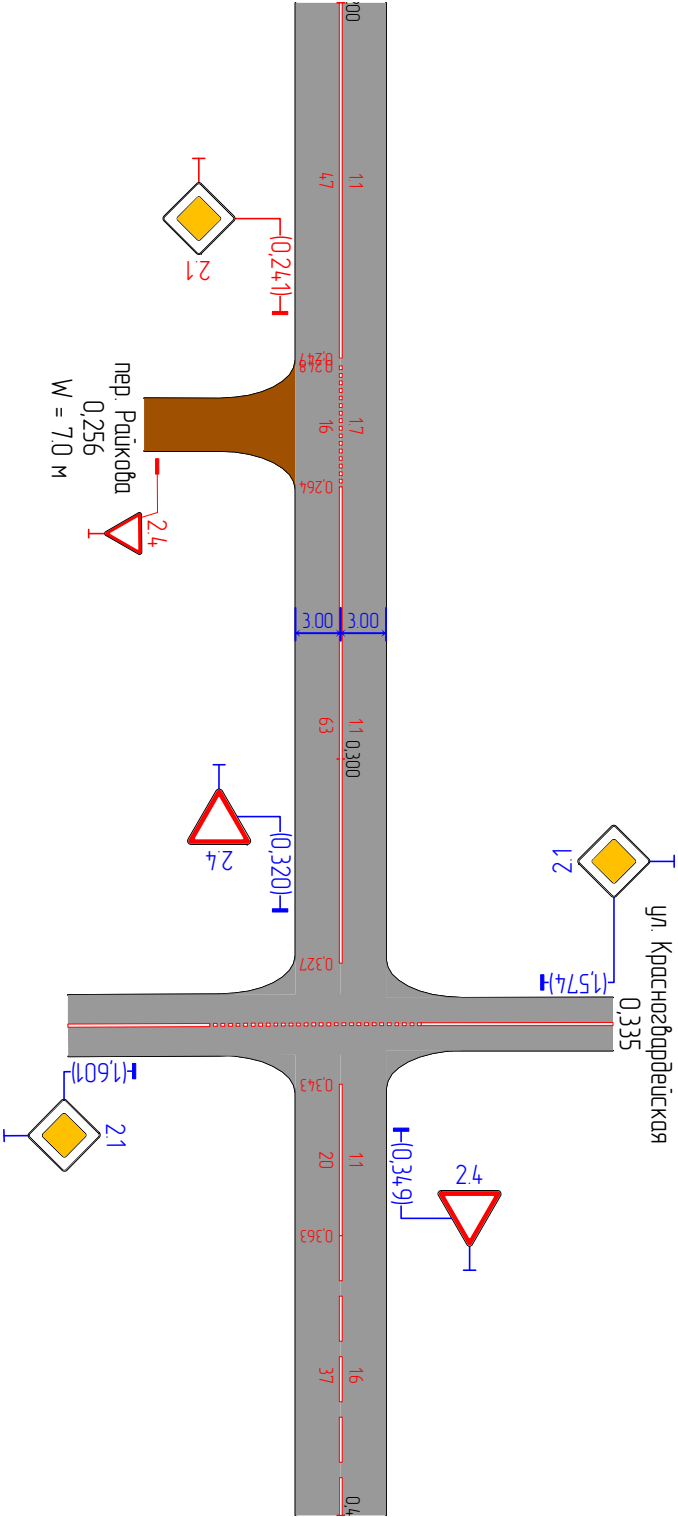

Дорожная разметка следа	11 0,200 - 0,247	17 0,248 - 0,264	11 0,264 - 0,327	11 0,343 - 0,363	16 0,363 - 0,400
Ширина следа, м	Проезжая часть	Зоевые карманы	3,00 (а/б) 0,200 - 0,400		
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На разделительной	На обочине			
Дорожная разметка следа					


Ширина следа, м	Зональные карманы	
Дорожные ограждения и устройства следа	Проезжая часть	3,00 (а/б) 0,600 - 0,800
Дорожная разметка следа	На обочине	
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

пер. Гулина

Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 0,600 – км 0,800

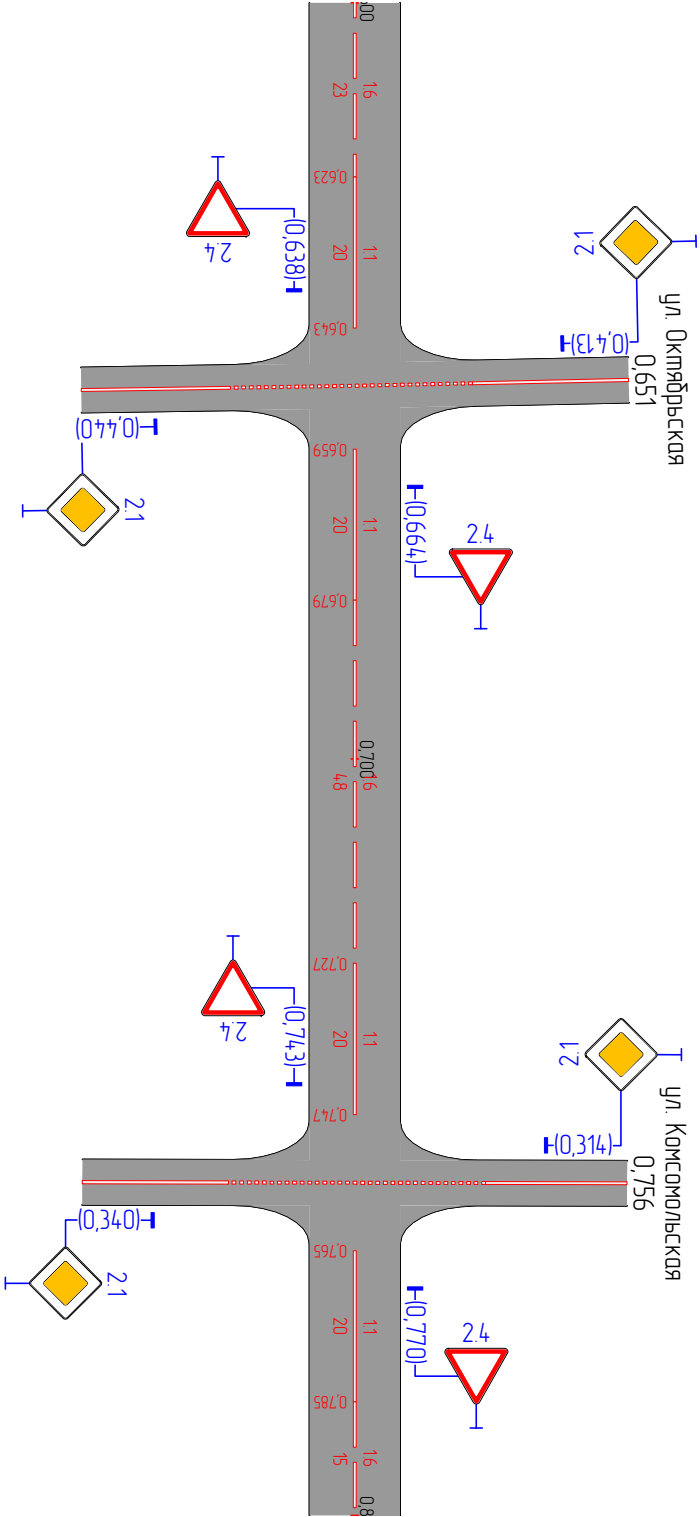

Дорожная разметка следа	16 0,600 - 0,623	11 0,623 - 0,643		11 0,659 - 0,679	16 0,679 - 0,727	11 0,727 - 0,747		11 0,765 - 0,785	16 0,785 - 0,800
Ширина следа, м	3,00 (а/б) 0,600 - 0,800								
Дорожные ограждения и устройства следа	Проезжая часть	Зональные карманы	На разделительной	На обочине					


Ширина следа, м	Зональные карманы	
Дорожные ограждения и устройства следа	Проезжая часть	3,00 (а/б) 0,800 - 0,864
	На обочине	3,00 (а/б) 0,864 - 0,995
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

пер. Гулина


Выполнено по состоянию на май 2025 г.

км 0,800 – км 0,995

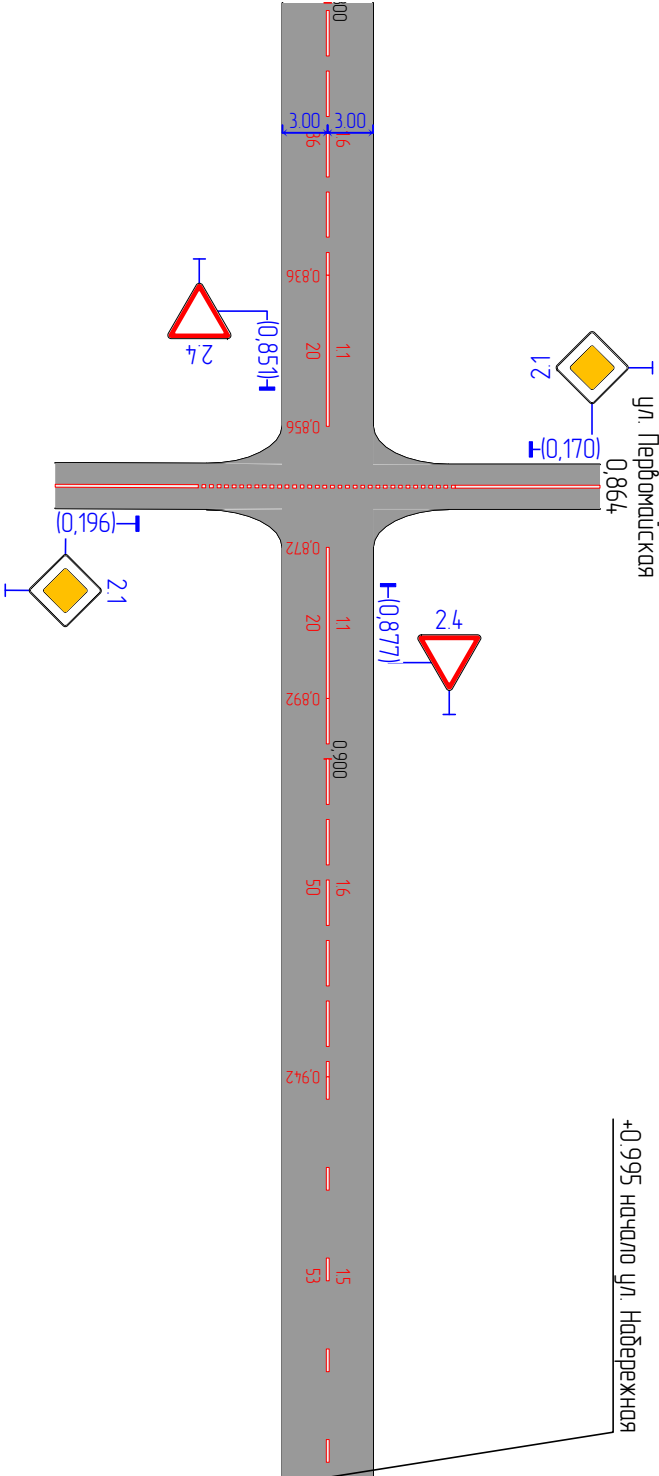

Дорожная разметка следа	16 0,800 - 0,836	11 0,836 - 0,856	11 0,872 - 0,892	16 0,892 - 0,942	15 0,942 - 0,995
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (а/б) 0,800 - 0,864		3,00 (а/б) 0,864 - 0,995	
Дорожные ограждения и устройства следа	Зональные карманы				
	На разделительной				
	На обочине				

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Иванова
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

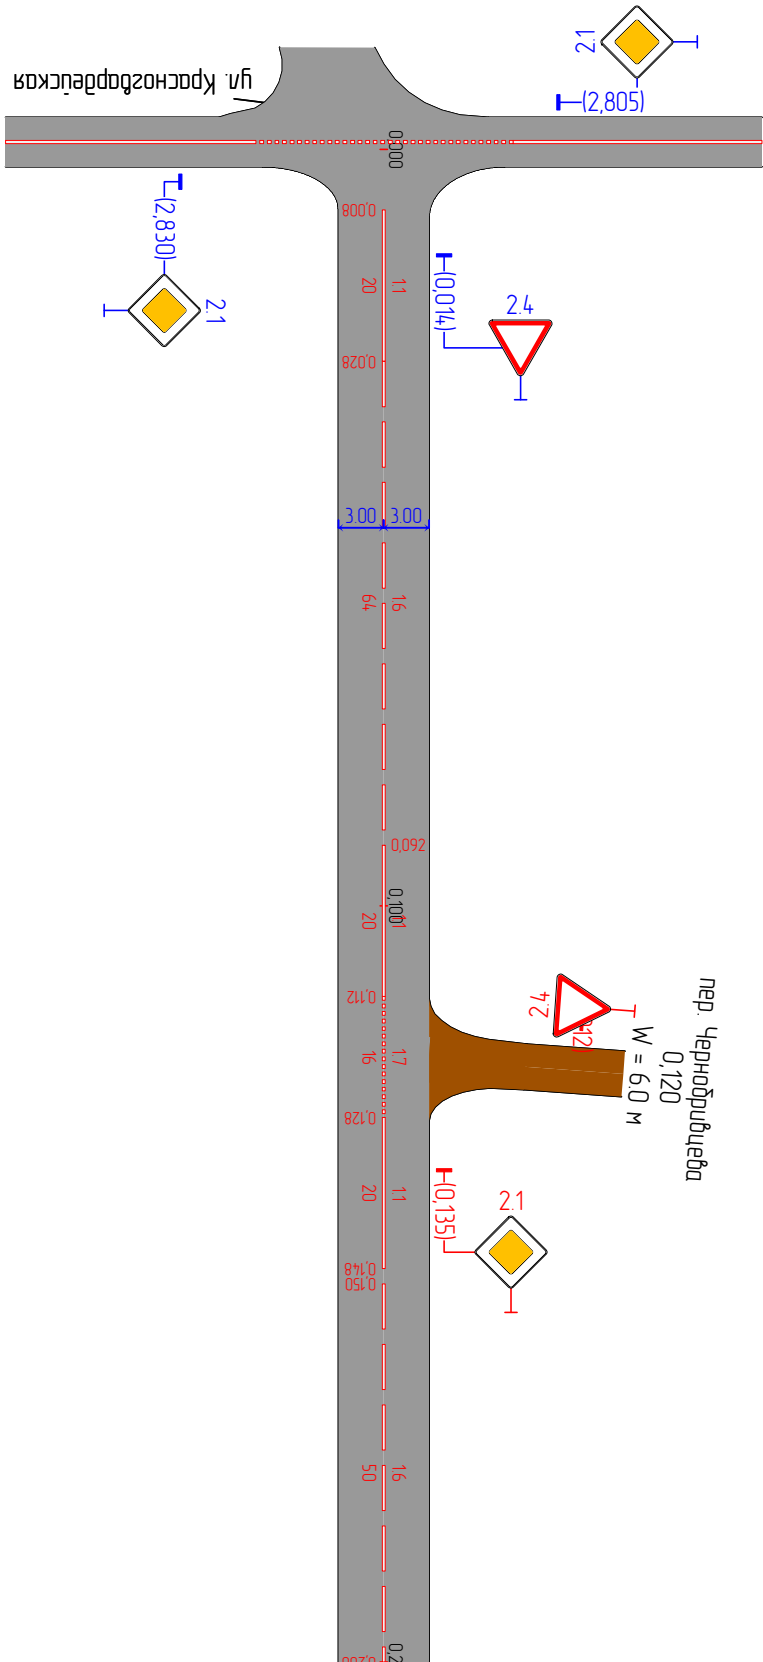


Дорожная разметка спора		11	16	11	17	11	16
Ширина спора, м		0.008 - 0.028	0.028 - 0.092	0.092 - 0.112	0.112 - 0.128	0.128 - 0.148	0.150 - 0.200
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3.00 м/д/л					
	На разделительной полосе	0.000 - 0.200					
Дорожные ограждения и дорожные знаки		На обочине					
Дорожные ограждения и дорожные знаки		На обочине					

Ширина спора, м	Проезжая часть	3.00 м/д/л
Дорожные ограждения и дорожные знаки		0.000 - 0.200
Дорожная разметка спора		На разделительной полосе
Элементы в плане		Элементы в плане


Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,200 - 0,400
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На раздельной полосе	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Иванова
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,400

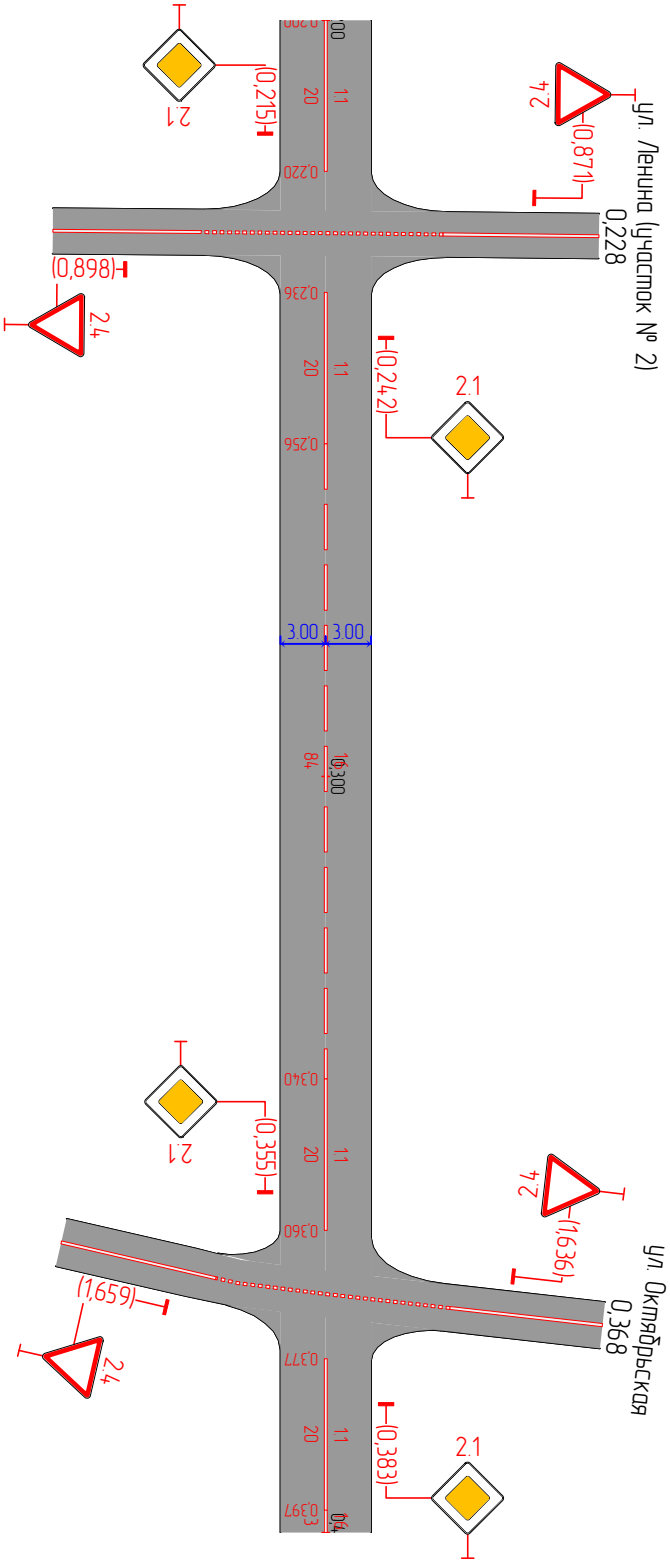

Дорожная разметка следа	11	11	16	11	11	16
Ширина следа, м	0.200 - 0.220	0.236 - 0.256	0.256 - 0.340 3,00 (в/д) 0.200 - 0.400	0.340 - 0.360	0.377 - 0.397	0.400
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Звездные карманы					
Дорожная разметка следа	На обочине					


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Иванова
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,400 – км 0,600

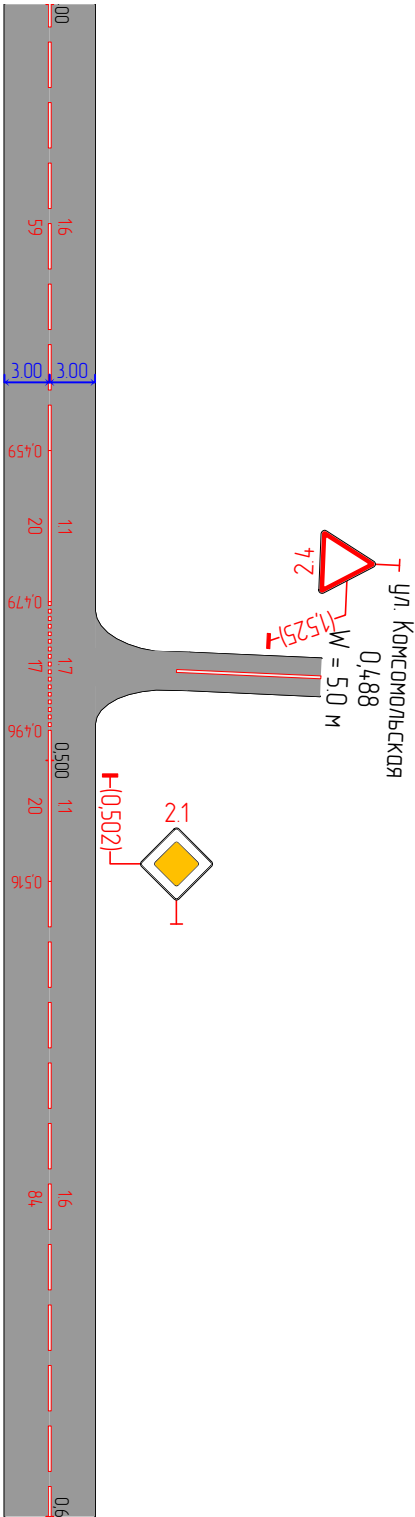

Знаковые корданы	
Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,400 - 0,600
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Дорожная разметка	
Элементы в плане	

Дорожная разметка	16 0,400 - 0,459	11 0,459 - 0,479	17 0,479 - 0,496	11 0,496 - 0,516	16 0,516 - 0,600
Ширина справки	Проезжая часть	Знаковые корданы			
Дорожные ограждения и направляющие устройства	На разделительной	На обочине			


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Иванова
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,800 – км 0,831

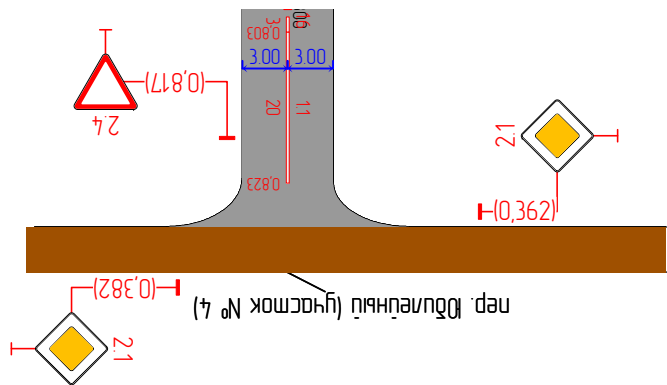

Дорожная разметка съезда		15	11
Ширина съезда, м		0.803 - 0.823	3.00 (а/б) 0.800 - 0.831
Дорожные ограждения и дорожные устройства съезда	Проезжая часть		
	Знаковые корданы		
На раздельной			
На обочине			

Ширина съезда, м	Знаковые корданы	3.00 (а/б) 0.800 - 0.831
Дорожные ограждения и дорожные устройства съезда	На обочине	
Дорожная разметка съезда	На раздельной	
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Калинина
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,300 – км 0,500

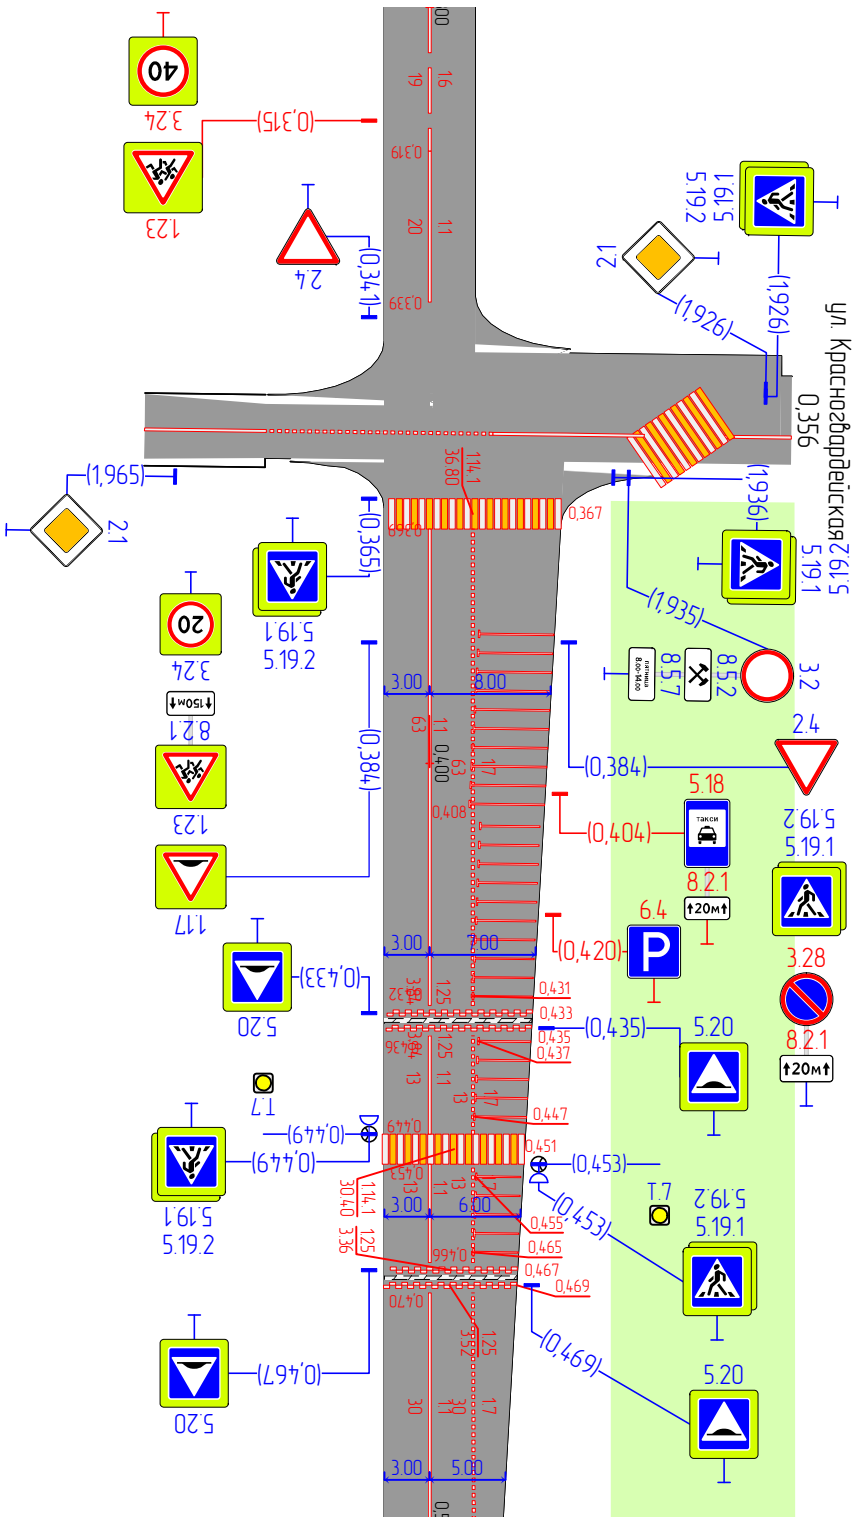

Дорожная разметка спрда		16	11	11		17		11	
0,300 - 0,319		0,319 - 0,339	0,339 - 0,353	0,356 - 0,432		0,436 - 0,449	0,453 - 0,466	0,470 - 0,500	
Ширина спрда м		3,00 (а/б)		3,00 (а/б)		3,00 (а/б)		3,00 (а/б)	
Дорожные ограждения и дорожные устройства спрда		На раздельной		На раздельной		На раздельной		На раздельной	
Дорожные ограждения и дорожные устройства спрда		На обочине		На обочине		На обочине		На обочине	

Ширина спрда м	Зазорные карманы	3,00 (а/б)	3,00 (а/б)	9,00 - 4,85 (а/б)
Дорожные ограждения и дорожные устройства спрда	На обочине	0,300 - 0,351	0,356 - 0,500	0,356 - 0,500
Дорожная разметка спрда				
Элементы в плане				


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Калинина
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,700 – км 0,910

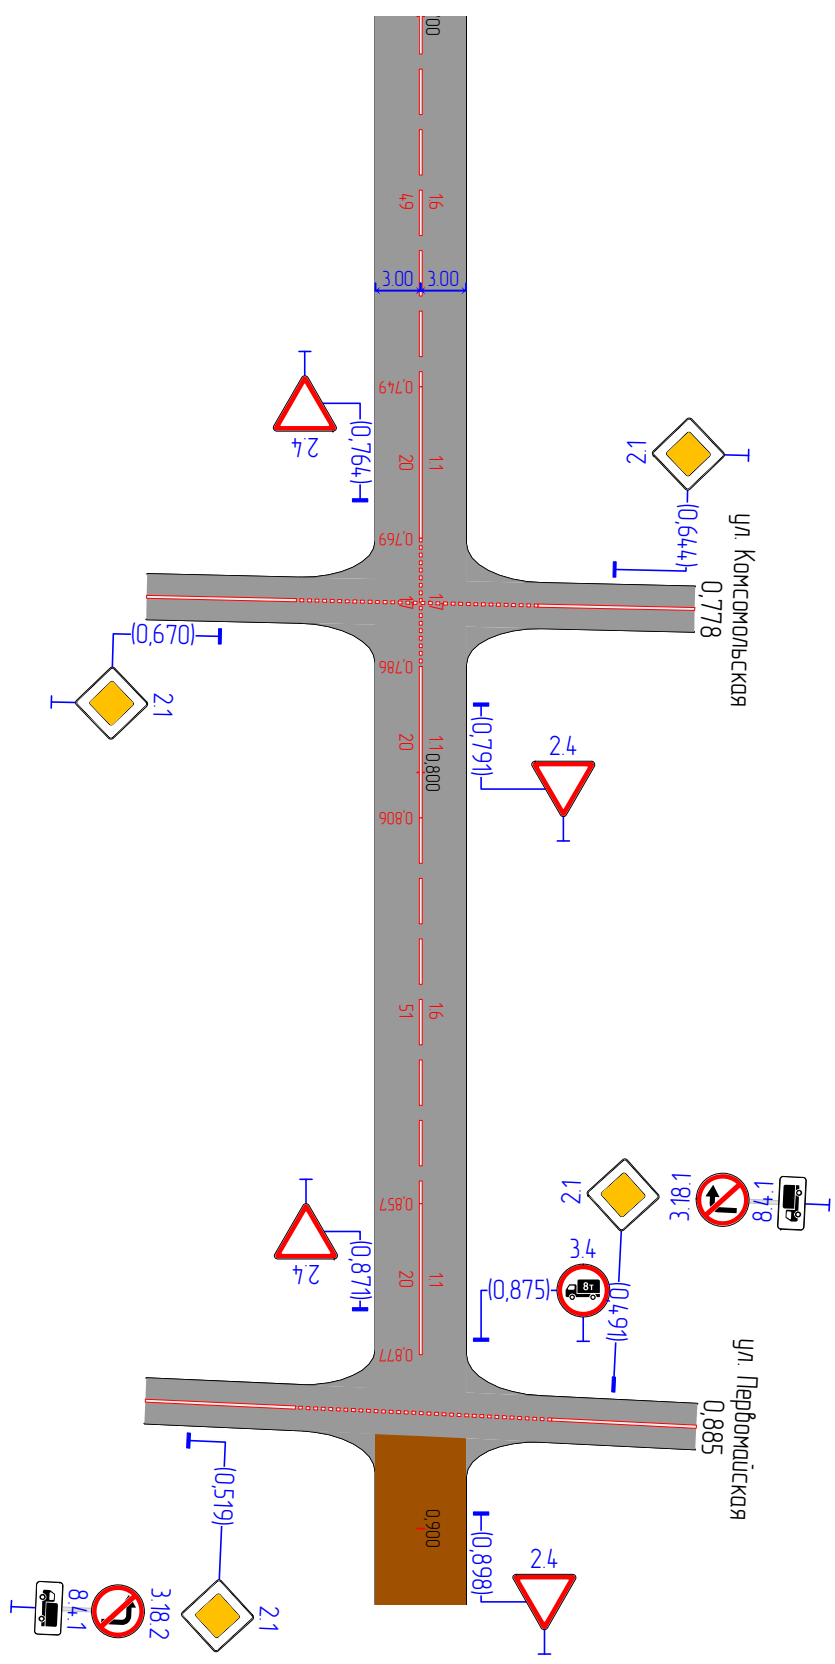

Дорожная разметка спвода		16	11	17	11	16	11
		0,700 - 0,749	0,749 - 0,769	0,769 - 0,786	0,786 - 0,806	0,806 - 0,857	0,857 - 0,877
Ширина спвода м		3,00 (вкл.) 0,886 - 0,910					
Дорожные ограждения и дорожные устройства спвода	Проезжая часть						
	Завязочные карманы						
	На раздельном						
	На обочине						

Ширина спвода м	Завязочные карманы	3,00 (вкл.) 0,886 - 0,910
Дорожные ограждения и дорожные устройства спвода		
Дорожная разметка спвода		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Калинина
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,910 – км 1,020

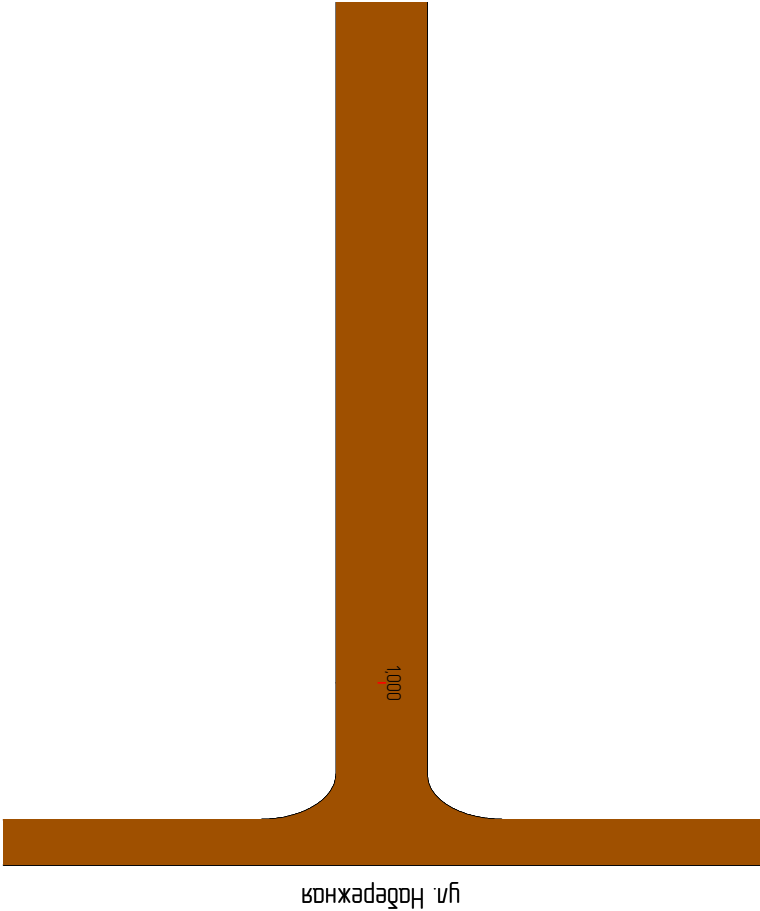

Ширина следа, м	Звездные карманы	3,00 (карм.) 0,910 – 1,021
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На обочине	
	На раздельном устройстве следа	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (карм.) 0,910 – 1,021
	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На раздельном устройстве следа	
	На обочине	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Колхозный
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,400

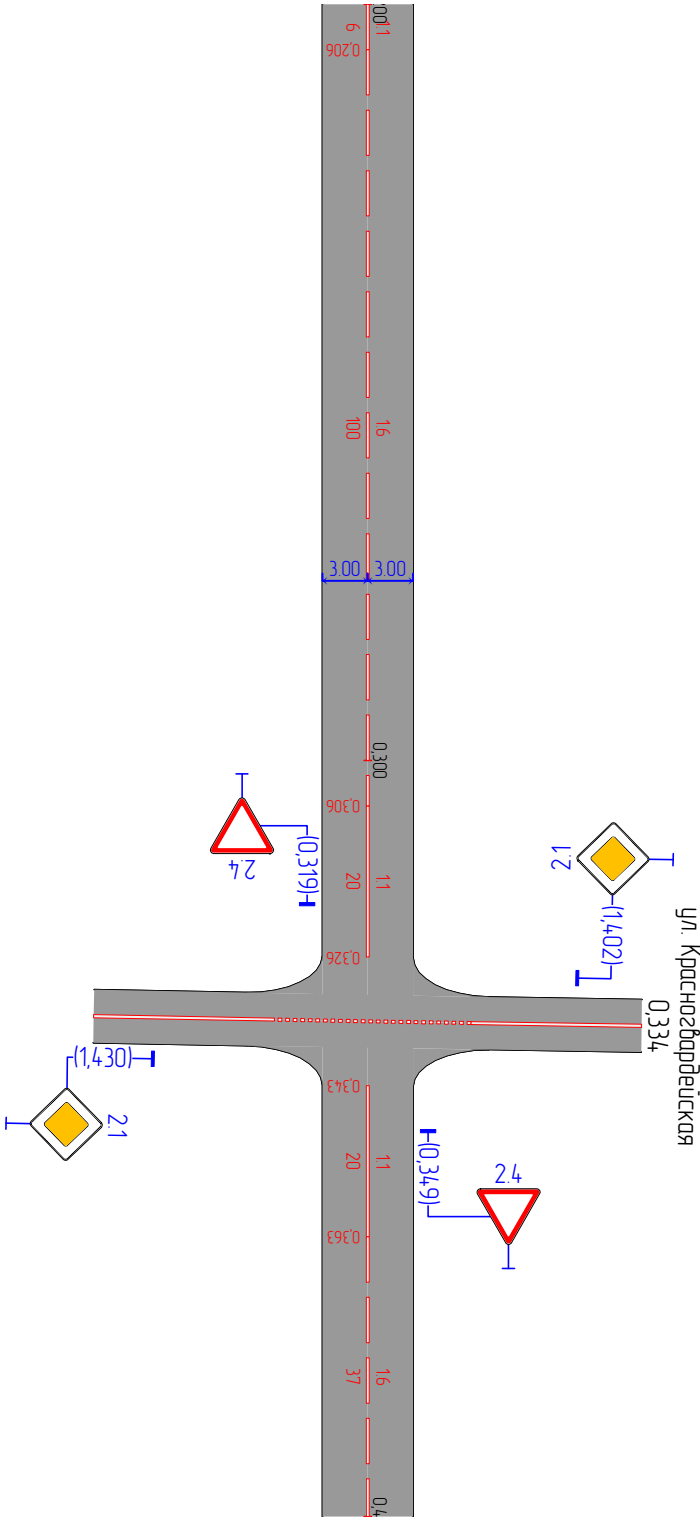


Дорожная разметка спарва		11	16	11	11	16
		0.200 - 0.206	0.206 - 0.306	0.306 - 0.326	0.343 - 0.363	0.363 - 0.400
Ширина спарва, м	Проезжая часть	3.00 (в/д) 0.200 - 0.400				
	Звездные карманы					
Дорожные ограждения и дорожные устройства спарва	На раздельном					
	На обочине					

Ширина следа, м	Звездные карманы					
Проезжая часть		3.00 (в/д) 0.200 - 0.400				
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	На обочине					
Дорожная разметка следа	На раздельном					
Элементы в плане						

Ширина следа, м	Звездные корданы	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 (в/д) 0,400 - 0,600
Дорожная разметка следа	На обочине	
Элементы в плане	На раздельном устройстве следа	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Колхозный
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,400 – км 0,600

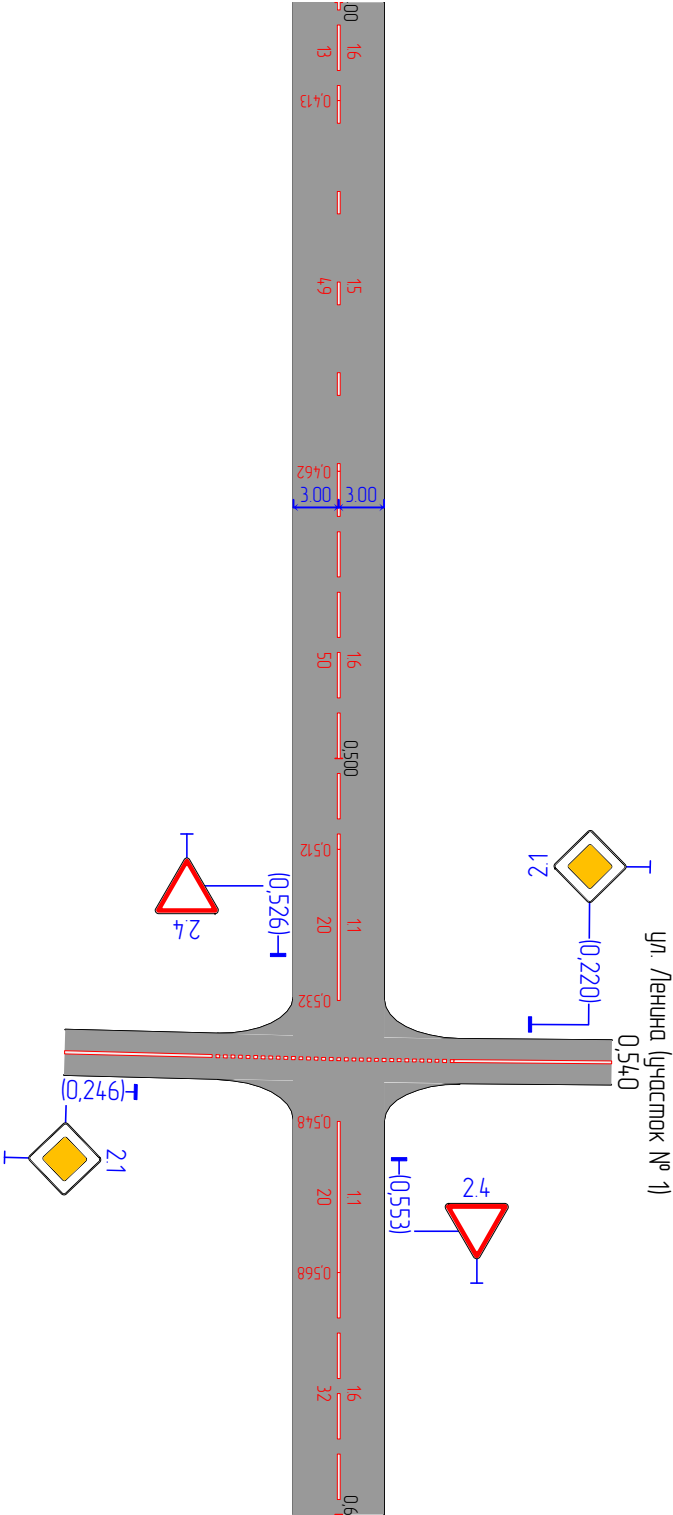

Дорожная разметка следа	16 0,400 - 0,413	15 0,413 - 0,462	16 0,462 - 0,512	11 0,512 - 0,532	11 0,548 - 0,568	16 0,568 - 0,600
Ширина следа, м	Проезжая часть	Звездные корданы	3,00 (в/д) 0,400 - 0,600			
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На раздельном устройстве следа	На обочине				


Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 (в/д)
Дорожная разметка следа	На обочине	0,600 - 0,800
Элементы в плане	На разделительной полосе	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

пер. Колхозный

Выполнено по состоянию на май 2025 г.


км 0,600 – км 0,800

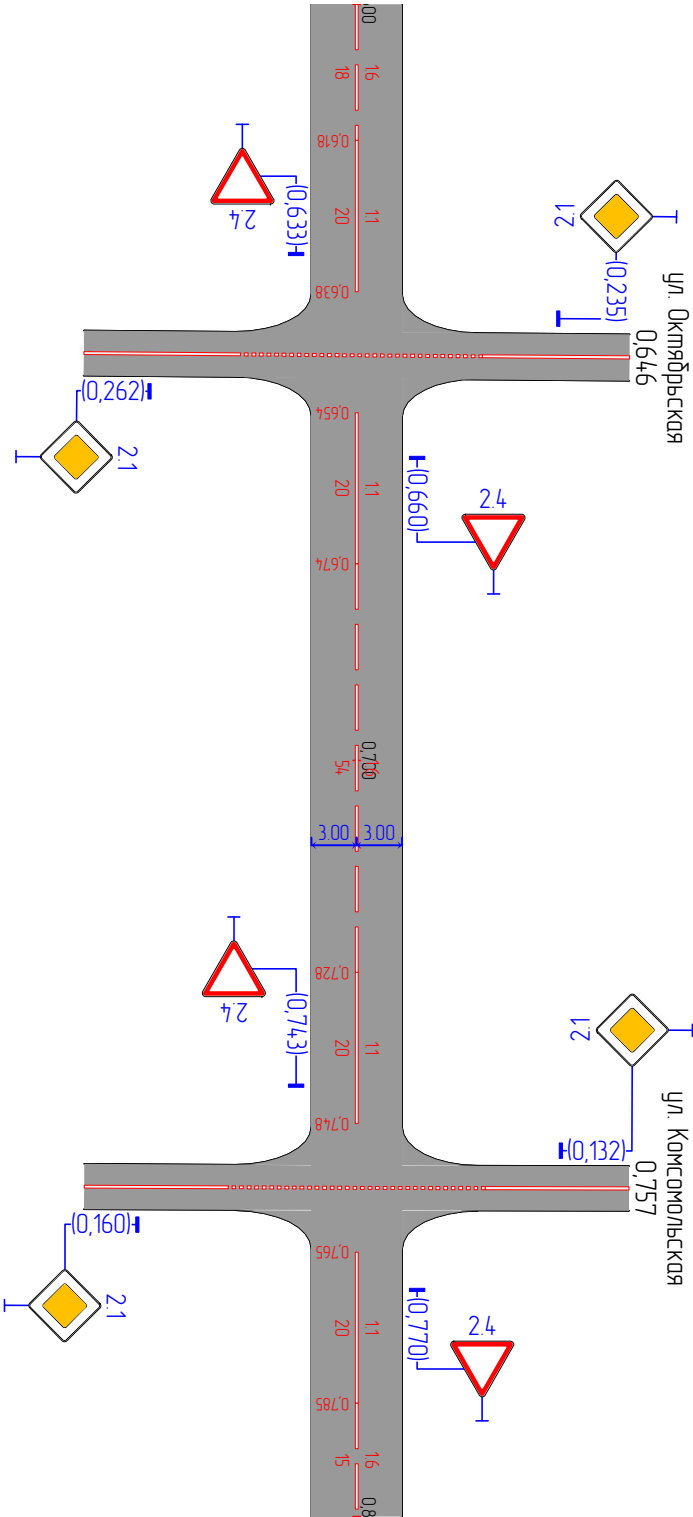

Дорожная разметка следа	16	11	11	16	11	16
Ширина следа, м	0,600 - 0,618	0,618 - 0,638	0,638 - 0,654	0,654 - 0,674	0,674 - 0,728	0,728 - 0,748
Проезжая часть	Звездные карманы					
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На разделительной полосе					
Дорожная разметка следа	На обочине					


Ширина следа, м	Звездные корданы		
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 (а/д) 0,800 - 0,866	1,75 (а/д) 0,865 - 0,925
Дорожная разметка следа	На обочине		
Элементы в плане	На разделительной полосе		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Колхозный
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,800 – км 0,900

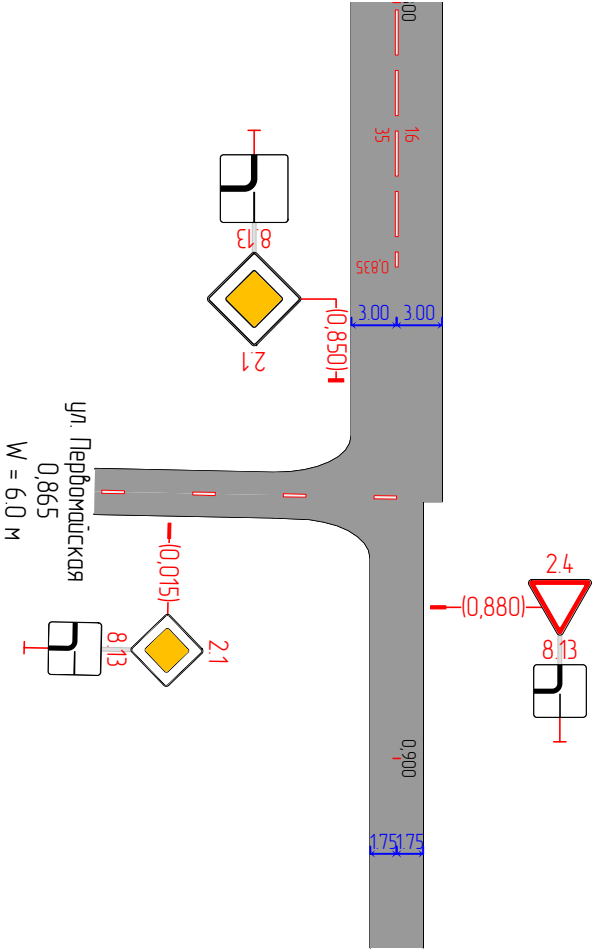

Дорожная разметка следа	16	0,800 - 0,835	
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (а/д) 0,800 - 0,866	1,75 (а/д) 0,865 - 0,925
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Звездные корданы		
Дорожная разметка следа	На обочине		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Лазаренко
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,150

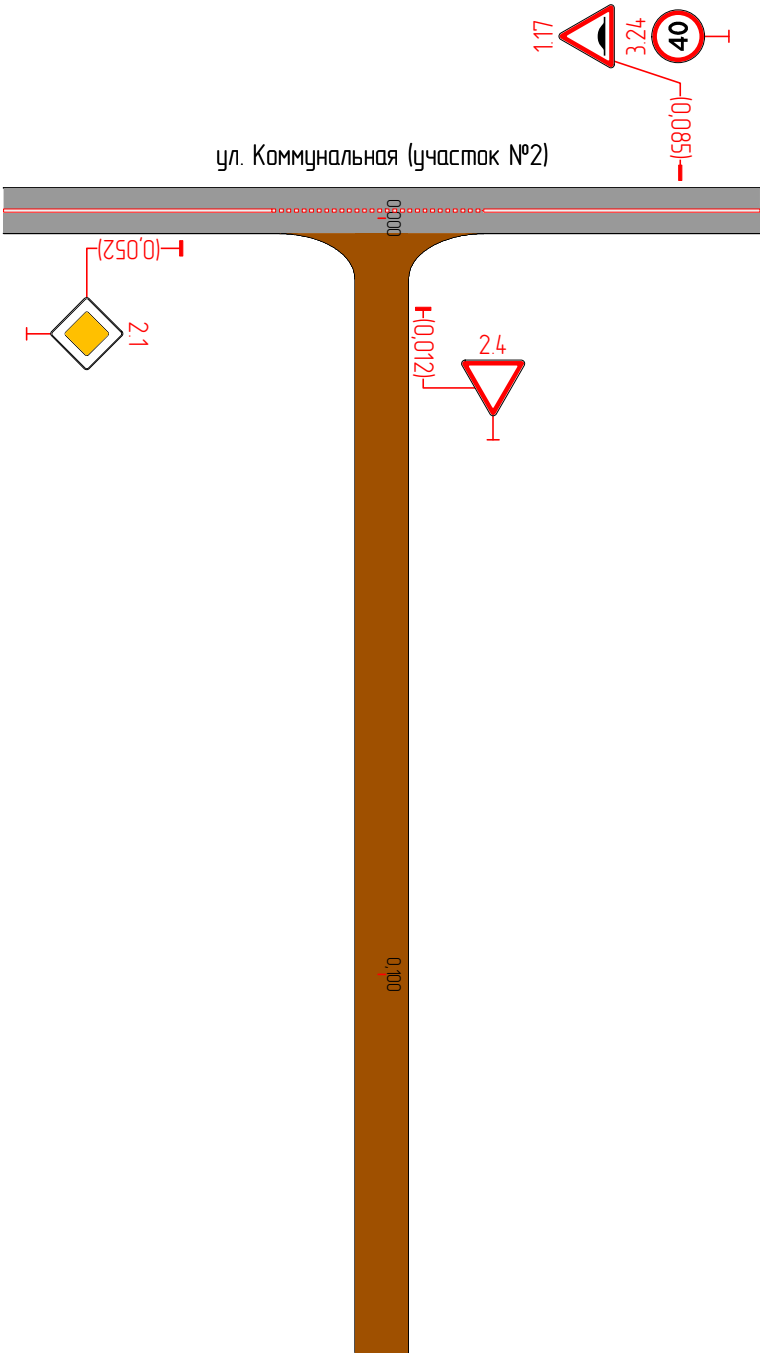

Дорожная разметка strada		
Ширина strada, м	Проезжая часть	1.75 (ручн) 0.002 - 0.150
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	Знаковые корданы	
	На раздельном	
На обочине		

Знаковые корданы	
Проезжая часть	1.75 (ручн) 0.002 - 0.150
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	
На раздельном	
Дорожная разметка strada	
Элементы в плане	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Лазаренко
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,150 – км 0,229

Ширина следа, м	Звездные карманы	
	Проезжая часть	1,75 (аргумент) 0,150 - 0,229
	Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	
Дорожная разметка следа	На обочине	
	На разделительной	
	Дорожная разметка следа	
Элементы в плане		



Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	1,75 (аргумент) 0,150 - 0,229
	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На разделительной	
	На обочине	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Мирный
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,164

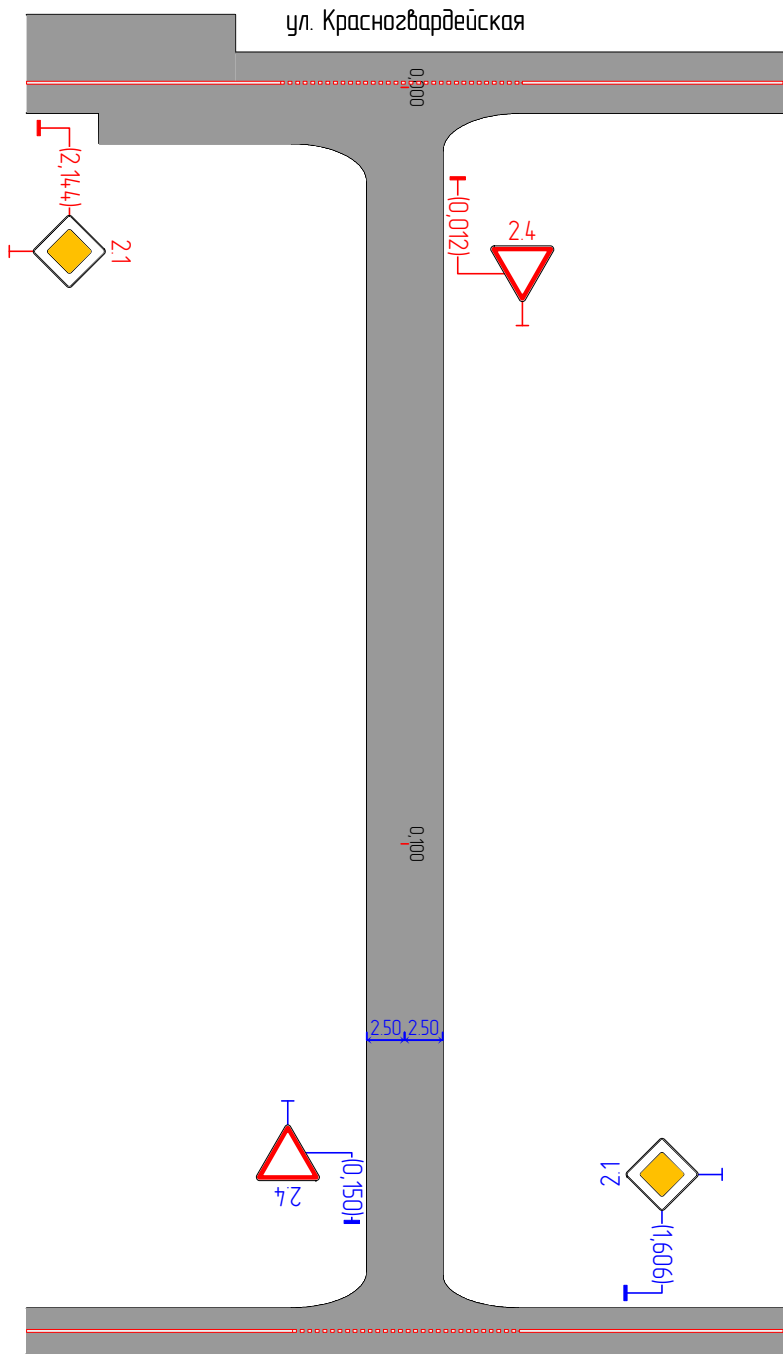


ул. Крестыанская (линия № 1)

Дорожная разметка strada		
Ширина strada, м	Проезжая часть	2,50 (w/d) 0,003 - 0,164
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	Знаковые корданы	
	На раздельной	
На обочине		

Ширина strada, м	Знаковые корданы	2,50 (w/d) 0,003 - 0,164
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На обочине	
	На раздельной	
Дорожная разметка strada		
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Пионерский
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

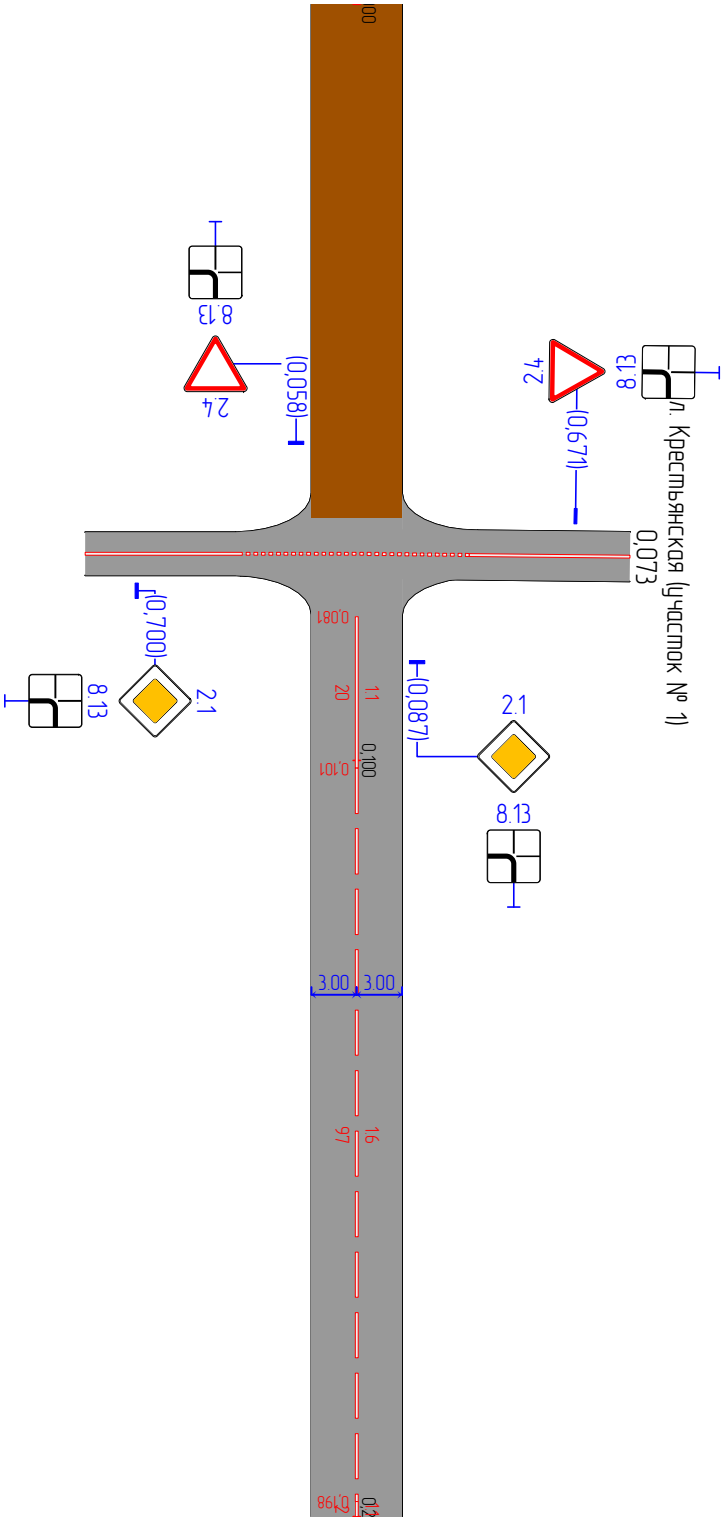

Дорожная разметка спора		11	16
Ширина спора, м		3.00 (внутр) 0.000 - 0.068	3.00 (вн/вн) 0.068 - 0.200
Дорожные ограждения и дорожные знаки		Звездные знаки	Звездные знаки
Дорожные ограждения и дорожные знаки		На раздельном	На раздельном
Дорожные ограждения и дорожные знаки		На обочине	На обочине

Звездные знаки	Звездные знаки
Проезжая часть	Проезжая часть
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Дорожные ограждения и дорожные знаки
Дорожная разметка спора	Дорожная разметка спора
Элементы в плане	Элементы в плане


Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	Проезжая часть	3,00 (в/д)
Дорожная разметка следа	На обочине	0,400 - 0,600
Элементы в плане	На раздельной полосе	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"

пер. Пионерский

Выполнено по состоянию на май 2025 г.


км 0,400 – км 0,600

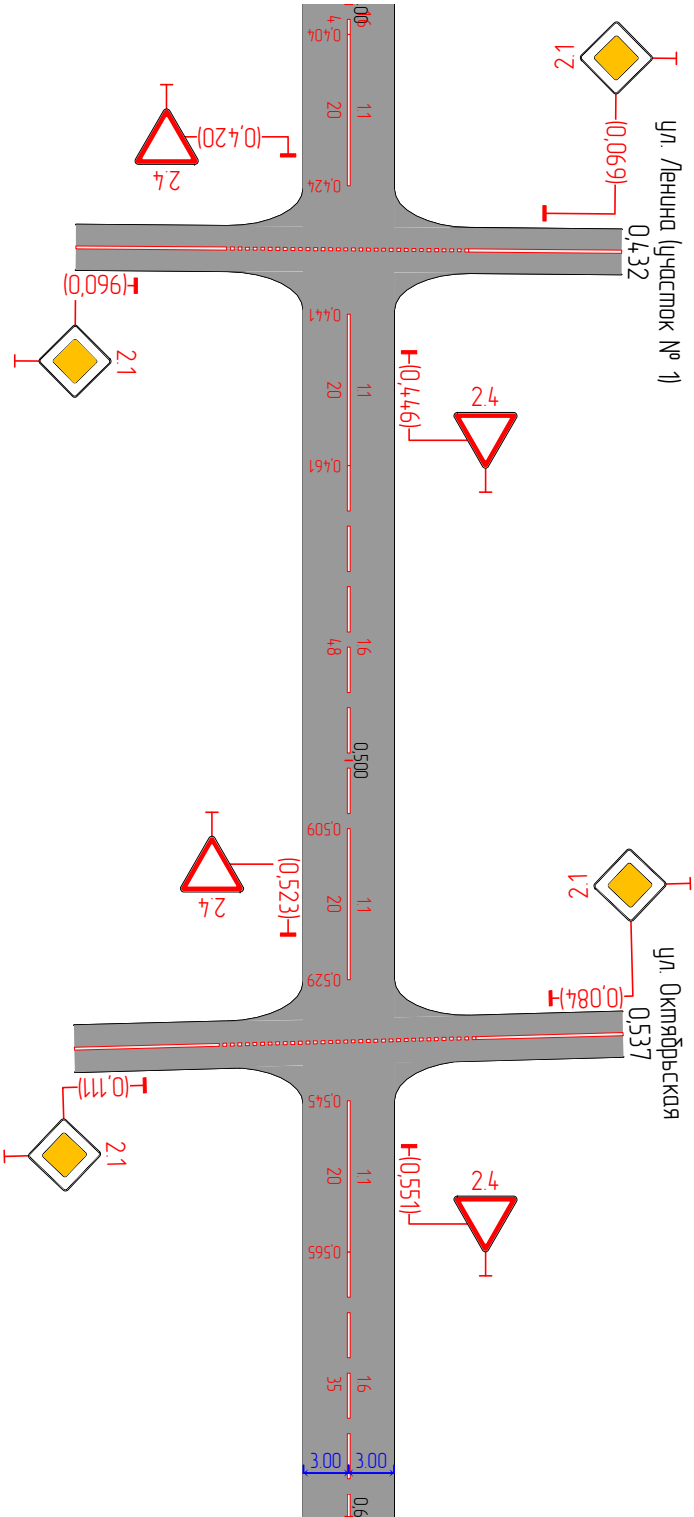

Дорожная разметка следа	16	11	16	11	16
Ширина следа, м	0,400 - 0,404	0,404 - 0,424	0,441 - 0,461	0,461 - 0,509	0,509 - 0,529
Проезжая часть	Звездные карманы				
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На раздельной полосе				
Дорожная разметка следа	На обочине				

Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине	
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Пионерский
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,600 – км 0,638

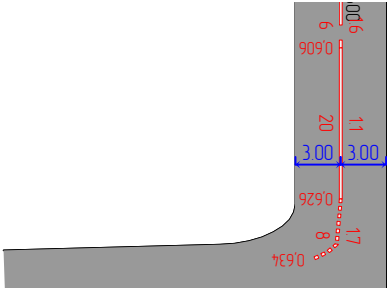


ул. Комсомольская
0,635
W = 6.0 м

Дорожная разметка следа	16 0.600 0.606	11 0.606 - 0.626 0.633	17
Ширина следа, м	Проезжая часть	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На разделительной	На обочине	


Звездные корданы	
Ширина следа, м	3,00 (всучит) 0,003 - 0,163
Проезжая часть	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	
На обочине	
На раздельной	
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Цаплинский
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,163

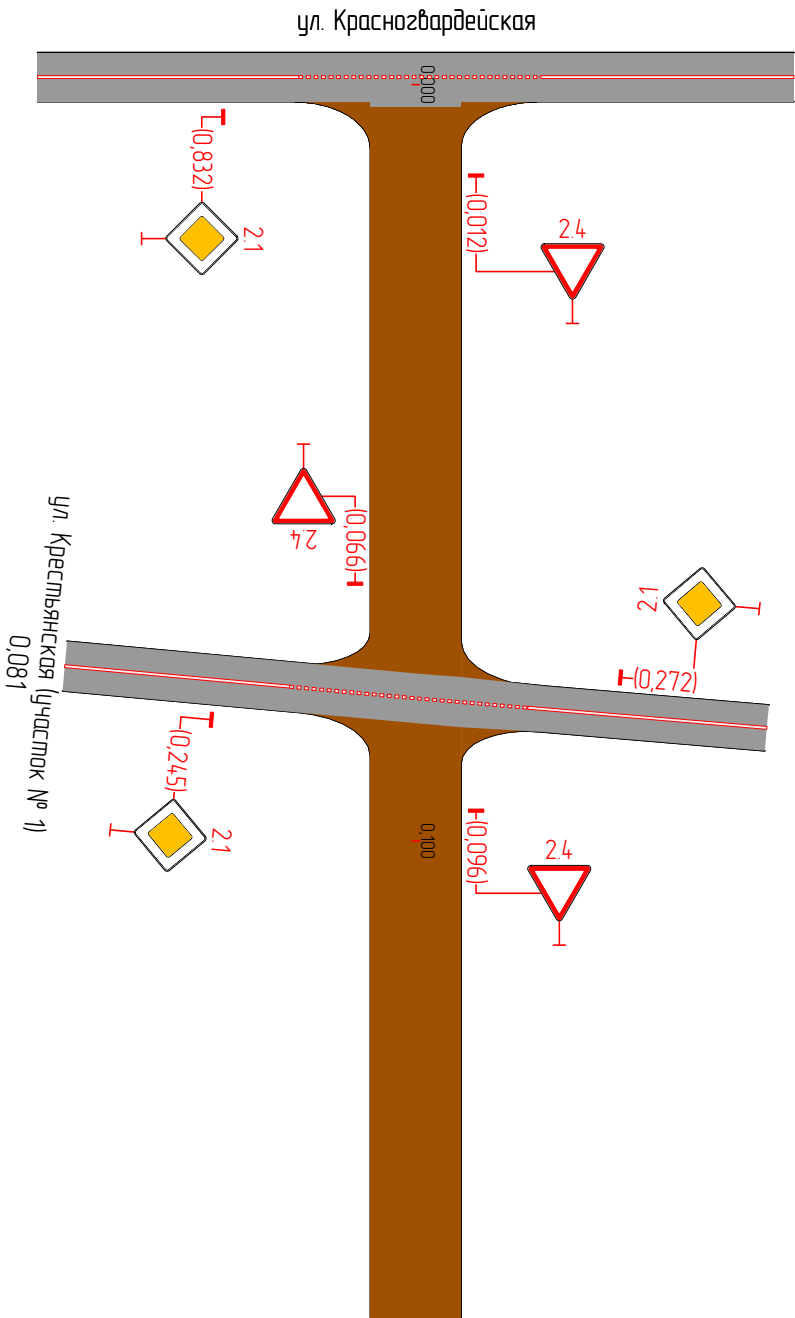

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	3,00 (всучит) 0,003 - 0,163
Проезжая часть	
Звездные корданы	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	
На обочине	
На раздельной	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Чапаева (участок №1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,150

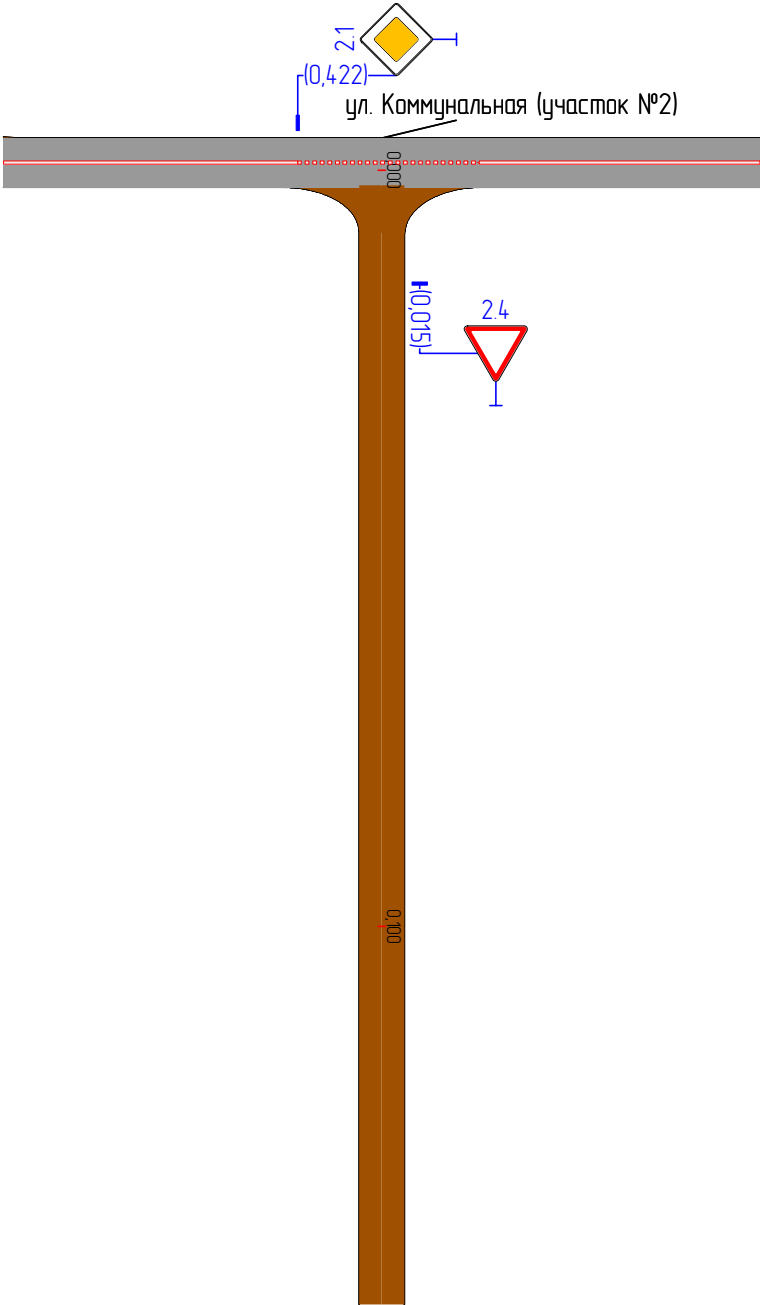

Дорожная разметка strada		
Ширина strada, м	Проезжая часть	15.0 / 20.0 0.002 - 0.150
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	Знаковые корданы	15.0 (сигнал) 0.002 - 0.150
	На раздельной	
На обочине		

Знаковые корданы	
Проезжая часть	15.0 / 20.0 0.002 - 0.150
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	
На обочине	
На раздельной	
Дорожная разметка strada	
Элементы в плане	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Чапаева (участок №1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,150 – км 0,350

Ширина следа, м	Зональные карманы	
	Проезжая часть	150 (горизонт) 0,150 - 0,350
Дорожные ограждения и надобновляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		



Дорожная разметка следа		150 (звигн) 0,150 - 0,350
Ширина следа, м	Проезжая часть Звездные карманы	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На раздельной	
	На обочине	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Чапаева (участок №1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,550 – км 0,750

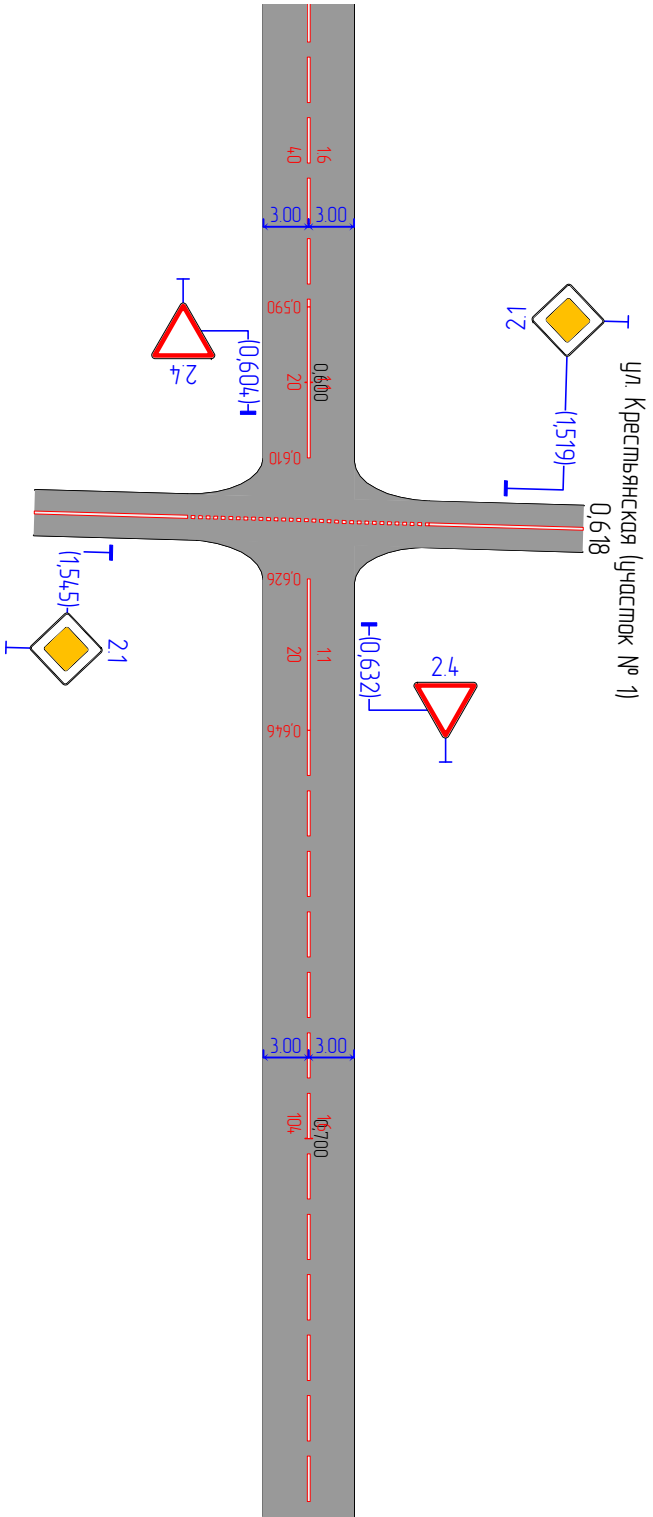


Элементы в плане	
Ширина следа, м	3,00 (в/б) 0,550 - 0,623
Поездная часть	3,00 (в/б) 0,623 - 0,750
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине
Дорожная разметка следа	На разделительной
Элементы в плане	

Дорожная разметка следа		16 0,550 - 0,590	11 0,590 - 0,610	11 0,626 - 0,646	16 0,646 - 0,750
Ширина следа, м	Поездная часть	3,00 (в/б) 0,550 - 0,623			3,00 (в/б) 0,623 - 0,750
Дорожные ограждения и дорожные устройства		Элементы в плане			
		На обочине			

Ширина следа, м	Звездные координаты	
Проезжая часть	3,00 (а/б)	0,750 - 0,778
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине	
Дорожная разметка следа	На разделительной	
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Чапаева (участок №1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,750 – км 0,950

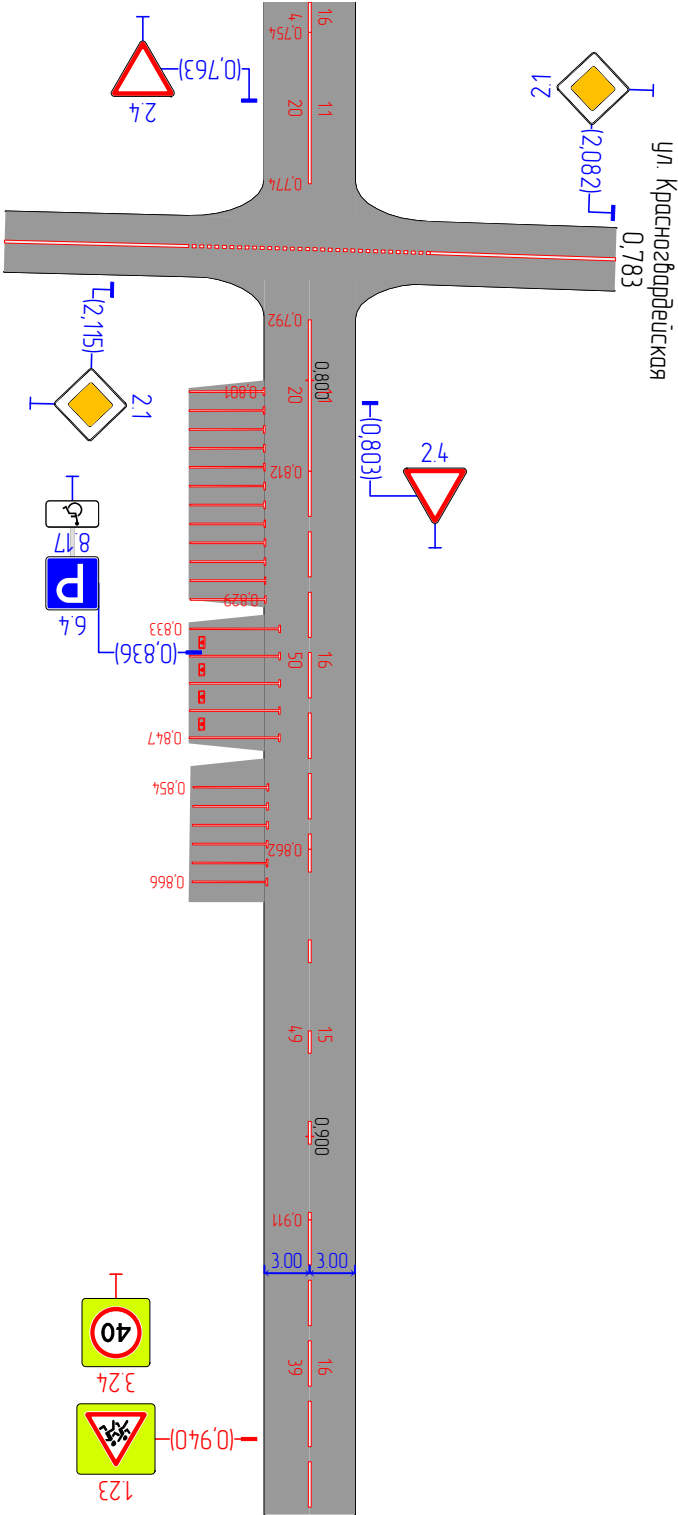

Дорожная разметка следа	16	11	11	16	15	16
	0,750 - 0,754	0,754 - 0,774		0,792 - 0,812	0,812 - 0,862	0,911 - 0,950
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (а/б)	0,750 - 0,778			
Дорожные ограждения и дорожные устройства	Звездные координаты					
	На разделительной					
	На обочине					


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Чапаева (участок №1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,950 – км 1,150

Ширина следа, м	Звездные короны
	3,00 (в/д) 0,950 – 1,150
Дорожные ограждения и дорожные устройства	Проезжая часть
	На обочине
Дорожная разметка	На разделительной полосе
	Элементы в плане

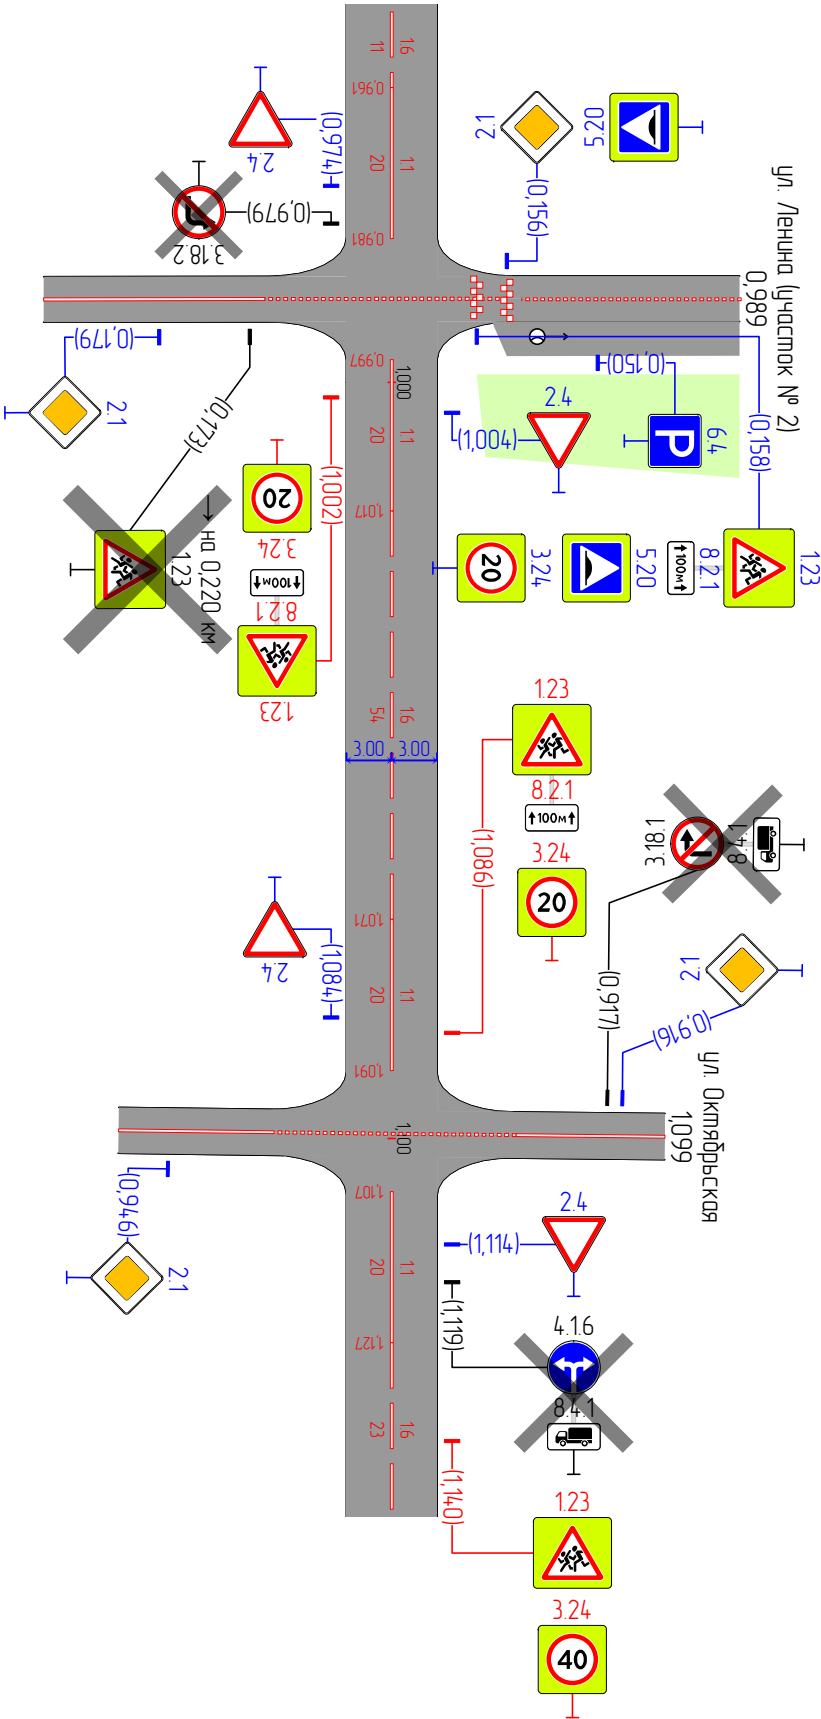

Дорожная разметка	Ширина следа, м					
	16 0,950 – 0,961	11 0,961 – 0,981	11 0,997 – 1,017	16 1,017 – 1,071	11 1,071 – 1,091	16 1,127 – 1,150
Ширина проезжей части, м	Звездные короны					
	3,00 (в/д) 0,950 – 1,150					
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На разделительной полосе					
	На обочине					


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Чапаева (участок №1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 1,350 – км 1,383

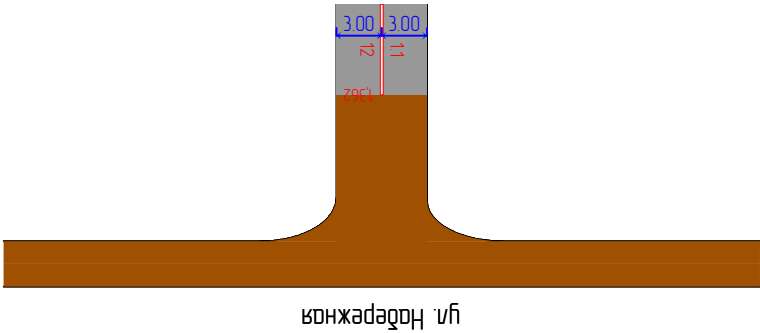

Ширина следа, м	Звездные корданы		
	Проезжая часть		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	3,00 (к/л)	3,00 (с/д/л)
	На разделительной	1,350 - 1,362	1,362 - 1,384
Дорожная разметка следа			
Элементы в плане			

Дорожная разметка следа		
	11	
Ширина следа, м	Проезжая часть	
	3,00 (к/л)	3,00 (с/д/л)
	1,350 - 1,362	1,362 - 1,384
Дорожные ограждения и дорожные устройства следа	Звездные корданы	
	На разделительной	
	На обочине	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Чапаева (участок №2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,043

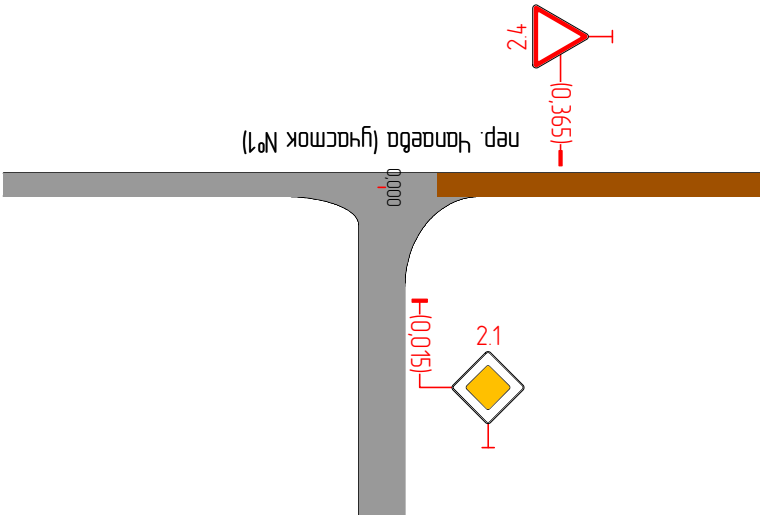

Ширина следа, м	Звездные корданы	
	Проезжая часть	150 км/ч 0,000 - 0,043
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	Проезжая часть
	150 м/80 0,000 - 0,043
Дорожные ограждения и дорожные устройства	Звездные корданы
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На раздельной полосе
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Чепрунова
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

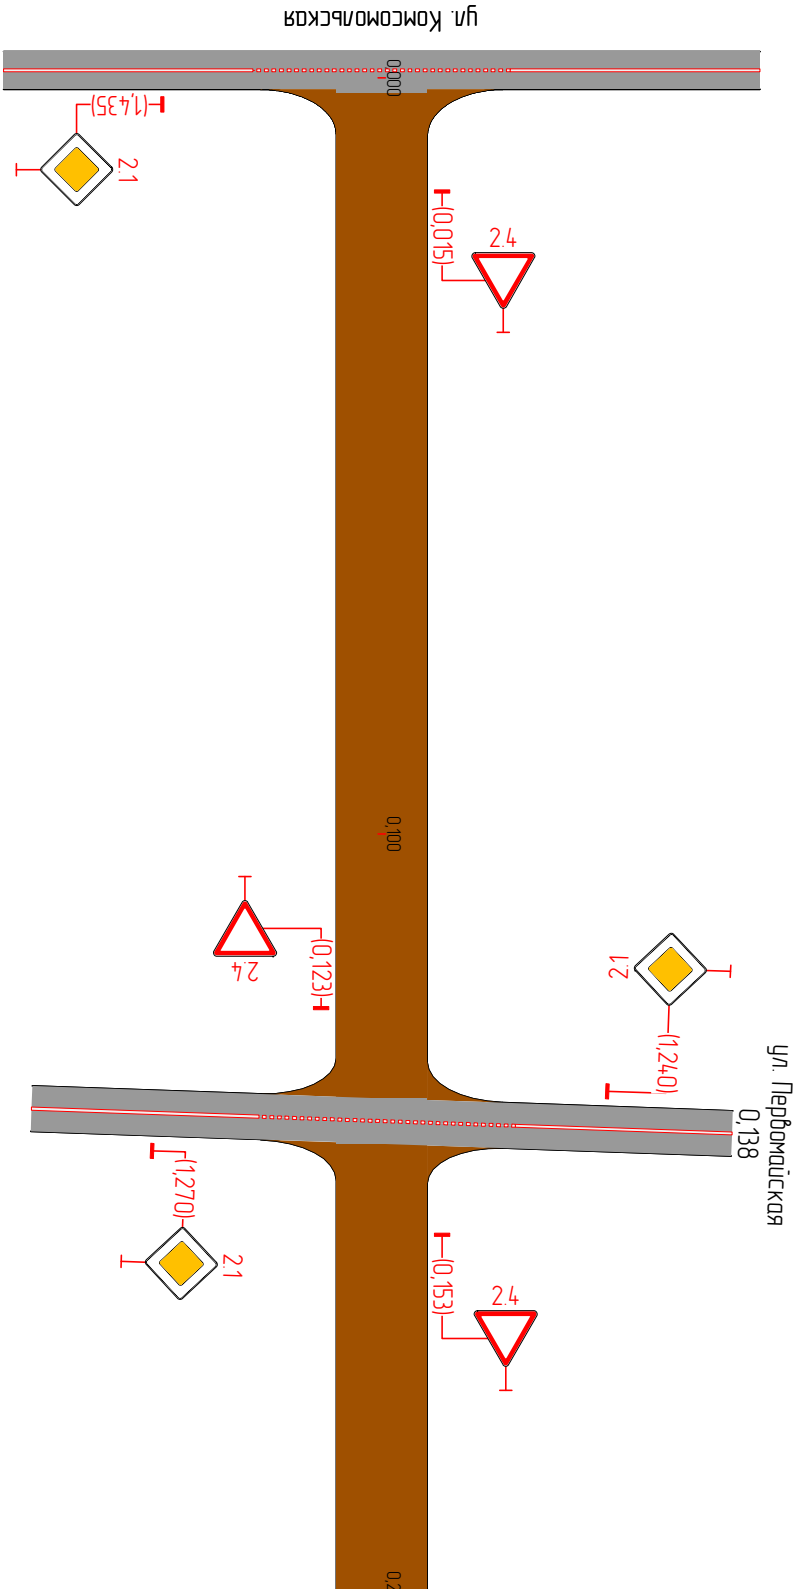

Звездные корданы	
Ширина следа, м	3 00 (всунт) 0,002 - 0,135
Проезжая часть	3 00 (всунт) 0,002 - 0,135
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	3 00 (всунт) 0,141 - 0,200
На обочине	
На разделительной	
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	3 00 (всунт) 0,002 - 0,135
Проезжая часть	3 00 (всунт) 0,002 - 0,135
Звездные корданы	3 00 (всунт) 0,141 - 0,200
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	
На обочине	
На разделительной	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Чепрунова
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,313

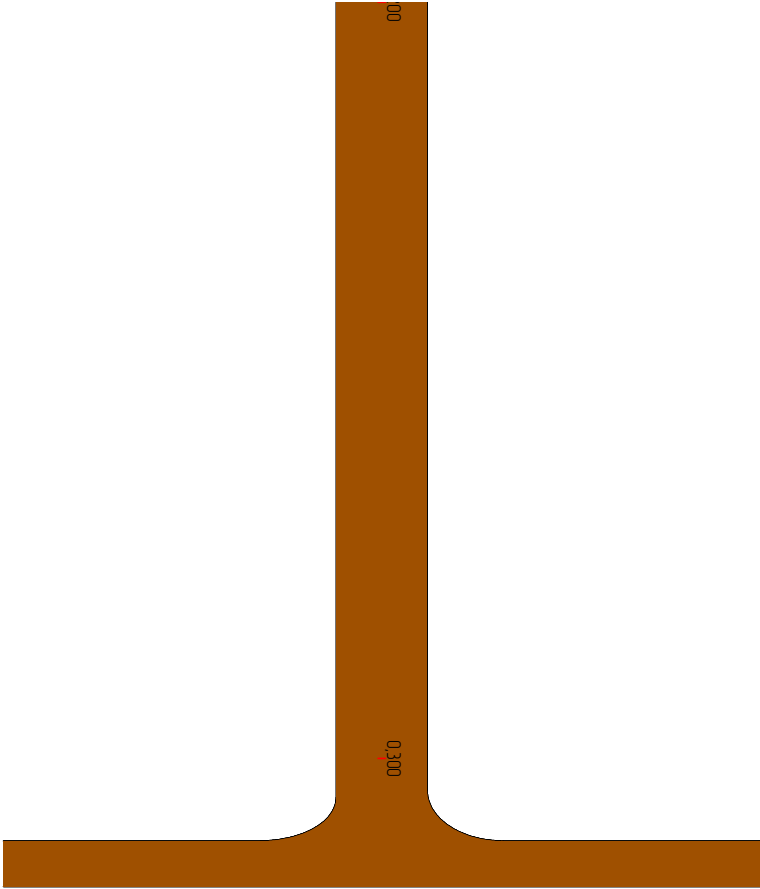


пер. Чепрунова (участок № 4)

Дорожная разметка strada		
Ширина strada, м	Проезжая часть	3.00 (сумм) 0.200 – 0.313
	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На раздельной	
	На обочине	

Ширина strada, м	Звездные карманы	3.00 (сумм) 0.200 – 0.313
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На обочине	
	На раздельной	
Дорожная разметка strada		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Шумейко
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,186

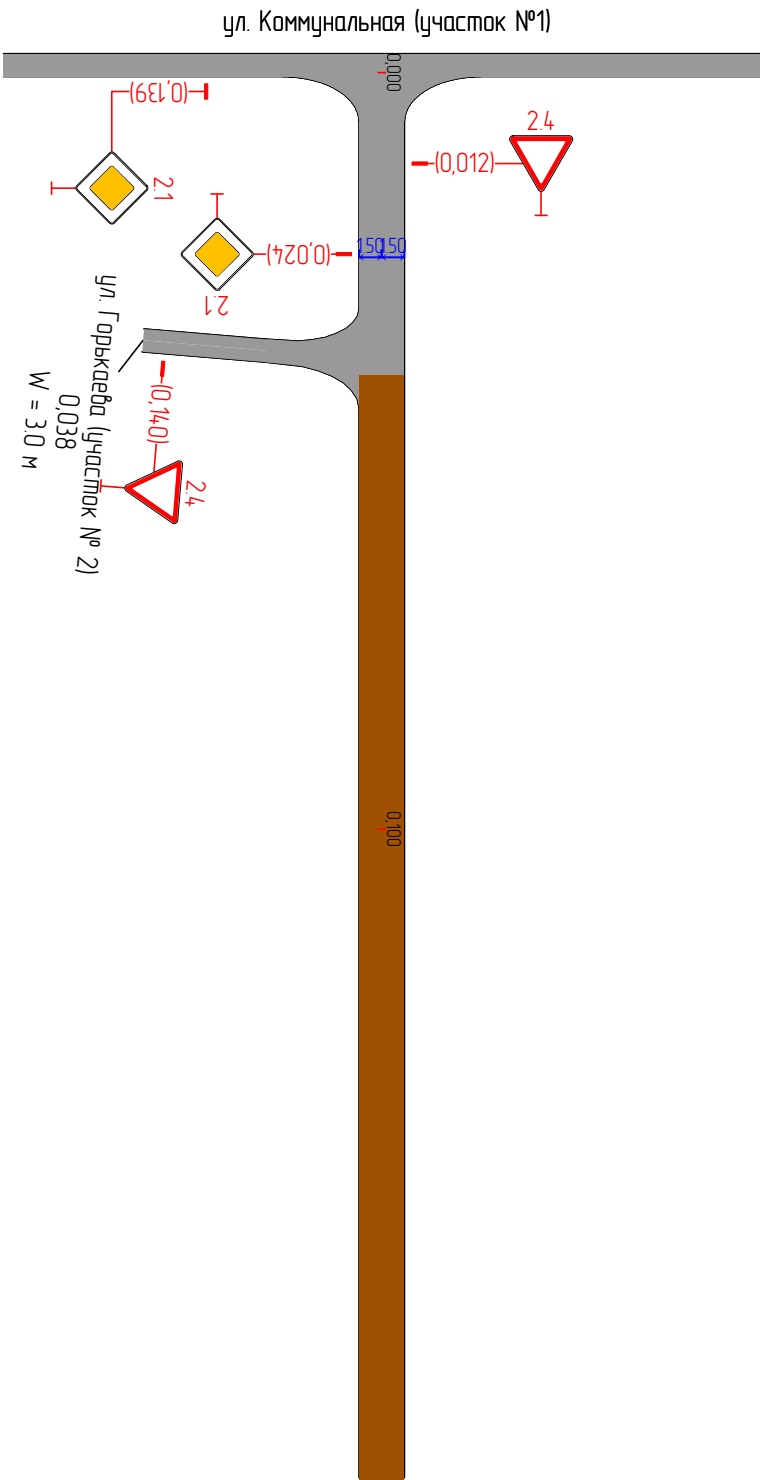

Дорожная разметка дороги			
Ширина дороги, м	Проезжая часть	150 (а/б) 0,000 - 0,040	150 (а/б) 0,040 - 0,186
	Зональные коридоры		
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На раздельном		
	На обочине		

Ширина дороги, м	Зональные коридоры		
	Проезжая часть	150 (а/б) 0,000 - 0,040	150 (а/б) 0,040 - 0,186
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На обочине		
	На раздельном		
Дорожная разметка дороги			
Элементы в плане			


Звездные карты	
Проезжая часть	3,00 (карты) 0,002 - 0,150
На обочине	
На разделительной устройстве	
Дорожная разметка	
Элементы в плане	

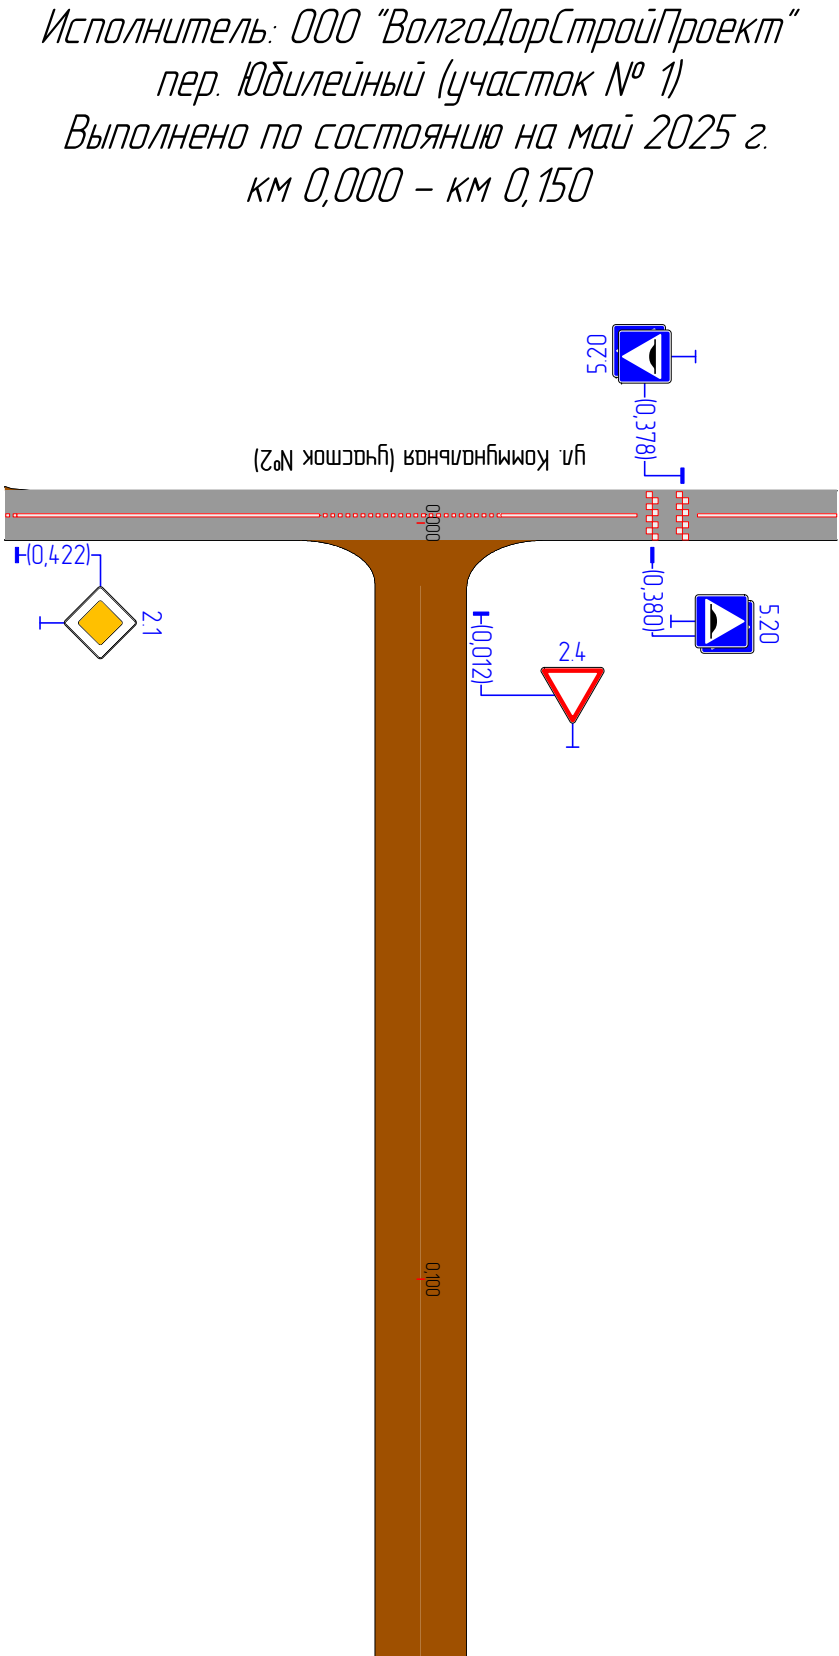

Дорожная разметка	
Проезжая часть	3,00 (карты) 0,002 - 0,150
Звездные карты	
На разделительной устройстве	
На обочине	


Знаковые картаны	
Ширина следа, м	3,00 (всунт) 0,150 - 0,350
Проезжая часть	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Юбилейный (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,150 – км 0,350

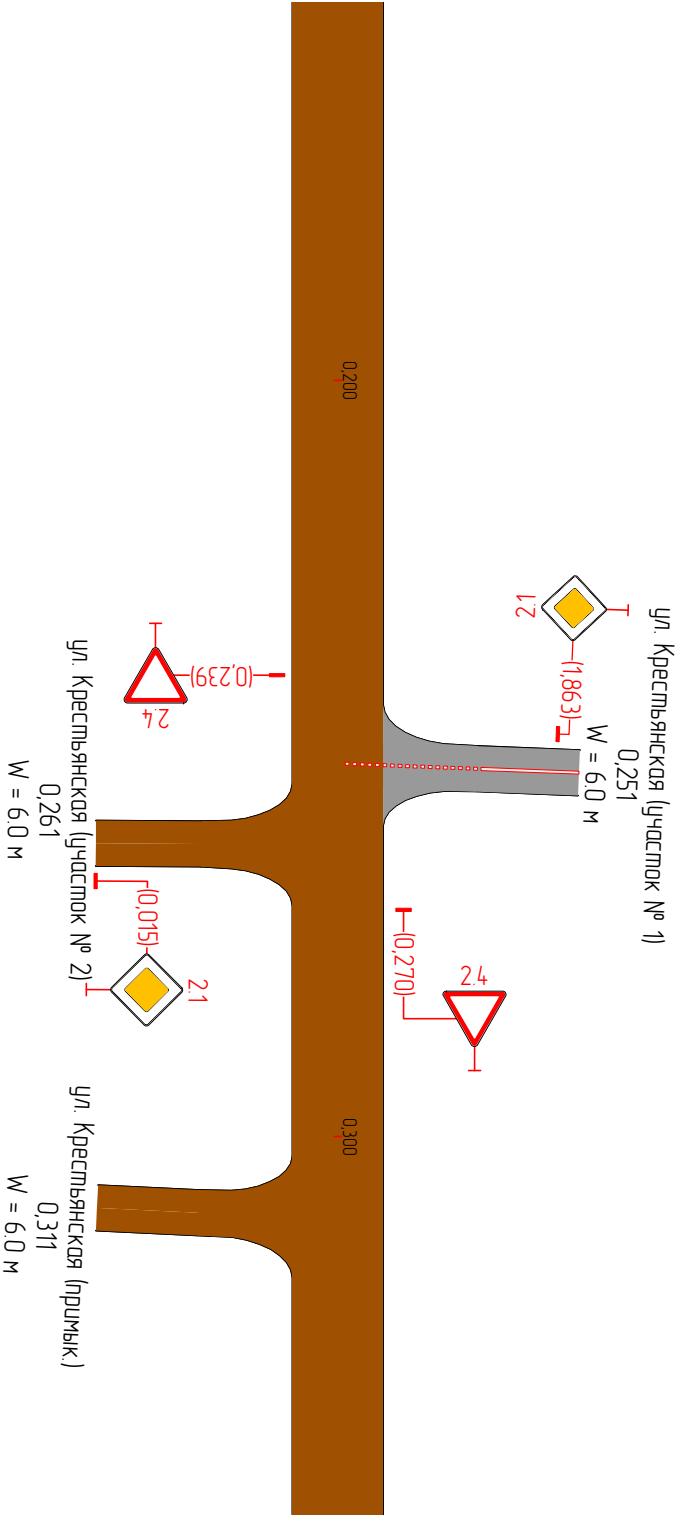

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	3,00 (всунт) 0,150 - 0,350
Проезжая часть	
Знаковые картаны	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Юбилейный (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,550 – км 0,746

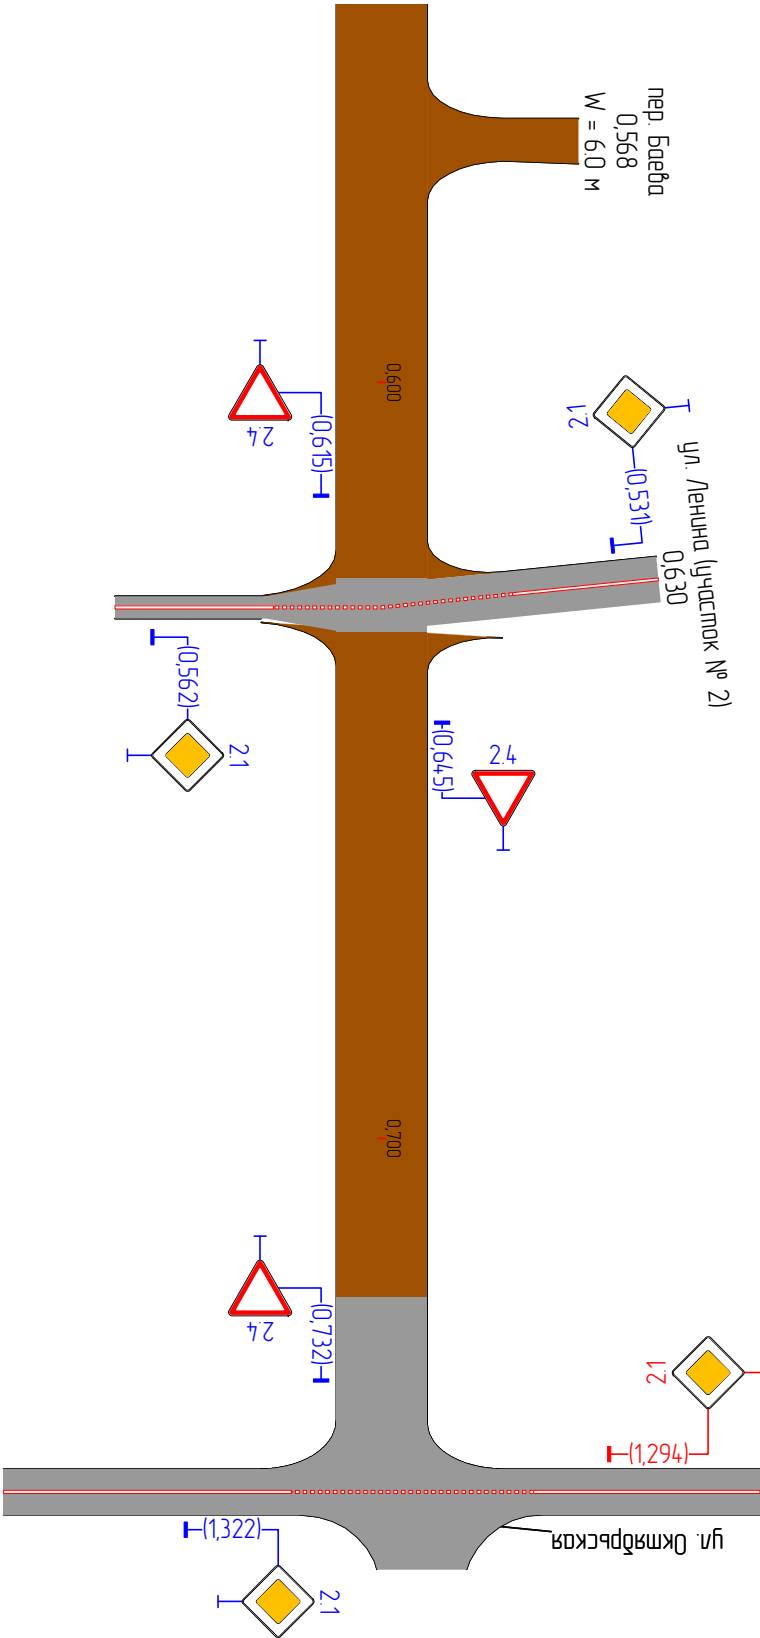

Знаковые корданы	Знаковые корданы	Знаковые корданы	Знаковые корданы
Проезжая часть 0.550 - 0.626	Проезжая часть 0.633 - 0.721	Проезжая часть 0.721 - 0.743	Проезжая часть 0.743 - 0.746
На обочине	На обочине	На обочине	На обочине
На разделительной устройстве	На разделительной устройстве	На разделительной устройстве	На разделительной устройстве
Дорожная разметка схема	Дорожная разметка схема	Дорожная разметка схема	Дорожная разметка схема
Элементы в плане	Элементы в плане	Элементы в плане	Элементы в плане

Дорожная разметка схема	Дорожная разметка схема	Дорожная разметка схема	Дорожная разметка схема
Проезжая часть 0.550 - 0.626	Проезжая часть 0.633 - 0.721	Проезжая часть 0.721 - 0.743	Проезжая часть 0.743 - 0.746
Знаковые корданы	Знаковые корданы	Знаковые корданы	Знаковые корданы
На обочине	На обочине	На обочине	На обочине
На разделительной устройстве	На разделительной устройстве	На разделительной устройстве	На разделительной устройстве
Дорожная разметка схема	Дорожная разметка схема	Дорожная разметка схема	Дорожная разметка схема
Элементы в плане	Элементы в плане	Элементы в плане	Элементы в плане


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Юбилейный (участок № 2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,104

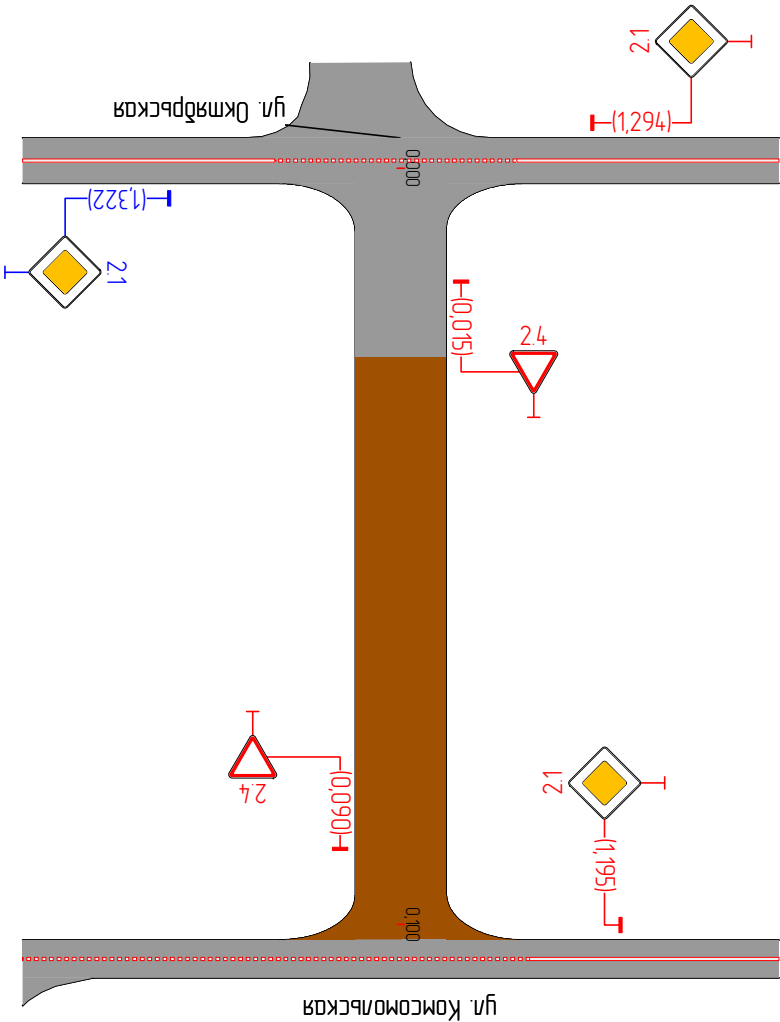

Дорожная разметка спора		
Ширина спора, м	Проезжая часть	Звездные карманы
3.00 м	3.00 м/д/0.002 - 0.025	3.00 м/д/0.025 - 0.102
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На раздельном	На обочине

Ширина спора, м	Звездные карманы	
3.00 м/д/0.002 - 0.025	3.00 м/д/0.025 - 0.102	
Дорожные ограждения и дорожные знаки	На раздельном	
Дорожная разметка спора	Элементы в плане	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Юбилейный (участок № 3)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,137

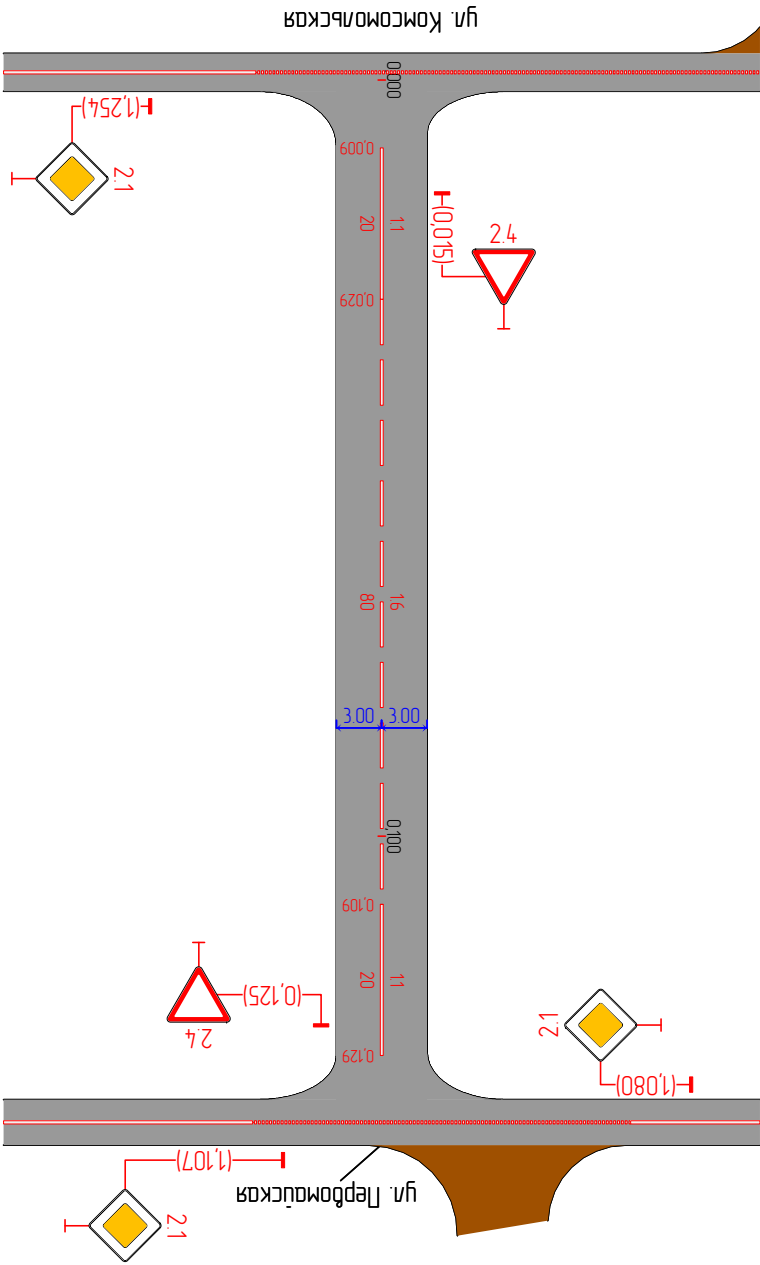

Дорожная разметка strada		11	16	11	
Ширина strada, м		0.009 - 0.029	0.029 - 0.109	0.109 - 0.129	
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	Проезжая часть	3.00 (4/8)			
	Знаковые коридоры	0.000 - 0.137			
На раздельном					
На обочине					

Знаковые коридоры	3.00 (4/8)
Проезжая часть	0.000 - 0.137
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	
На раздельном	
На обочине	
Дорожная разметка strada	
Элементы в плане	

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Юбилейный (участок № 4)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,150

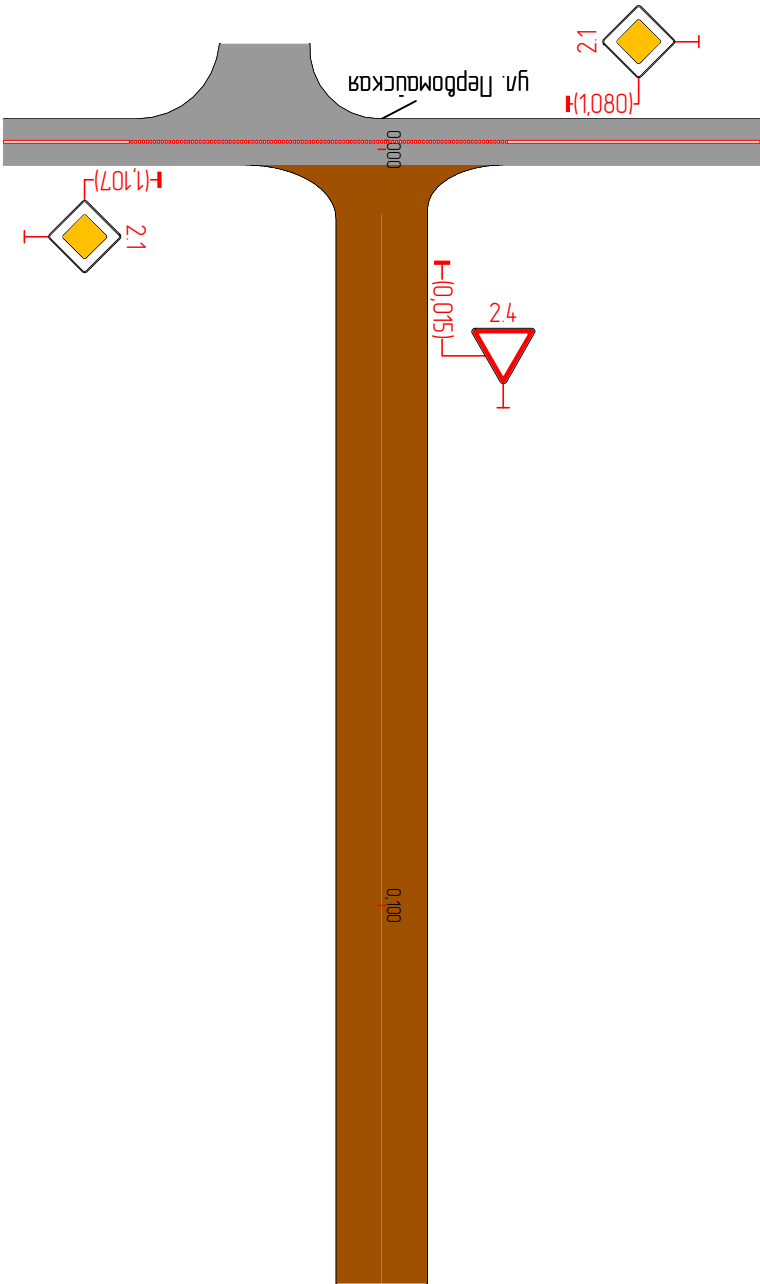


Дорожная разметка сплота		
Ширина сплота, м	Проезжая часть	3.00 (ср.пл.) 0.002 - 0.150
Дорожные ограждения и дорожные устройства сплота	Знаковые	
	На раздельном	
На обочине		

Ширина сплота, м	Знаковые	
Дорожные ограждения и дорожные устройства сплота	Проезжая часть	3.00 (ср.пл.) 0.002 - 0.150
	На обочине	
Дорожная разметка сплота		
Элементы в плане		

Ширина следа, м	Звездные координаты	
Проезжая часть	300 (вдоль)	
Дорожные ограждения и дорожные устройства	0,60 - 0,392	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Юбилейный (участок № 4)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,150 – км 0,391

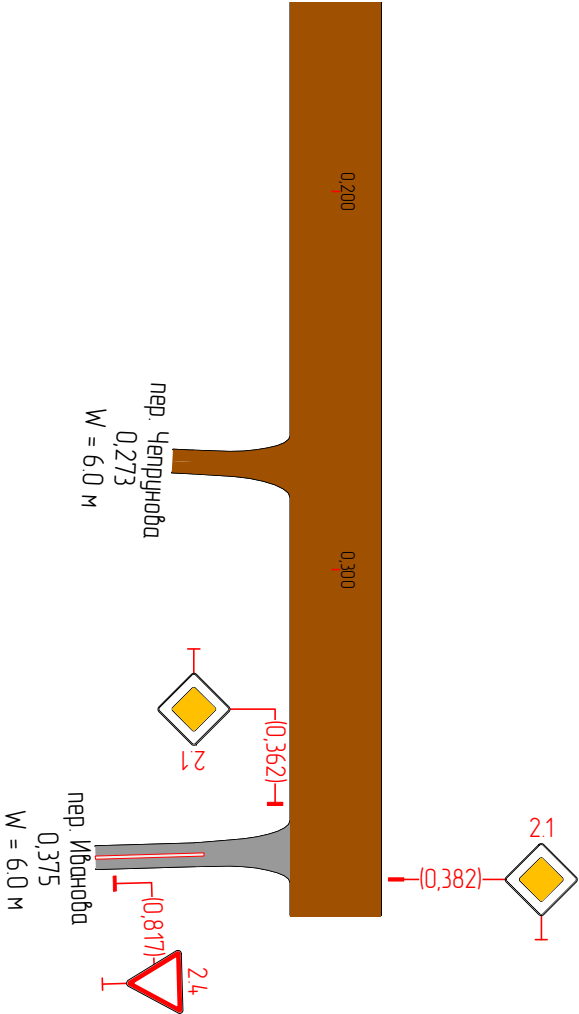

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	Проезжая часть
Дорожные ограждения и дорожные устройства	Звездные координаты
На обочине	На раздельном


Звездные карманы			
Ширина следа, м	Проезжая часть	2,25 (а/дн) 0,000 - 0,033	2,25 (а/дн) 0,033 - 0,160
Дорожные ограждения и дорожные устройства			
Дорожная разметка следа			
Элементы в плане			

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Советский (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,160

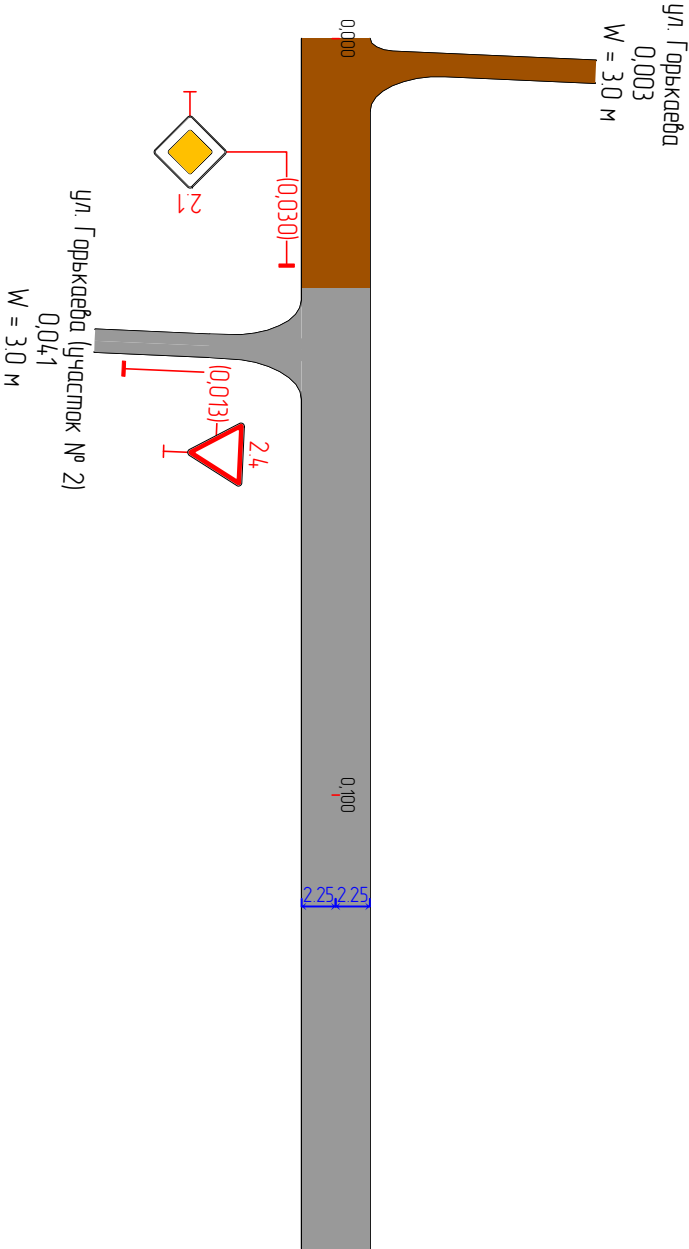

Дорожная разметка следа			
Ширина следа, м	Проезжая часть	2,25 (а/дн) 0,000 - 0,033	2,25 (а/дн) 0,033 - 0,160
Дорожные ограждения и дорожные устройства			
Дорожная разметка следа			
Элементы в плане			


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Советский (участок № 2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,148 – км 0,350

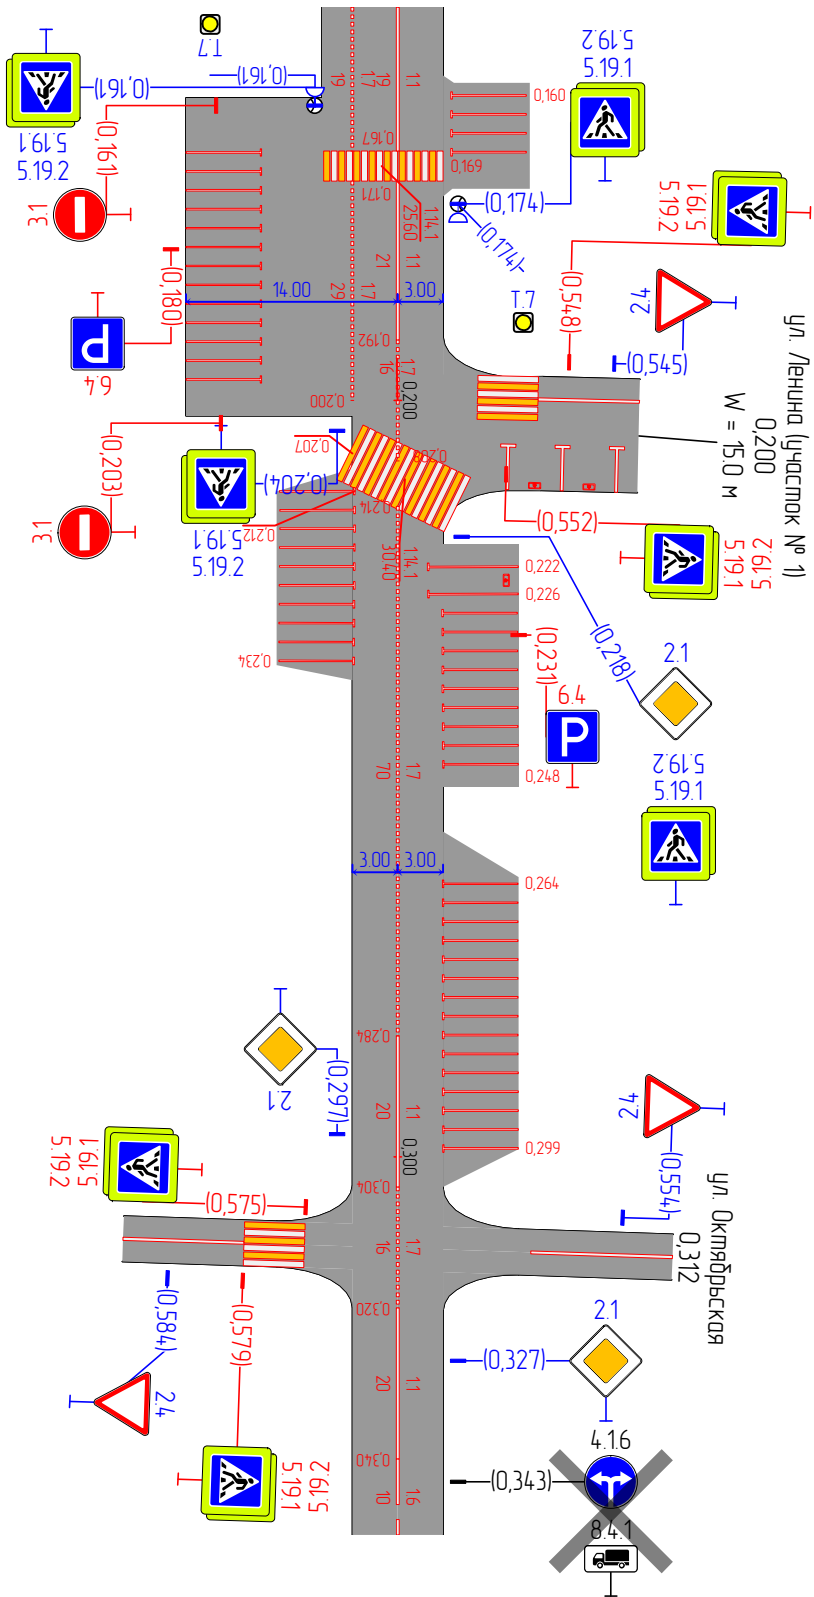

Дорожная разметка спланда	17		11 17	17		17	11	17	11	16
	0,148 - 0,167		0,170-0,190, 200	0,192 - 0,208		0,214 - 0,284	0,284 - 0,304	0,304 - 0,320	0,320 - 0,340	0,340 - 0,350
Ширина спланда м	Проезжая часть				3,00 (а/б)					
	5,00 (а/б) 0,148 - 0,160	14,00 (а/б) 0,160 - 0,202			0,202 - 0,350					
Дорожные ограждения и направляющие устройства спланда										
	На раздельной									
	На обочине									

Ширина спланда		Зеленые	Коричневые		
3,00 (а/б)		0,160 - 0,202	0,202 - 0,350		
Дорожные ограждения и дорожные устройства спланда		На раздельной	На обочине		
Дорожная разметка спланда					
Элементы в плане					

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Зеленый (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,200

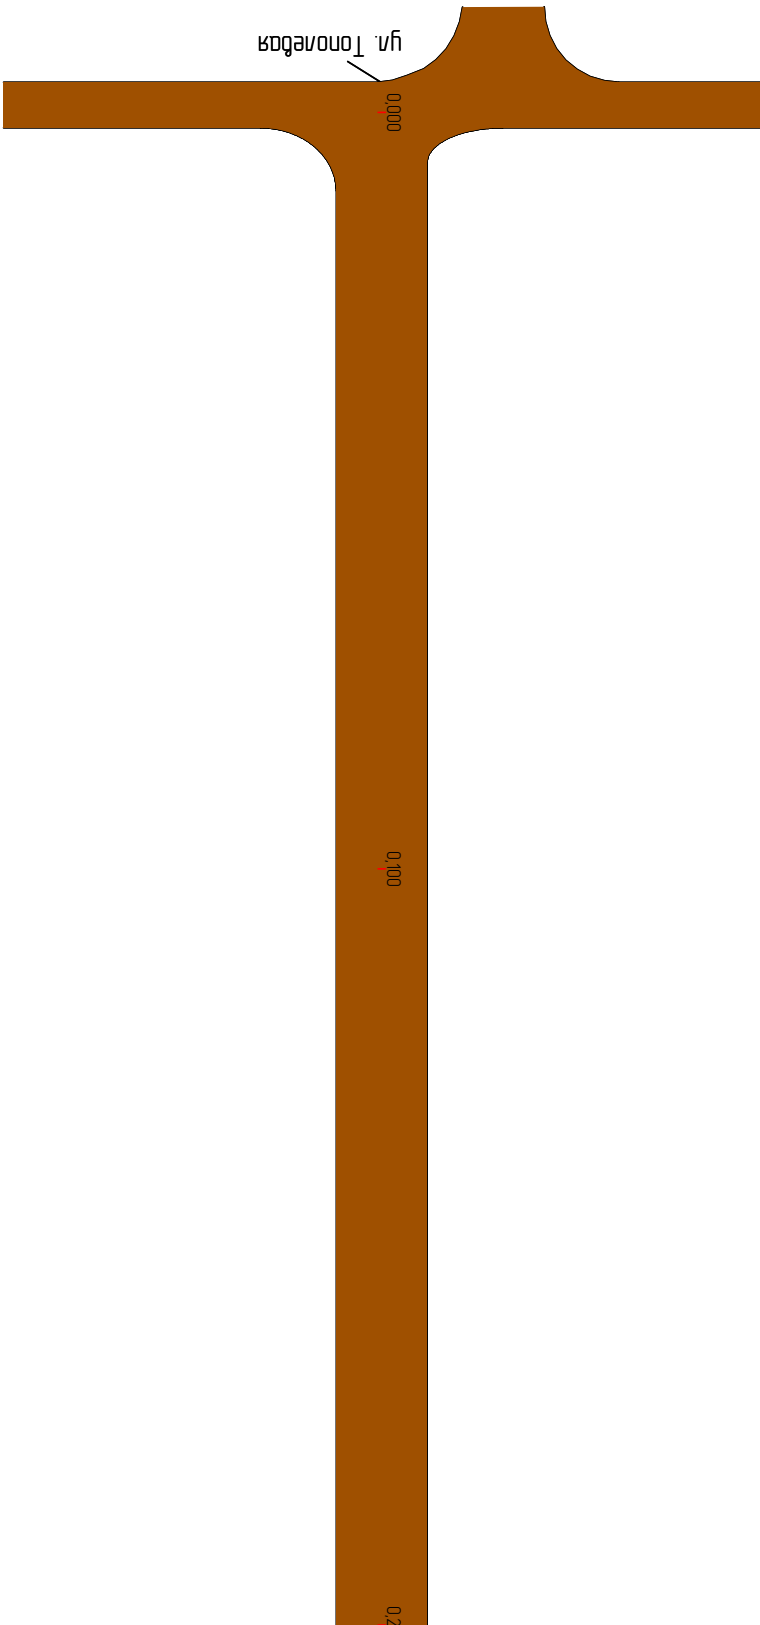


Ширина следа, м	Звездные корданы	
	Проезжая часть	
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине	3,00 (вдоль) 0,000 - 0,200
	На раздельной части	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		

Дорожная разметка следа		
Ширина следа, м	Проезжая часть	
	Звездные корданы	3,00 (вдоль) 0,000 - 0,200
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На раздельной части	
	На обочине	

Звездные карманы	
Ширина следа, м	Проезжая часть 3,00 (всего) 0,200 - 0,400
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине
Дорожная разметка следа	На разделительной
Элементы в плане	


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Зеленый (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,200 – км 0,400

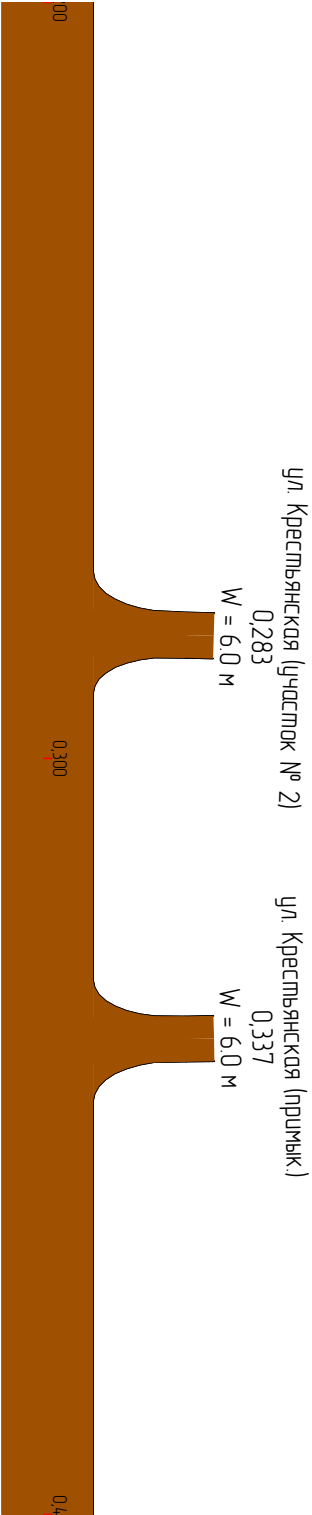

Дорожная разметка следа	
Ширина следа, м	Проезжая часть 3,00 (всего) 0,200 - 0,400
Дорожные ограждения и дорожные устройства	Звездные карманы
	На разделительной
	На обочине


Ширина следа, м	Звездные карманы	
Дорожные ограждения и дорожные устройства	На обочине	
Дорожная разметка следа	На разделительной полосе	
Элементы в плане		

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Зеленый (участок № 1)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,400 – км 0,446

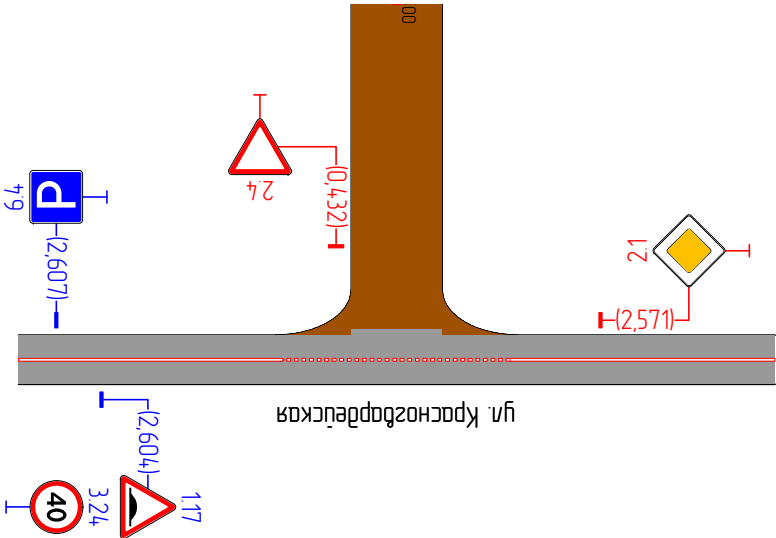

Дорожная разметка следа			
Ширина следа, м	Проезжая часть	3,00 (всего) 0,400 – 0,443	
	Звездочные карманы		
	На разделительной		
	На обочине		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Зеленый (участок № 2)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,204

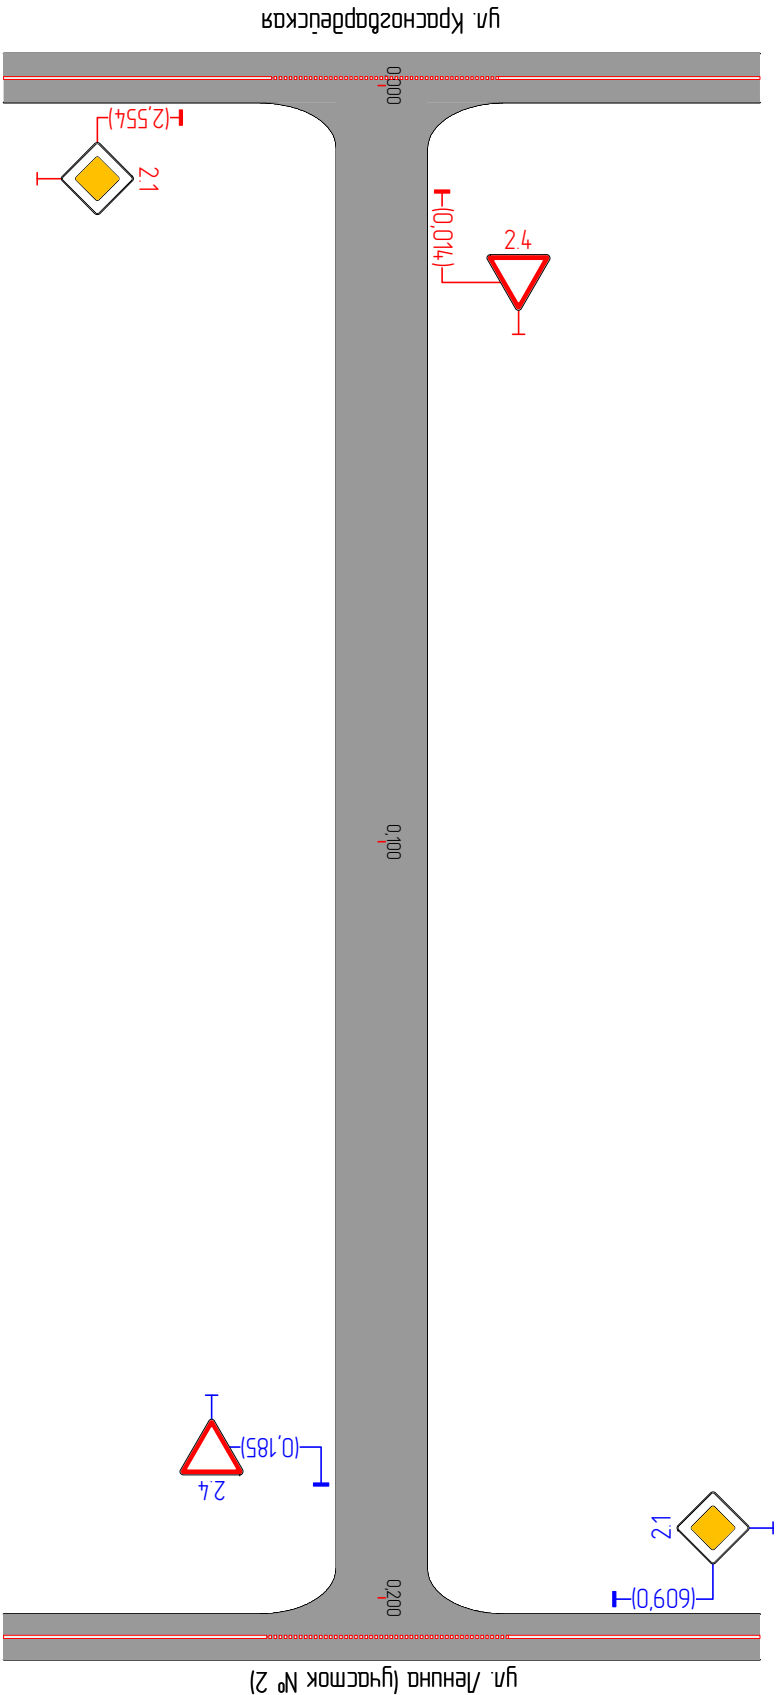

Дорожная разметка strada		
Ширина strada, м	Проезжая часть	3.00 (а/б) 0.003 - 0.202
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	Зеленые короны	
	На раздельной	
На обочине		

Ширина strada, м	Зеленые короны	3.00 (а/б) 0.003 - 0.202
Дорожные ограждения и дорожные устройства strada	На обочине	
	На раздельной	
Дорожная разметка strada		
Элементы в плане		


Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Зеленый (участок № 3)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,000 – км 0,150

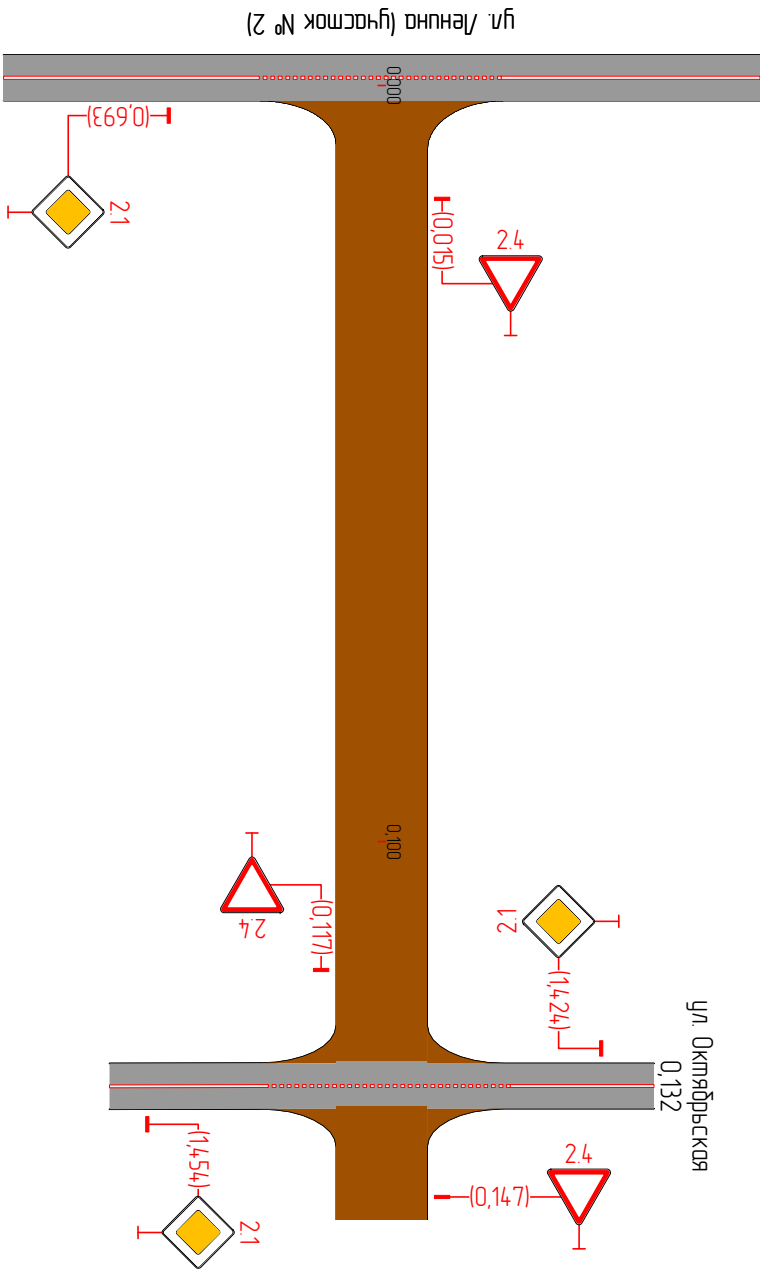

Звездные карты	Звездные карты
Проездная часть	Проездная часть
На обочине	На обочине
На разделительной полосе	На разделительной полосе
Дорожная разметка светофора	Дорожная разметка светофора
Элементы в плане	Элементы в плане

Дорожная разметка светофора	Дорожная разметка светофора
Проездная часть	Проездная часть
На обочине	На обочине
На разделительной полосе	На разделительной полосе
Дорожная разметка светофора	Дорожная разметка светофора
Элементы в плане	Элементы в плане

Исполнитель: ООО "ВолгоДорСтройПроект"
пер. Зеленый (участок № 3)
Выполнено по состоянию на май 2025 г.
км 0,150 – км 0,245

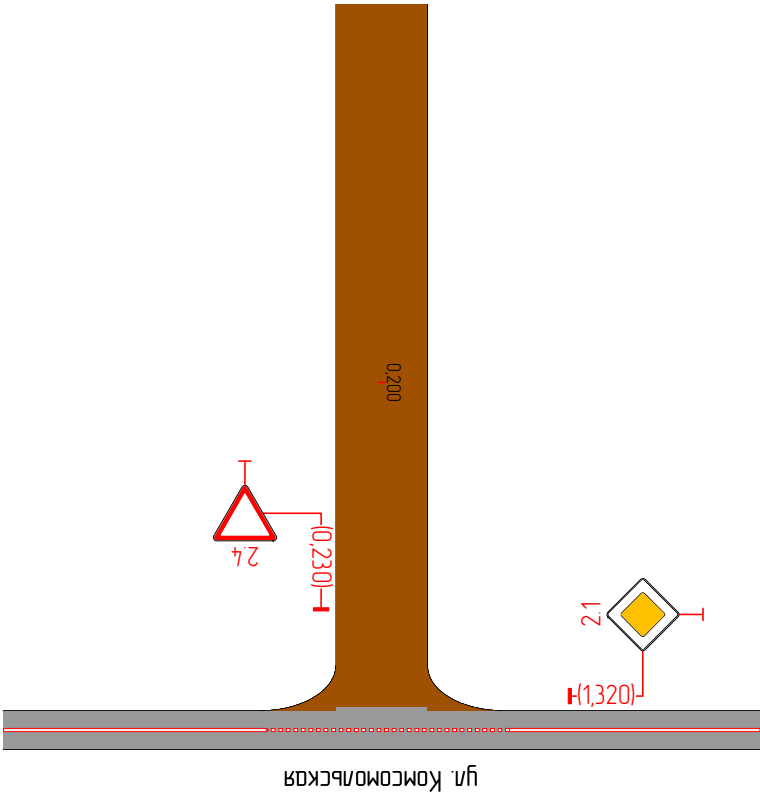

Звездные карты	
Проезжая часть	3 00 (ручн) 0,150 – 0,243
На обочине	
На раздельной устойчивости следа	
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	

Дорожная разметка следа	
Проезжая часть	3 00 (ручн) 0,150 – 0,243
Звездные карты	
На раздельной устойчивости следа	
На обочине	

7. Приложения

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Красногвардейская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.538	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.544	Требуется установка	1	Примыкание слева "Подъезд к кладбищу № 1" на 0.548
2.1	Главная дорога	II		0.617	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.832	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.973	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.111	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.141	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.230	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.274	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.321	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1.331	Требуется установка	1	Примыкание слева "пер. Макарова" на 1.335
2.4	Уступите дорогу	II		1.339	Требуется установка	1	Примыкание справа "пер. Макарова" на 1.335
2.1	Главная дорога	II		1.348	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.402	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.430	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.574	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.601	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.695	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.776	Установлен	1	Слева

2.1	Главная дорога	II			1.836	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II			1.852	Требуется установка	1	Примыкание справа "Внутриквартальный проезд № 1" на 1.849
2.1	Главная дорога	II			1.926	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II			1.965	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II			2.082	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II			2.115	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II			2.144	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II			2.249	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II			2.270	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II			2.435	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II			2.462	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II			2.554	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II			2.571	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II			2.665	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II			2.805	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II			2.830	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II			2.973	Требуется установка	1	Примыкание слева "пер. Иванова" на 2.989
2.1	Главная дорога	II			3.003	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II			3.089	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II			3.481	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II			3.517	Требуется установка	1	Примыкание слева "ул. Красногвардейская" на 3.518
2.1	Главная дорога	II			3.533	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II			3.672	Установлен	1	Слева

		Итого установлено:		20	
		Итого требуется установить:		22	
		Итого перенести:		0	
		Итого к демонтажу:		0	
		Итого требуется замена:		0	
		Итого:		42	

Предупреждающие знаки

1.17	Искусственная неровность	II		0.561	К демонтажу Перенести на 0.640 км	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0.640	Требуется установка Перенести с 0.561 км	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0.749	Установлен	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		1.096	Установлен	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		1.216	Установлен	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		2.431	Установлен	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		2.604	Установлен	1	Слева
		Итого установлено:		5			
		Итого требуется установить:		0			
		Итого перенести:		1			
		Итого к демонтажу:		0			
		Итого требуется замена:		0			
		Итого:		7			

Предписывающие знаки

4.1.6	Движение направо или налево	II		2.270	Установлен	1	Слева
		Итого установлено:		1			
		Итого требуется установить:		0			
		Итого перенести:		0			
		Итого к демонтажу:		0			
		Итого требуется замена:		0			
		Итого:		1			

Знаки особых предписаний

5.23.1	Начало населённого пункта		1.35	0.442	Установлен	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		1.35	0.442	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.695	Установлен	1	Справа

5.20	Искусственная неровность	II			0.695	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II			0.697	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II			0.697	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II			1.169	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II			1.171	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II			1.171	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.221	К демонтажу	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.221	К демонтажу	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.230	К демонтажу	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.230	К демонтажу	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.244	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.244	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.248	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.248	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.695	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.695	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.725	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.725	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.843	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.843	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.853	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.853	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.926	Установлен	1	На разделительной
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.926	Установлен	1	На разделительной
5.19.1	Пешеходный переход	II			1.936	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			1.936	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II			2.000	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II			2.000	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II			2.032	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			2.032	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II			2.123	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II			2.123	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II			2.135	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			2.135	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II			2.512	Установлен	1	Справа

5.20	Искусственная неровность	II		2.512	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		2.514	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		2.514	Установлен	1	Слева
Итого установлено:							37
Итого требуется установить:							0
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							4
Итого требуется замена:							0
Итого:							41

Запрещающие знаки

3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.561	К демонтажу Перенести на 0.640 км	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.640	Требуется установка Перенести с 0.561 км	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.749	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		1.096	Установлен	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		1.216	Установлен	1	Слева
3.2	Движение запрещено	II		1.772	Установлен	1	Справа
3.2	Движение запрещено	II		1.935	Установлен	1	Слева
3.4 (8)	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		2.243	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2.431	Установлен	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		2.604	Установлен	1	Слева
Итого установлено:							7
Итого требуется установить:							1
Итого перенести:							1
Итого к демонтажу:							0
Итого требуется замена:							0
Итого:							10

Информационные знаки

6.22	Фотофиксация	II		0.442	Установлен	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II		1.736	Установлен	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II		1.803	Установлен	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II		2.607	Установлен	1	Справа

Итого установлено:				4	
Итого требуется установить:				0	
Итого перенести:				0	
Итого к демонтажу:				0	
Итого требуется замена:				0	
Итого:				4	
Знаки сервиса					
7.13 (полиция)	Полиция	II	0.624	Установлен	1
Итого установлено:				1	Справа
Итого требуется установить:				0	
Итого перенести:				0	
Итого к демонтажу:				0	
Итого требуется замена:				0	
Итого:				1	
Знаки дополнительной информации (таблички)					
8.17	Инвалиды	II	1.736	Установлен	1
8.5.2	Рабочие дни	II	1.772	Установлен	1
8.5.7 (пятница)	Время действия	II	1.772	Установлен	1
8.17	Инвалиды	II	1.803	Требуется установка	1
8.5.2	Рабочие дни	II	1.935	Установлен	1
8.5.7 (пятница)	Время действия	II	1.935	Установлен	1
8.13	Направление главной дороги	II	2.249	Установлен	1
8.4.1	Вид транспортного средства	II	2.270	Требуется установка	1
8.13	Направление главной дороги	II	2.270	Требуется установка	1
Итого установлено:				6	
Итого требуется установить:				3	
Итого перенести:				0	
Итого к демонтажу:				0	
Итого требуется замена:				0	
Итого:				9	

	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	81	
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	26	
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	2	
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	4	
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
	ВСЕГО:	115	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Комсомольская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.132	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.160	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.314	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.340	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.448	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите Дорогу	II		0.478	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.644	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.670	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.815	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.845	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.969	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.996	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.195	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.254	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.320	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.435	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1.525	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						10	
Итого требуется установить:						7	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						17	
Предписывающие знаки							

4.1.6	Движение направо или налево	II		0.996	Требуется установка	1	Слева
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.469	Требуется установка	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.469	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.473	Требуется установка	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.473	Требуется установка	1	Слева
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	4	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	4	
Запрещающие знаки							
3.4 (8)	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0.969	Требуется установка	1	Слева
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.996	Требуется установка	1	Слева

Итого установлено:	0	
Итого требуется установить:	1	
Итого перенести:	0	
Итого к демонтажу:	0	
Итого требуется замена:	0	
Итого:	1	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	10	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
ВСЕГО:	24	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Лесная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.217	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.247	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.379	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.443	Требуется установка	1	Примыкание слева "ул. Мелиораторов" на 0.444
2.1	Главная дорога	II		0.459	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.517	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.847	Установлен	1	Справа
Итого установлено:						4	
Итого требуется установить:						4	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						8	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						4	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						4	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						8	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Луговая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.050	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.068	Требуется установка	1	Примыкание справа "ул. Луговая" на 0.065
Итого установлено:						1	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						3	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						1	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						2	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						3	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Мелиораторов

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.286	Требуется установка	1	Справа
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	2	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	2	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	2	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Озерная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Установлен	1	Слева
					Итого установлено:	1	
					Итого требуется установить:	0	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	0	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	1	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Октябрьская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.084	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.111	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.235	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.262	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.413	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.440	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.554	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.584	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.751	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.777	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.916	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.946	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1.071	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1.098	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.294	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.322	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.424	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.454	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1.636	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1.659	Требуется установка	1	Слева

Итого установлено:				11	
Итого требуется установить:				9	
Итого перенести:				0	
Итого к демонтажу:				0	
Итого требуется замена:				0	
Итого:				20	
Предписывающие знаки					
4.1.6	Движение направо или налево	II	1.098	Требуется установка	1 Слева
Итого установлено:				0	
Итого требуется установить:				1	
Итого перенести:				0	
Итого к демонтажу:				0	
Итого требуется замена:				0	
Итого:				1	
Знаки особых предписаний					
5.19.1	Пешеходный переход	II	0.575	Требуется установка	1 Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	0.575	Требуется установка	1 Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	0.579	Требуется установка	1 Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	0.579	Требуется установка	1 Слева
Итого установлено:				0	
Итого требуется установить:				4	
Итого перенести:				0	
Итого к демонтажу:				0	
Итого требуется замена:				0	
Итого:				4	
Запрещающие знаки					
3.28	Стоянка запрещена	II	0.514	Установлен	1 Слева
3.18.1	Поворот направо запрещён	II	0.533	К демонтажу	1 Справа
3.18.2	Поворот налево запрещён	II	0.597	К демонтажу	1 Слева
3.18.1	Поворот направо запрещён	II	0.746	К демонтажу	1 Справа
3.28	Стоянка запрещена	II	0.773	К демонтажу	1 Справа
3.18.2	Поворот налево запрещён	II	0.774	К демонтажу	1 Слева
3.18.1	Поворот направо запрещён	II	0.917	К демонтажу	1 Справа

3.4 (8)	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		1.071	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:							1
Итого требуется установить:							1
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							6
Итого требуется замена:							0
Итого:							8
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.0	Нестандартная табличка	II		0.514	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (20м)	Зона действия	II		0.514	Требуется установка	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.533	К демонтажу	1	Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.746	К демонтажу	1	Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.774	К демонтажу	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.917	К демонтажу	1	Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		1.098	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:							0
Итого требуется установить:							3
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							4
Итого требуется замена:							0
Итого:							7
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:							12
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:							18
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:							0
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:							10
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:							0
ВСЕГО:							40

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Первомайская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.170	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.196	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.296	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.327	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.491	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.519	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.670	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.700	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.823	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.850	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.975	Требуется установка	1	Примыкание слева "пер. Блинова" на 0.979
2.1	Главная дорога	II		0.994	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.080	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.107	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.240	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.270	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1.350	Требуется установка	1	Справа

Итого установлено:				8		
Итого требуется установить:				10		
Итого перенести:				0		
Итого к демонтажу:				0		
Итого требуется замена:				0		
Итого:				18		
Предписывающие знаки						
4.1.2	Движение направо	II	0.327	Установлен	1	Слева
Итого установлено:				1		
Итого требуется установить:				0		
Итого перенести:				0		
Итого к демонтажу:				0		
Итого требуется замена:				0		
Итого:				1		
Знаки особых предписаний						
5.19.1	Пешеходный переход	II	0.300	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	0.300	Установлен	1	Слева
Итого установлено:				2		
Итого требуется установить:				0		
Итого перенести:				0		
Итого к демонтажу:				0		
Итого требуется замена:				0		
Итого:				2		
Запрещающие знаки						
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	0.300	Установлен	1	Слева
3.18.1	Поворот направо запрещён	II	0.491	Установлен	1	Справа
3.18.2	Поворот налево запрещён	II	0.519	Установлен	1	Слева
3.18.1	Поворот направо запрещён	II	0.670	Установлен	1	Справа
3.18.2	Поворот налево запрещён	II	0.700	Установлен	1	Слева

Итого установлено:					5	
Итого требуется установить:					0	
Итого перенести:					0	
Итого к демонтажу:					0	
Итого требуется замена:					0	
Итого:					5	
Знаки дополнительной информации (таблички)						
8.13	Направление главной дороги	II		0.015	Требуется установка	1 Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.327	Установлен	1 Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.491	Установлен	1 Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.519	Установлен	1 Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.670	Установлен	1 Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.700	Установлен	1 Слева
Итого установлено:					5	
Итого требуется установить:					1	
Итого перенести:					0	
Итого к демонтажу:					0	
Итого требуется замена:					0	
Итого:					6	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:					21	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:					11	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:					0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:					0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:					0	
ВСЕГО:					32	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Северная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.294	Требуется установка	1	Примыкание слева "ул. Тополевая" на 0.298
2.1	Главная дорога	II		0.311	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.545	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.555	Установлен	1	Справа
Итого установлено:						2	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						5	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						2	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						3	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						5	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Строителей

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.237	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.254	Требуется установка	1	Примыкание справа на 0.250
2.4	Уступите дорогу	II		0.287	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.317	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.397	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.413	Установлен	1	Примыкание справа "пер. Короткий" на 0.412
Итого установлено:						3	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						6	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						3	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						3	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						6	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Ленина (участок № 1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.020	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.069	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.096	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.220	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.246	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.396	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.423	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.545	Установлен	1	Справа
Итого установлено:						5	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						8	
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.548	Требуется установка	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.548	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.552	Требуется установка	1	На разделительной
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.552	Требуется установка	1	На разделительной

Итого установлено:					0	
Итого требуется установить:					4	
Итого перенести:					0	
Итого к демонтажу:					0	
Итого требуется замена:					0	
Итого:					4	
Информационные знаки						
6.4	Парковка (парковочное место)	II	0.527	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:					0	
Итого требуется установить:					1	
Итого перенести:					0	
Итого к демонтажу:					0	
Итого требуется замена:					0	
Итого:					1	
Знаки дополнительной информации (таблички)						
8.13	Направление главной дороги	II	0.020	Требуется установка	1	Слева
8.17	Инвалиды	II	0.527	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:					0	
Итого требуется установить:					2	
Итого перенести:					0	
Итого к демонтажу:					0	
Итого требуется замена:					0	
Итого:					2	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:					5	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:					10	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:					0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:					0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:					0	
ВСЕГО:					15	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Ленина (участок № 2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.156	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.179	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.304	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.334	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.531	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.562	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.609	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.693	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.715	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.871	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.898	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						8	
Итого требуется установить:						4	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						12	
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		0.008	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0.054	Установлен	1	Справа
1.23	Дети	II		0.054	Установлен	1	Справа
1.23	Дети	II		0.158	Установлен	1	Слева

1.23	Дети	II	0.173	К демонтажу Перенести на 0.220 км	1	Слева
1.23	Дети	II	0.220	Требуется установка Перенести с 0.173 км	1	Слева
Итого установлено:						
Итого требуется установить:						
Итого перенести:						
Итого к демонтажу:						
Итого требуется замена:						
Итого:						
Предписывающие знаки						
4.1.6	Движение направо или налево	II	0.334	Установлен	1	Слева
Итого установлено:						
Итого требуется установить:						
Итого перенести:						
Итого к демонтажу:						
Итого требуется замена:						
Итого:						
Знаки особых предписаний						
5.19.1	Пешеходный переход	II	0.008	Требуется установка	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	0.008	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	0.012	Требуется установка	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	0.012	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	0.116	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	0.118	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	0.132	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	0.132	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	0.136	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	0.136	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	0.156	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	0.158	Установлен	1	Слева

Итого установлено:				8			
Итого требуется установить:				4			
Итого перенести:				0			
Итого к демонтажу:				0			
Итого требуется замена:				0			
Итого:				12			
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.008	Требуется установка	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II		0.027	К демонтажу	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0.054	Установлен	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0.158	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.220	Требуется установка	1	Слева
3.4 (8)	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0.304	Установлен	1	Слева
Итого установлено:					3		
Итого требуется установить:					2		
Итого перенести:					0		
Итого к демонтажу:					1		
Итого требуется замена:					0		
Итого:					6		
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II		0.150	Установлен	1	Слева
Итого установлено:					1		
Итого требуется установить:					0		
Итого перенести:					0		
Итого к демонтажу:					0		
Итого требуется замена:					0		
Итого:					1		
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.2.1 (120м)	Зона действия	II		0.054	Установлен	1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		0.158	Установлен	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.334	Установлен	1	Слева

Итого установлено:	3	
Итого требуется установить:	0	
Итого перенести:	0	
Итого к демонтажу:	0	
Итого требуется замена:	0	
Итого:	3	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	27	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	11	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	1	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	1	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
ВСЕГО:	41	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Крестьянская (участок № 1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.245	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.272	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.416	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.559	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.671	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.700	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.830	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.858	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.902	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.920	Требуется установка	1	Примыкание справа "пер. Малинина" на 0.916
2.4	Уступите дорогу	II		0.925	Требуется установка	1	Примыкание слева "пер. Малинина" на 0.929
2.1	Главная дорога	II		0.943	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.998	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.025	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.048	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.166	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.193	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.370	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.400	Установлен	1	Слева

2.1	Главная дорога	II		1.519	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		1.545	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.606	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1.670	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1.700	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1.791	Требуется установка	1	Примыкание слева "пер. Новый" на 1.795
2.1	Главная дорога	II		1.810	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.863	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:							15
Итого требуется установить:							13
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							0
Итого требуется замена:							0
Итого:							28
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II		1.190	Установлен	1	Справа
1.23	Дети	II		1.190	Установлен	1	Справа
1.23	Дети	II		1.260	Установлен	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		1.370	Установлен	1	Слева
1.23	Дети	II		1.370	Установлен	1	Слева
1.23	Дети	II		1.430	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:							5
Итого требуется установить:							1
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							0
Итого требуется замена:							0
Итого:							6
Предписывающие знаки							
4.1.6	Движение направо или налево	II		1.700	Установлен	1	Слева

Итого установлено:			1			
Итого требуется установить:			0			
Итого перенести:			0			
Итого к демонтажу:			0			
Итого требуется замена:			0			
Итого:			1			
Знаки особых предписаний						
5.20	Искусственная неровность	II	1.282	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	1.282	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	1.284	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	1.284	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	1.298	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	1.298	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	1.309	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	1.309	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	1.316	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	1.316	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	1.318	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	1.318	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	1.391	Требуется установка	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	1.391	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	1.393	Требуется установка	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	1.393	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:			12			
Итого требуется установить:			4			
Итого перенести:			0			
Итого к демонтажу:			0			
Итого требуется замена:			0			
Итого:			16			
Запрещающие знаки						
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II	1.190	Установлен	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II	1.260	Установлен	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II	1.370	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II	1.430	Требуется установка	1	Слева

3.4 (8)	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		1.671	Установлен	1	Слева
					Итого установлено:	4	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	5	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0.671	Установлен	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0.700	Установлен	1	Слева
8.2.1 (120м)	Зона действия	II		1.260	Установлен	1	Справа
8.2.1 (120м)	Зона действия	II		1.370	Установлен	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		1.700	Установлен	1	Слева
					Итого установлено:	5	
					Итого требуется установить:	0	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	5	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	42	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	19	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	61	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Крестьянская (участок № 2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	1	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Коммунальная (участок №1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.139	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.197	Установлен	1	Справа
					Итого установлено:	1	
					Итого требуется установить:	2	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	3	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0.197	Установлен	1	Справа
					Итого установлено:	1	
					Итого требуется установить:	0	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	4	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Коммунальная (участок №2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.015	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.052	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.122	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.150	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.293	Требуется установка	1	Слева
2.5	Движение без остановки запрещено	II		0.314	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.336	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.422	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.764	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.802	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.986	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		1.588	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						9	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						12	
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II		0.085	Требуется установка	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0.479	Установлен	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0.907	Установлен	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		1.065	Установлен	1	Слева

Итого установлено:				3			
Итого требуется установить:				1			
Итого перенести:				0			
Итого к демонтажу:				0			
Итого требуется замена:				0			
Итого:				4			
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.004	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.004	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.008	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.008	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0.020	Требуется установка	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.022	Требуется установка	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.332	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.332	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.336	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.336	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0.378	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.378	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.380	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0.380	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0.984	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.984	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.986	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0.986	Установлен	1	Слева
5.23.1	Начало населённого пункта		1.35	1.252	Установлен	1	Слева
5.24.1	Конец населённого пункта		1.35	1.252	Установлен	1	Справа
Итого установлено:				18			
Итого требуется установить:				2			
Итого перенести:				0			
Итого к демонтажу:				0			
Итого требуется замена:				0			
Итого:				20			
Запрещающие знаки							

3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II			0.085	Требуется установка	1	Слева
3.18.2	Поворот налево запрещён	II			0.336	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II			0.479	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II			0.907	Установлен	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II			1.065	Установлен	1	Слева
Итого установлено:							4	
Итого требуется установить:							1	
Итого перенести:							0	
Итого к демонтажу:							0	
Итого требуется замена:							0	
Итого:							5	
Информационные знаки								
6.22	Фотовидеофиксация	II			1.252	Установлен	1	Слева
Итого установлено:							1	
Итого требуется установить:							0	
Итого перенести:							0	
Итого к демонтажу:							0	
Итого требуется замена:							0	
Итого:							1	
Знаки сервиса								
7.13 (полиция)	Полиция	II			1.228	Установлен	1	Слева
Итого установлено:							1	
Итого требуется установить:							0	
Итого перенести:							0	
Итого к демонтажу:							0	
Итого требуется замена:							0	
Итого:							1	
Знаки дополнительной информации (таблички)								
8.13	Направление главной дороги	II			0.015	Установлен	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II			0.336	Установлен	1	Слева

Итого установлено:	2	
Итого требуется установить:	0	
Итого перенести:	0	
Итого к демонтажу:	0	
Итого требуется замена:	0	
Итого:	2	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	38	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
ВСЕГО:	45	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Коммунальная (участок №3)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.010	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.026	Установлен	1	Справа
Итого установлено:						1	
Итого требуется установить:						1	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						1	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						1	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						2	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Горькаева (участок № 2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.013	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.052	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.140	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						3	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						3	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						3	

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Тополевая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.585	Требуется установка	1	Справа
					Итого установлено:	1	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	2	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	2	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер 8-го Марта

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.012	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.138	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.161	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.345	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.374	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						2	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						5	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0.345	Требуется установка	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0.374	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
ВСЕГО:	7	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Банный

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.012	Требуется установка	1	Слева
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	1	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Васильева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.020	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.055	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.140	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.167	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.282	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.331	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.418	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.436	Требуется установка	1	Примыкание справа "пер. Баева" на 0.432
2.1	Главная дорога	II		0.517	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.543	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.625	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.651	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.729	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.757	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.837	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.865	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						7	
Итого требуется установить:						9	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						16	
Предупреждающие знаки							

1.17	Искусственная неровность	II		0.020	Установлен	1	Слева
Итого установлено:							1
Итого требуется установить:							0
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							0
Итого требуется замена:							0
Итого:							1
Предписывающие знаки							
4.1.4	Движение прямо или направо	II		0.140	Требуется установка	1	Справа
4.1.5	Движение прямо или налево	II		0.167	Требуется установка	1	Слева
4.1.4	Движение прямо или направо	II		0.517	Требуется установка	1	Справа
4.1.5	Движение прямо или налево	II		0.543	Требуется установка	1	Слева
4.1.4	Движение прямо или направо	II		0.625	Требуется установка	1	Справа
4.1.5	Движение прямо или налево	II		0.651	Требуется установка	1	Слева
4.1.4	Движение прямо или направо	II		0.729	Требуется установка	1	Справа
4.1.5	Движение прямо или налево	II		0.757	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:							0
Итого требуется установить:							8
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							0
Итого требуется замена:							0
Итого:							8
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.020	Установлен	1	Слева
3.18.1	Поворот направо запрещён	II		0.055	Требуется установка	1	Слева
3.18.2	Поворот налево запрещён	II		0.303	Установлен	1	Справа
3.18.1	Поворот направо запрещён	II		0.331	Установлен	1	Слева
Итого установлено:							3
Итого требуется установить:							1
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							0
Итого требуется замена:							0
Итого:							4
Знаки сервиса							

7.13 (полиция)	Полиция	II		0.309	Установлен	1	Справа
Итого установлено:							1
Итого требуется установить:							0
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							0
Итого требуется замена:							0
Итого:							1
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.055	Требуется установка	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.140	Требуется установка	1	Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.167	Требуется установка	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II		0.282	Установлен	1	Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.303	Установлен	1	Справа
8.3.2	Направление действия	II		0.309	Установлен	1	Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.331	Установлен	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II		0.331	Требуется установка	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.517	Требуется установка	1	Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.543	Требуется установка	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.625	Требуется установка	1	Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.651	Требуется установка	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.729	Требуется установка	1	Справа
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.757	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:							4
Итого требуется установить:							10
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							0
Итого требуется замена:							0
Итого:							14
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:							
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:							16
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:							28
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:							0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:							0
ВСЕГО:							44

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Гулина

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.163	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.190	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.241	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.260	Требуется установка	1	Примыкание справа "пер. Райкова" на 0.256
2.4	Уступите дорогу	II		0.320	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.349	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.523	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.551	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.638	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.664	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.743	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.770	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.851	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.877	Установлен	1	Слева
Итого установлено:						12	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						14	

	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	12	
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
	ВСЕГО:	14	

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Жданова

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.014	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.197	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						2	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						2	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Иванова

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.014	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.135	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.215	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.242	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.355	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.383	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.502	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.647	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.817	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						1	
Итого требуется установить:						8	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						9	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						1	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						8	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						9	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Калинина

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.033	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.076	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.177	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.207	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.341	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.384	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.540	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.658	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.685	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.764	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.791	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.871	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.898	Установлен	1	Слева
Итого установлено:						13	
Итого требуется установить:						0	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						13	
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		0.315	Требуется установка	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0.384	Установлен	1	Справа
1.23	Дети	II		0.384	Установлен	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0.518	Установлен	1	Слева

1.23	Дети	II			0.518	Установлен	1	Слева
1.23	Дети	II			0.590	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:								
Итого требуется установить:								
Итого перенести:								
Итого к демонтажу:								
Итого требуется замена:								
Итого:								
Предписывающие знаки								
4.1.6	Движение направо или налево	II			0.685	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:								
Итого требуется установить:								
Итого перенести:								
Итого к демонтажу:								
Итого требуется замена:								
Итого:								
Знаки особых предписаний								
5.19.1	Пешеходный переход	II			0.365	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II			0.365	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II			0.384	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			0.384	Установлен	1	Слева
5.18	Место стоянки легковых такси	I			0.404	Требуется установка	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II			0.433	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II			0.435	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II			0.449	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II			0.449	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II			0.453	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			0.453	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II			0.467	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II			0.469	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II			0.563	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II			0.563	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II			0.567	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II			0.567	Установлен	1	Слева

Итого установлено:				16			
Итого требуется установить:				1			
Итого перенести:				0			
Итого к демонтажу:				0			
Итого требуется замена:				0			
Итого:				17			
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.315	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0.384	Установлен	1	Справа
3.28	Стоянка запрещена	II		0.384	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0.518	Установлен	1	Слева
3.18.1	Поворот направо запрещён	II		0.537	К демонтажу	1	Справа
3.1	Въезд запрещён	II		0.563	Установлен	1	Слева
3.28	Стоянка запрещена	II		0.577	Установлен	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.590	Требуется установка	1	Слева
3.4 (8)	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0.875	Установлен	1	Слева
Итого установлено:				5			
Итого требуется установить:				3			
Итого перенести:				0			
Итого к демонтажу:				1			
Итого требуется замена:				0			
Итого:				9			
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II		0.420	Требуется установка	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	II		0.558	Установлен	1	Слева
Итого установлено:				1			
Итого требуется установить:				1			
Итого перенести:				0			
Итого к демонтажу:				0			
Итого требуется замена:				0			
Итого:				2			
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0.033	Установлен	1	Справа

8.13	Направление главной дороги	II			0.076	Установлен	1	Слева
8.2.1 (20м)	Зона действия	II			0.384	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (150м)	Зона действия	II			0.384	Установлен	1	Справа
8.2.1 (20м)	Зона действия	I			0.404	Требуется установка	1	Слева
8.2.1 (150м)	Зона действия	II			0.518	Установлен	1	Слева
8.17	Инвалиды	II			0.558	Установлен	1	Слева
8.0	Нестандартная табличка	II			0.577	Установлен	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II			0.685	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:							6	
Итого требуется установить:							2	
Итого перенести:							0	
Итого к демонтажу:							1	
Итого требуется замена:							0	
Итого:							9	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:							45	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:							9	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:							0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:							3	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:							0	
ВСЕГО:							57	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Колхозный

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.114	Требуется установка	1	Примыкание слева "пер. Колхозный" на 0.118
2.1	Главная дорога	II		0.133	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.163	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.192	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.319	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.349	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.526	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.553	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.633	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.660	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.743	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.770	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	III		0.850	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.880	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						10	
Итого требуется установить:						4	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						14	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	III		0.850	Требуется установка	1	Справа

8.13	Направление главной дороги	II		0.880	Требуется установка	1	Слева
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	2	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	2	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	10	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	16	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Лазаренко

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.012	Требуется установка	1	Слева
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	1	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Мирный

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.012	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.150	Установлен	1	Справа
					Итого установлено:	1	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	2	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	2	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Мушкетова

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.012	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.105	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						2	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						2	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						2	

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Пионерский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.058	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.087	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.215	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.243	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.420	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.446	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.523	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.551	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						4	
Итого требуется установить:						4	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						8	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0.058	Установлен	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0.087	Установлен	1	Слева
Итого установлено:						2	
Итого требуется установить:						0	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						2	

	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	6	
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4	
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
	ВСЕГО:	10	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Цаплинский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.012	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.066	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.096	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						3	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						3	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						3	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Чапаева (участок №1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.365	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.467	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.495	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.604	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.632	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.763	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.803	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.974	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1.004	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1.084	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1.114	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1.191	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1.221	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		1.297	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		1.327	Установлен	1	Слева
Итого установлено:						15	
Итого требуется установить:						1	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						16	
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II		0.940	Требуется установка	1	Справа

1.23	Дети	II		1.002	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	II		1.086	Требуется установка	1	Слева
1.23	Дети	II		1.140	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:							0
Итого требуется установить:							4
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							0
Итого требуется замена:							0
Итого:							4
Предписывающие знаки							
4.1.6	Движение направо или налево	II		1.119	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:							0
Итого требуется установить:							0
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							1
Итого требуется замена:							0
Итого:							1
Запрещающие знаки							
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.940	Требуется установка	1	Справа
3.18.2	Поворот налево запрещён	II		0.979	К демонтажу	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		1.002	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		1.086	Требуется установка	1	Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		1.140	Требуется установка	1	Слева
3.4 (8)	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		1.297	Установлен	1	Слева
Итого установлено:							1
Итого требуется установить:							4
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							1
Итого требуется замена:							0
Итого:							6
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II		0.836	Установлен	1	Справа

						Итого установлено:	1	
						Итого требуется установить:	0	
						Итого перенести:	0	
						Итого к демонтажу:	0	
						Итого требуется замена:	0	
						Итого:	1	
Знаки дополнительной информации (таблички)								
8.17	Инвалиды	II		0.836	Установлен		1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		1.002	Требуется установка		1	Справа
8.2.1 (100м)	Зона действия	II		1.086	Требуется установка		1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		1.119	К демонтажу		1	Слева
					Итого установлено:		1	
					Итого требуется установить:		2	
					Итого перенести:		0	
					Итого к демонтажу:		1	
					Итого требуется замена:		0	
					Итого:		4	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		18	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		11	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		3	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:		0	
					ВСЕГО:		32	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Чапаева (участок №2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	1	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Чепрунова

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.123	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.153	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						3	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						3	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						3	

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Шумейко

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.012	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.024	Требуется установка	1	Справа
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	2	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	2	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	2	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Юбилейный (участок № 1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.012	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.239	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.270	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.411	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.439	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.615	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.645	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.732	Установлен	1	Справа
Итого установлено:						4	
Итого требуется установить:						4	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						8	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						4	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						4	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						8	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Юбилейный (участок № 2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I		0.015	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I		0.090	Требуется установка	1	Справа
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	2	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	2	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	2	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Юбилейный (участок № 3)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.125	Требуется установка	1	Справа
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	2	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	2	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	2	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Юбилейный (участок № 4)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.362	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.382	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						3	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						3	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						3	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						3	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Советский (участок № 1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0.030	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.186	Установлен	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.213	Установлен	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.349	Установлен	1	Справа
Итого установлено:						3	
Итого требуется установить:						1	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						4	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						3	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						1	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						4	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Советский (участок № 2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.218	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.297	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.327	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.404	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.434	Установлен	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0.512	Установлен	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0.542	Установлен	1	Слева
Итого установлено:						8	
Итого требуется установить:						0	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						8	
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II		0.426	Установлен	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II		0.518	Установлен	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0.540	Установлен	1	Справа
Итого установлено:						3	
Итого требуется установить:						0	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						3	

Предписывающие знаки							
4.1.6	Движение направо или налево	II		0.343	К демонтажу	1	Слева
4.1.3	Движение налево	II		0.542	Установлен	1	Слева
Итого установлено:							1
Итого требуется установить:							0
Итого перенести:							0
Итого к демонтажу:							1
Итого требуется замена:							0
Итого:							2
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.051	Установлен	1	На разделительной
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.051	Установлен	1	На разделительной
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.071	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.071	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.161	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.161	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.174	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.174	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.204	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.204	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.218	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.218	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0.466	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.466	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.468	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0.468	Установлен	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.512	Установлен	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.512	Установлен	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0.518	Установлен	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0.518	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0.579	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.579	Установлен	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0.581	Установлен	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0.581	Установлен	1	Слева

Итого установлено:					24	
Итого требуется установить:					0	
Итого перенести:					0	
Итого к демонтажу:					0	
Итого требуется замена:					0	
Итого:					24	
Запрещающие знаки						
3.1	Въезд запрещён	II		0.161	Требуется установка	1 Справа
3.1	Въезд запрещён	II		0.203	Требуется установка	1 Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.426	Установлен	1 Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.490	Установлен	1 Слева
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0.518	Установлен	1 Слева
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	II		0.540	Установлен	1 Справа
3.20	Обгон запрещён	II		0.582	Установлен	1 Справа
Итого установлено:					5	
Итого требуется установить:					2	
Итого перенести:					0	
Итого к демонтажу:					0	
Итого требуется замена:					0	
Итого:					7	
Информационные знаки						
6.4	Парковка (парковочное место)	II		0.044	Требуется установка	1 Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II		0.180	Требуется установка	1 Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II		0.231	Требуется установка	1 Слева
Итого установлено:					0	
Итого требуется установить:					3	
Итого перенести:					0	
Итого к демонтажу:					0	
Итого требуется замена:					0	
Итого:					3	
Знаки сервиса						
7.13 (полиция)	Полиция	II		0.581	Установлен	1 Слева

					Итого установлено:	1	
					Итого требуется установить:	0	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.343	К демонтажу	1	Слева
8.4.1	Вид транспортного средства	II		0.542	Установлен	1	Слева
					Итого установлено:	1	
					Итого требуется установить:	0	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	1	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	2	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	43	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	2	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	50	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Зеленый (участок № 1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.432	Требуется установка	1	Справа
					Итого установлено:	0	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	1	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	1	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Зеленый (участок № 2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.014	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.185	Установлен	1	Справа
					Итого установлено:	1	
					Итого требуется установить:	1	
					Итого перенести:	0	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого требуется замена:	0	
					Итого:	2	
					ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1	
					ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0	
					ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
					ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:	0	
					ВСЕГО:	2	

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Зеленый (участок № 3)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км.м	Статус	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0.015	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.117	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0.147	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0.230	Требуется установка	1	Справа
Итого установлено:						0	
Итого требуется установить:						4	
Итого перенести:						0	
Итого к демонтажу:						0	
Итого требуется замена:						0	
Итого:						4	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:						4	
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:						0	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:						0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА:						0	
ВСЕГО:						4	

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Красногвардейская

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7		1.14.1		1.14.2		1.24.3	1.25	Итого	
				Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Материал	Краска	Краска	Краска	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Жёл.	Бел.	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Кэф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	0.50	0.50	0.40	0.20	0.20	—	1.00	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	4.00	8.00	8.00	—	0.40	—	—
Единицы	м	м	м	м	м	м	м²	м²	м²	шт.	м²	м²	м²
0.000 - 1.000	215.0	470.0	235.0	78.0							5.12	59.90	
1.000 - 2.000	672.0	20.0	269.0	103.0	13.0		40.00	12.67	10.92	3	5.44	154.98	49.32
2.000 - 3.000	441.0	51.0	359.0	141.0			32.00				5.12	116.47	30.40
3.000 - 3.753	135.0	231.0	245.0	142.1								44.75	
Длина, км	1.463	0.772	1.108	0.464	0.013								
Привед. длина, км	1.463	0.193	0.831	0.232	0.006							2.726	
Площадь, м²	147.10	19.30	83.10	23.20	0.97	68.80	72.00	12.67	10.92	2.07	15.68	376.10	79.72

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Комсомольская

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1		Итого	
								
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Коеф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	0.40	0.40	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	—	—
Единицы	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²
0.000 - 1.000	250.0	79.0	561.0	66.0	9.60	9.60	81.95	9.60
1.000 - 1.538	219.0	71.0	162.0	79.0			39.78	
Длина, км	0.469	0.150	0.723	0.145				
Привед. длина, км	0.469	0.037	0.542	0.072			1.121	
Площадь, м²	46.90	3.75	54.22	7.25	9.60	9.60	121.73	9.60

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
ул. Лесная

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	Итого
					
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м	м	м²
0.000 - 0.859	226.0	275.0	275.0	65.0	53.35
Длина, км	0.226	0.275	0.275	0.065	
Привед. длина, км	0.226	0.069	0.206	0.032	0.533
Площадь, м²	22.60	6.88	20.62	3.25	53.35

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Октябрьская

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1		Итого	
								
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Коеф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	0.40	0.40	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	—	—
Единицы	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²
0.000 - 1.000	238.0	62.0	600.0	81.0	9.60	9.60	84.00	9.60
1.000 - 1.730	160.0	120.0	385.6	48.0			50.32	
Длина, км	0.398	0.182	0.986	0.129				
Привед. длина, км	0.398	0.046	0.739	0.065			1.247	
Площадь, м²	39.80	4.55	73.92	6.45	9.60	9.60	134.32	9.60

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Первомайская

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1		Итого	
	 Краска	 Краска	 Краска	 Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Коеф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	0.40	0.40	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	—	—
Единицы	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²
0.000 - 1.000	234.0	163.0	493.0	67.0	9.60	9.60	77.40	9.60
1.000 - 1.365	106.0		209.0	42.0			28.37	
Длина, км	0.340	0.163	0.702	0.109				
Привед. длина, км	0.340	0.041	0.527	0.055			0.962	
Площадь, м²	34.00	4.07	52.65	5.45	9.60	9.60	105.78	9.60

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Северная

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	Итого
					
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м	м	м²
0.000 - 0.570	103.0	222.0	200.0	30.0	32.35
Длина, км	0.103	0.222	0.200	0.030	
Привед. длина, км	0.103	0.055	0.150	0.015	0.324
Площадь, м²	10.30	5.55	15.00	1.50	32.35

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
ул. Строителей

Участок, км.м	1.1 	1.6 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Кэфф. привед. к 1.1*	1.00	0.75	0.50	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м	м²
0.000 - 0.625	57.0	54.0	16.0	10.55
Длина, км	0.057	0.054	0.016	
Привед. длина, км	0.057	0.041	0.008	0.106
Площадь, м²	5.70	4.05	0.80	10.55

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
ул. Ленина (участок № 1)

Участок, км.м	1.1 	1.5 	1.6 	1.7 	1.14.1 		1.24.3 	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	0.40	0.40	—	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	—	—	—
Единицы	м	м	м	м	м²	м²	шт.	м²	м²
0.000 - 0.558	244.0	20.0	288.0	48.0	9.60	9.60	2	60.32	9.60
Длина, км	0.244	0.020	0.288	0.048					
Привед. длина, км	0.244	0.005	0.216	0.024				0.489	
Площадь, м²	24.84	0.50	21.60	2.40	9.60	9.60	1.38	60.32	9.60

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Ленина (участок № 2)

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1		1.25	Итого	
									
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	0.40	0.40	1.00	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	0.40	—	—
Единицы	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²
0.000 - 0.960	296.0	71.0	431.6	127.0	27.20	27.20	9.60	106.90	27.20
Длина, км	0.296	0.071	0.432	0.127					
Привед. длина, км	0.296	0.018	0.324	0.063				0.701	
Площадь, м²	29.60	1.78	32.37	6.35	27.20	27.20	9.60	106.90	27.20

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Крестьянская (участок № 1)

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1		1.25	Итого	
									
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	0.40	0.40	1.00	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	0.40	—	—
Единицы	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²
0.000 - 1.000	320.0	97.0	465.0	118.0				75.20	
1.000 - 1.876	472.0		259.0	119.5	19.20	19.20	8.96	100.76	19.20
Длина, км	0.792	0.097	0.724	0.237					
Привед. длина, км	0.792	0.024	0.543	0.119				1.478	
Площадь, м²	79.20	2.43	54.30	11.87	19.20	19.20	8.96	175.96	19.20

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Коммунальная (участок №2)

Участок, км.м	1.1 	1.5 	1.6 	1.7 	1.14.1 		1.25 	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Жёл.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	0.40	0.40	1.00	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	0.40	—	—
Единицы	м	м	м	м	м²	м²	м²	м²	м²
0.000 - 1.000	414.0	166.0	265.0	137.0	20.80	19.20	15.04	108.12	19.20
1.000 - 1.606	27.0	466.0	100.0	12.5				22.48	
Длина, км	0.441	0.632	0.365	0.150					
Привед. длина, км	0.441	0.158	0.274	0.075				0.948	
Площадь, м²	44.10	15.80	27.37	7.48	20.80	19.20	15.04	130.59	19.20

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Коммунальная (участок №3)

Участок, км.м	1.1 	Итого
Материал	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.
Коеф. привед. к 1.1*	1.00	—
Ширина, м	0.10	—
Единицы	м	м²
0.000 - 0.039	26.0	2.60
Длина, км	0.026	
Привед. длина, км	0.026	0.026
Площадь, м²	2.60	2.60

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
пер 8-го Марта

Участок, км.м	1.1 	1.5 	1.6 	1.7 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.15	—
Единицы	м	м	м	м	м²
0.000 - 0.402	40.0	52.0	100.0	8.0	13.40
Длина, км	0.040	0.052	0.100	0.008	
Привед. длина, км	0.040	0.013	0.075	0.004	0.132
Площадь, м²	4.00	1.30	7.50	0.60	13.40

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
пер. Васильева

Участок, км.м	1.1	1.6	1.7	Итого
				
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.75	0.50	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м	м²
0.000 - 0.948	307.0	410.0	120.0	67.45
Длина, км	0.307	0.410	0.120	
Привед. длина, км	0.307	0.307	0.060	0.674
Площадь, м²	30.70	30.75	6.00	67.45

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
пер. Гулина

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	Итого
					
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м	м	м²
0.000 - 0.995	326.0	97.8	358.0	16.0	64.01
Длина, км	0.326	0.098	0.358	0.016	
Привед. длина, км	0.326	0.024	0.269	0.008	0.636
Площадь, м²	32.60	2.44	26.85	0.80	64.01

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

пер. Иванова

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	Итого
					
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м	м	м²
0.000 - 0.831	240.0	41.0	450.0	49.0	61.22
Длина, км	0.240	0.041	0.450	0.049	
Привед. длина, км	0.240	0.010	0.337	0.024	0.612
Площадь, м²	24.00	1.03	33.75	2.45	61.22

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

пер. Калинина

Участок, км.м	1.1	1.6	1.7	1.14.1		1.24.3	1.25	Итого	
									
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.75	0.50	0.40	0.40	—	1.00	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	—	0.40	—	—
Единицы	м	м	м	м²	м²	шт.	м²	м²	м²
0.000 - 1.000	565.5	332.0	233.3	44.80	41.60	3	14.56	156.35	41.60
1.000 - 1.020									
Длина, км	0.565	0.332	0.233						
Привед. длина, км	0.565	0.249	0.117					0.931	
Площадь, м²	58.35	24.90	11.67	44.80	41.60	2.07	14.56	156.35	41.60

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
пер. Колхозный

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	Итого
				
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Коеф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м	м²
0.000 - 0.925	180.0	49.0	354.0	45.78
Длина, км	0.180	0.049	0.354	
Привед. длина, км	0.180	0.012	0.266	0.458
Площадь, м²	18.00	1.22	26.55	45.78

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

пер. Пионерский

Участок, км.м	1.1	1.5	1.6	1.7	Итого
					
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	0.50	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м	м	м²
0.000 - 0.638	160.0	46.0	286.0	8.6	39.03
Длина, км	0.160	0.046	0.286	0.009	
Привед. длина, км	0.160	0.012	0.215	0.004	0.390
Площадь, м²	16.00	1.15	21.45	0.43	39.03

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
пер. Чапаева (участок №1)

Участок, км.м	1.1 	1.5 	1.6 	1.24.3 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.25	0.75	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	—	—
Единицы	м	м	м	шт.	м²
0.000 - 1.000	243.0	49.0	289.0	4	50.88
1.000 - 1.383	158.0		154.0		27.35
Длина, км	0.401	0.049	0.443		
Привед. длина, км	0.401	0.012	0.332		0.746
Площадь, м²	41.02	1.23	33.23	2.76	78.23

*Такой же ширины

**Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
пер. Юбилейный (участок № 3)**

Участок, км.м	1.1 	1.6 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.75	—
Ширина, м	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м²
0.000 - 0.137	40.0	80.0	10.00
Длина, км	0.040	0.080	
Привед. длина, км	0.040	0.060	0.100
Площадь, м²	4.00	6.00	10.00

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

пер. Советский (участок № 1)

Участок, км.м	1.1 	1.6 	Итого
Материал	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.75	—
Ширина, м	0.10	0.10	—
Единицы	м	м	м²
0.000 - 0.363	40.0	91.0	10.83
Длина, км	0.040	0.091	
Привед. длина, км	0.040	0.068	0.108
Площадь, м²	4.00	6.83	10.83

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
пер. Советский (участок № 2)

Участок, км.м	1.1 	1.6 	1.7 	1.14.1 		1.24.3 	1.25 	Итого	
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.	Бел.	Бел.	Бел.	Жёл.
Козф. привед. к 1.1*	1.00	0.75	0.50	0.40	0.40	—	1.00	—	—
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	4.00	4.00	—	0.40	—	—
Единицы	м	м	м	м²	м²	шт.	м²	м²	м²
0.000 - 0.621	788.0	128.0	314.9	51.20	49.60	1	8.96	168.67	49.60
Длина, км	0.788	0.128	0.315						
Привед. длина, км	0.788	0.096	0.157					1.041	
Площадь, м²	82.48	9.60	15.74	51.20	49.60	0.69	8.96	168.67	49.60

*Такой же ширины

Ведомость размещения искусственных неровностей
ул. Красногвардейская

№п/п	Адрес, км.м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Статус
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0.696	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	6.50	0.05	-	Требуется строительство
2	1.170	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	7.00	0.05	-	Требуется строительство
3	2.513	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	6.50	0.05	-	Требуется строительство

Ведомость размещения искусственных неровностей

ул. Ленина (участок № 2)

№п/п	Адрес, км.м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Статус
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0.117	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	6.00	0.05	-	Соответствует
2	0.157	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	6.00	0.05	-	Соответствует

Ведомость размещения искусственных неровностей

ул. Коммунальная (участок №2)

№п/п	Адрес, км.м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Статус
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0.021	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	6.00	0.05	-	Требуется строительство
2	0.985	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	7.00	0.05	-	Соответствует

Ведомость размещения искусственных неровностей

пер. Калинина

№п/п	Адрес, км.м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Статус
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0.434	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	9.75	0.05	-	Соответствует
2	0.468	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	8.77	0.05	-	Соответствует

Ведомость размещения искусственных неровностей

пер. Советский (участок № 2)

№п/п	Адрес, км.м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Статус
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0.467	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	6.00	0.05	-	Соответствует
2	0.580	По всей ширине дороги	Сборная	0.50	6.00	0.05	-	Соответствует

Итоги по всем дорогам

Итого	
Статус	Количество
Соответствует	7
Требуется строительство	4

Ведомость размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

ул. Красногвардейская

№п/п	Адрес, км.м	Расположение	Широта, ° Долгота, °	Зона контроля	Фиксируемые нарушения	Ограничение скорости, км/ч	Статус
1	0.885	Справа	50.28256473 42.18799523		C1		Установлено

Ведомость размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

пер. Васильева

№п/п	Адрес, км.м	Расположение	Широта, ° Долгота, °	Зона контроля	Фиксируемые нарушения	Ограничение скорости, км/ч	Статус
1	0.605	Справа	50.29468008 42.18278086		C1		Установлено

Ведомость размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

пер. Советский (участок № 2)

№п/п	Адрес, км.м	Расположение	Широта, ° Долгота, °	Зона контроля	Фиксируемые нарушения	Ограничение скорости, км/ч	Статус
1	0.382	Справа	50.28991975 42.18179793		C1		Установлено

Ведомость размещения светофорных объектов

ул. Красногвардейская

№п/п	Адрес, км.м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных (демонтаж)	к замене	существ.	проектных (демонтаж)	к замене			
1	1.260	T.7; T.7	Перекрёсток	2	0	0	0	0	0	0		
2	1.849	T.7; T.7	Примыкание	2	0	0	0	0	0	0		
3	2.002	T.7	Пешеходный переход	1	0	0	0	0	0	0		
4	2.032	T.7	Участок дороги	1	0	0	0	0	0	0		
5	2.102	T.7	Перекрёсток	1	0	0	0	0	0	0		
6	2.129	T.7	Пешеходный переход	1	0	0	0	0	0	0		
7	2.257	T.1; T.1	Перекрёсток	2	0	0	0	0	0	0		
Итого:				10	0	0	0	0	0	0		

Ведомость размещения светофорных объектов

ул. Первомайская

№п/п	Адрес, км.м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных (демонтаж)	к замене	существ.	проектных (демонтаж)	к замене			
1	0.315	Т.7; Т.7	Перекрёсток	2	0	0	0	0	0	0		
Итого:				2	0	0	0	0	0	0		

Ведомость размещения светофорных объектов

ул. Ленина (участок № 2)

№п/п	Адрес, км.м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте							Год установки
				транспортных			пешеходных				
				существ.	проектных (демонтаж)	к замене	существ.	проектных (демонтаж)	к замене		
1	0.136	T.7; T.7	Пешеходный переход	2	0	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	0	

Ведомость размещения светофорных объектов

ул. Коммунальная (участок №2)

№п/п	Адрес, км.м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных (демонтаж)	к замене	существ.	проектных (демонтаж)	к замене			
1	0.006	Т.7; Т.7	Пешеходный переход	2	0	0	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	0	0	

Ведомость размещения светофорных объектов

пер. Васильева

№п/п	Адрес, км.м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных (демонтаж)	к замене	существ.	проектных (демонтаж)	к замене			
1	0.319	Т.1; Т.1	Перекрёсток	2	0	0	0	0	0	0		
Итого:				2	0	0	0	0	0	0		

Ведомость размещения светофорных объектов

пер. Калинина

№п/п	Адрес, км.м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных (демонтаж)	к замене	существ.	проектных (демонтаж)	к замене			
1	0.451	Т.7; Т.7	Пешеходный переход	2	0	0	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	0	0	

Ведомость размещения светофорных объектов

пер. Советский (участок № 2)

№п/п	Адрес, км.м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте								Год установки
				транспортных				пешеходных				
				существ.	проектных (демонтаж)	к замене	существ.	проектных (демонтаж)	к замене			
1	0.169	Т.7; Т.7	Пешеходный переход	2	0	0	0	0	0	0		
2	0.527	Т.7; Т.7	Перекрёсток	2	0	0	0	0	0	0		
Итого:				4	0	0	0	0	0	0		

Итоги по всем дорогам

Итого		
Статус	Тип	Количество
Установлено	Т.1	4
	Т.7	20

Министерство внутренних дел Российской Федерации
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

ПИСЬМО

от 26 апреля 2010 года N 13/6-3023

[О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации]

[Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ](#) определен порядок проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и ввода их в эксплуатацию. При этом Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации не отнесена к органам, принимающим участие в указанной деятельности.

На основании изложенного сообщаем, что в целях соблюдения законодательства Российской Федерации подразделения Госавтоинспекции прекращают практику рассмотрения проектной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов дорог и дорожных сооружений, а также участия в приемке их в эксплуатацию.

В настоящее время готовятся соответствующие изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ГИБДД МВД России.

Просим вас довести указанную информацию до подведомственных Росавтодору организаций и учреждений.

Одновременно, в целях организации действенного контроля в рамках предоставленных Госавтоинспекции полномочий за соблюдением правил, нормативов и стандартов, определяющих требования к эксплуатационному состоянию дорог, прошу вас поручить и направить в адрес Департамента ОБДД МВД России перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта на федеральных дорогах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2010 году, с указанием наименования федеральной дороги, субъекта Российской Федерации и предполагаемыми сроками окончания работ.

Первый заместитель
главного государственного инспектора
безопасности дорожного движения
Российской Федерации
В.В.Швецов

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Волгоградской области)

Управление государственной инспекции
безопасности дорожного движения

ул. Скосырева, 2, Волгоград, 400066

24.08.16 № 18/6221
на № _____ от _____

о направлении ответа

Генеральному директору
ООО «ВолгогДорСтройПроект»
А.Ю. Бояршину

ул. Иркутская, 19
г. Волгоград, 400074

Сообщаю Вам, что Ваше обращение по вопросу разъяснения порядка утверждения и согласования проектов организации дорожного движения службой Госавтоинспекцией, рассмотрено.

07.05.2015 г. прошел регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации приказ МВД РФ №380 от 30.03.2015 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог», вступивший в силу 19.05.2015 г.

Названный приказ, наряду с Федеральным законом «О полиции» (№3-ФЗ от 07.02.11 г.), положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения (утвержденным указом Президента РФ №711 от 15.06.1998 г.), определяет права и обязанности службы ГИБДД, устанавливает законодательный запрет возложения на нее непрофильных функций.

Госавтоинспекцией осуществляется государственный контроль (надзор) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, разработка предложений и рекомендаций по повышению безопасности дорожного движения и т.д.

При этом действующим законодательством не предусмотрено согласование сотрудниками ГИБДД проектов организации дорожного движения, схем и проектов производства дорожных работ на автомобильных дорогах, разработка и выдача технических заданий.

В соответствии с отраслевым дорожным методическим документом ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», схемы всех видов работ в пределах полосы отвода дороги или в «красных линиях» должны быть утверждены владельцем автомобильной дороги.

Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема должны быть переданы организацией-исполнителем в подразделения Госавтоинспекции на региональном или районном уровне, осуществляющие федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения на данном участке дороги, не менее чем за одни сутки.

При проведении долговременных работ длительностью более 5 суток владелец автомобильной дороги должен проинформировать в письменном виде соответствующее подразделение Госавтоинспекции об адресе участка, на котором намечено проведение работ, сроках их проведения не менее чем за 7 суток.

Владельцами автомобильных дорог осуществляется контроль соответствия организации движения и ограждения мест производства дорожных работ утвержденной схеме.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований обеспечения безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ осуществляют подразделения ГИБДД.

Вместе с тем, учитывая, что при внесении изменений в существующую организацию дорожного движения в ряде случаев именно сотрудники Госавтоинспекции наиболее полно владеют информацией по сложившимся условиям движения, причинам совершения дорожно-транспортных происшествий, образования транспортных заторов, служба Госавтоинспекции, как и ранее, готовы сотрудничать с органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся автомобильные дороги при подготовке соответствующих предложений и рекомендаций.

Однако работа органов исполнительной власти не должна сводиться к перекладыванию своих обязанностей на Государственную инспекцию безопасности дорожного движения, в реалиях современного мегаполиса требуется проведение огромной предварительной работы по изучению распределения транспортных и пешеходных потоков, расчету пропускной способности автодороги, применению компьютерного моделирования и т.д.

Эта деятельность должна носить систематизированный характер, с учетом внедрения передовых инновационных средств организации движения, перспектив развития улично-дорожной сети, осуществляться в тесном взаимодействии с научно-исследовательскими и проектными организациями.

Заместитель начальника

Н.Н. Яньшин

Справка ГИПа

Проект организации дорожного движения (схема дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах и улицах Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области разработан и актуализирован ООО «ВолгоДорСтройПроект» согласно Свидетельства СРО-П-088-15122009 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 34-499-12/288-02 от 10 декабря 2012 г.

Проект разработан в соответствии с действующей нормативной документацией в мае **2025 года**. Работы производились на основании договора № ДП/50/25 от 30.04.2025г., заключенного с администрацией Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Технические решения, принятые в настоящей проектной документации соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, взрывобезопасных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектными решениями мероприятий.

Главный инженер проекта



Бояршин А. Ю.
